


Pumpwerk Oberhausen Centro Nord

Erneuerung der elektrotechnische Ausrüstung

Nr.	Vorgangs-	Gliederung	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Stichtag																		
									H2	2022	H1	H2	2023	H1	H2	2024	H1	H2	2025	H1	H2	2026	H1	H2	2027	H1
1		1	Leistungsphase 5/6	48 Tage	Die 07.04.26	Mit 17.06.26		NV																		
2		1.1	Erarbeitung Lastenheft und LV	20 Tage	Die 07.04.26	Die 05.05.26		NV																		
3		1.2	Abgabe Vorabzug Lastenheft und LV	1 Tag	Mit 06.05.26	Mit 06.05.26	2	NV																		
4		1.3	Prüfung Vorabzug	4 Wochen	Don 07.05.26	Mon 08.06.26	3	NV																		
5		1.4	Einarbeitung Anmerkungen	3 Tage	Die 09.06.26	Don 11.06.26	4	NV																		
6		1.5	Abgabe finales LV und Lastenheft/Angebotsaufforderung	1 Tag	Fre 12.06.26	Fre 12.06.26	5	NV																		
7		2	Leistungsphase 7	49 Tage?	Don 07.05.26	Fre 17.07.26		NV																		
8		2.1	Bieterzeitraum	31 Tage	Mit 24.06.26	Mit 05.08.26	6EA+7 Tage	NV																		
9		2.2	Frist für Fragen	11 Tage	Mit 24.06.26	Mit 08.07.26		NV																		
10		2.3	Submission -10 Uhr-	0 Tage	Mit 05.08.26	Mit 05.08.26	8	NV																		
11		2.4	Auswertung Angebote	1 Woche	Don 06.08.26	Mit 12.08.26	8	NV																		
12		2.5	Bindefrist	17 Tage	Don 13.08.26	Fre 04.09.26	11	NV																		
13		3	Leistungsphase 8	297 Tage	Mon 10.08.26	Don 14.10.27		NV																		
14		3.1	Technische Klärung	4 Wochen	Mon 07.09.26	Fre 02.10.26	12	NV																		
15		3.2	Abstimmung mit EVU inkl. Freigabe der MS-Schaltanlage durch EVU	6 Wochen	Mon 07.09.26	Fre 16.10.26	14AA	NV																		
16		3.3	Werkplanung (Pflichtenheft, Datenblätter, Pläne)	4 Wochen	Mon 05.10.26	Fre 30.10.26	14	NV																		
17		3.4	Werkplanung Stromlaufpläne	16 Wochen	Mon 05.10.26	Die 02.02.27	14	NV																		
18		3.5	Lieferzeit Mittelspannungsschaltanlage	40 Wochen	Mon 19.10.26	Die 10.08.27	15	NV																		
19		3.6	Lieferzeit Transformatoren	34 Wochen	Mon 05.10.26	Die 15.06.27	14	NV																		
20		3.7	Lieferzeit Niederspannungstechnik	12 Wochen	Mit 03.02.27	Don 29.04.27	17	NV																		
21		3.8	Werkmontage Niederspannung	12 Wochen	Fre 30.04.27	Die 27.07.27	20	NV																		
22		3.9	Gebäude und Außeninstallationen, Blitzschutz, Kabelprüfung	20 Wochen	Don 18.03.27	Don 12.08.27	23AE	NV																		
23		3.10	Umschluss Mittelspannungsschaltanlage (Demontage, Austausch Doppelboden, Maler [AG], Installation Mittelspannungsschaltanlage)	15 Tage	Don 12.08.27	Mit 01.09.27	18EA+1 Tag	NV																		
24		3.11	Umschluss Transformatoren (Demontage, Maler, Neuinstallation)	15 Tage	Don 02.09.27	Mit 22.09.27	19;23	NV																		
25		3.12	Umschluss Niederspannung (Demontage + Montage, Doppelboden, Anschluss Erneuerung Komponenten)	4 Wochen	Don 23.09.27	Mit 20.10.27	20;24	NV																		
26		3.13	IBN & Probetrieb	2 Wochen	Don 21.10.27	Don 04.11.27	25	NV																		
27		3.14	Abnahme, Schlussaufmaß	1 Tag	Fre 05.11.27	Fre 05.11.27	26	NV																		
28		3.15	Schlussrechnung (Einreichung und Prüfung)	1 Woche	Mon 08.11.27	Fre 12.11.27	27	NV																		

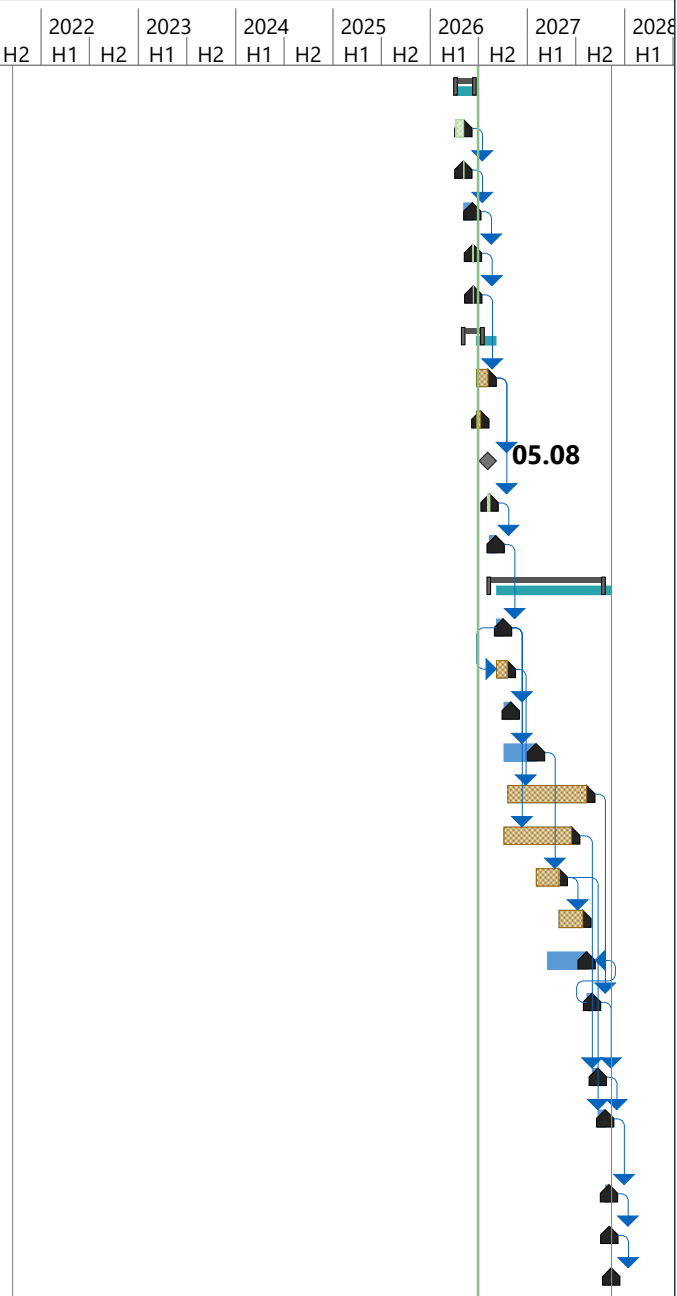

Projekt: FeiertagskalenderVorla
Datum: Mon 29.06.26

Vorgang

Meilenstein

Stichtag

PFI

AG

Behörde

Vergabestelle

Bieter

AN
