
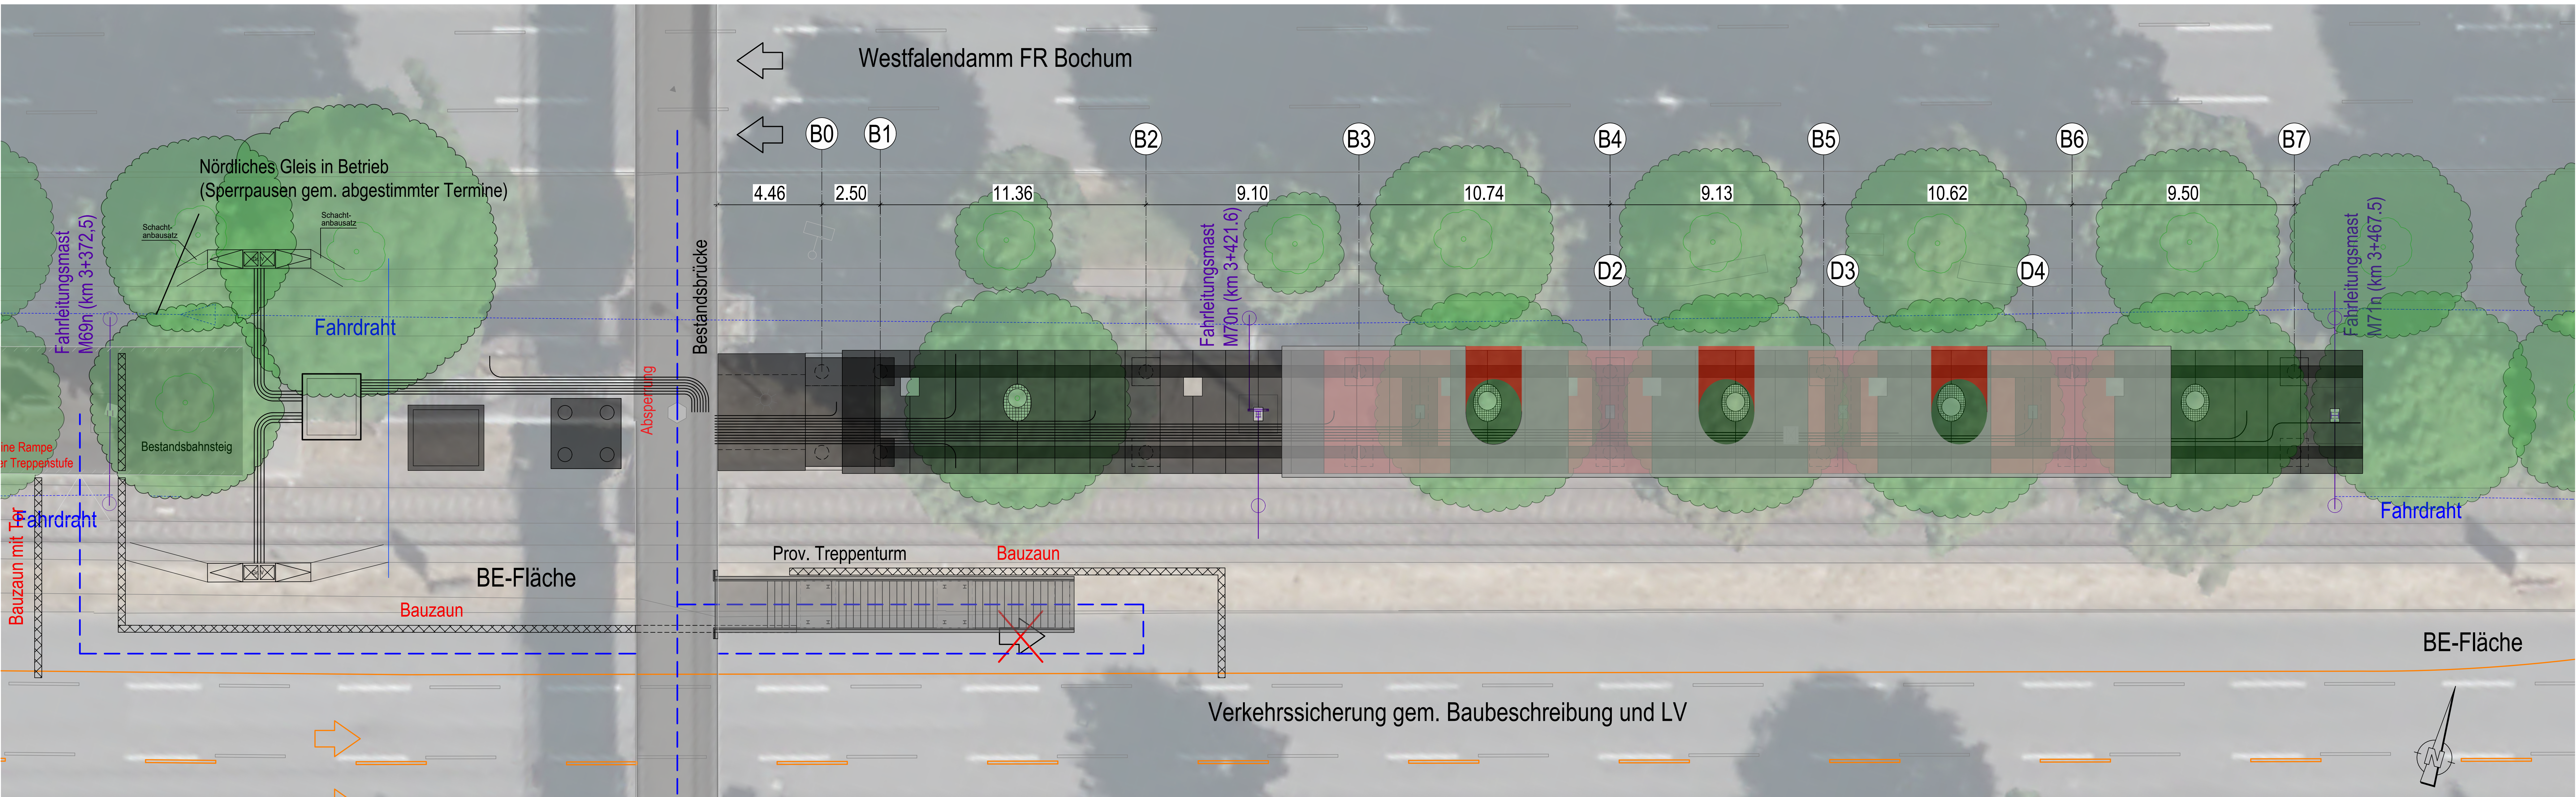


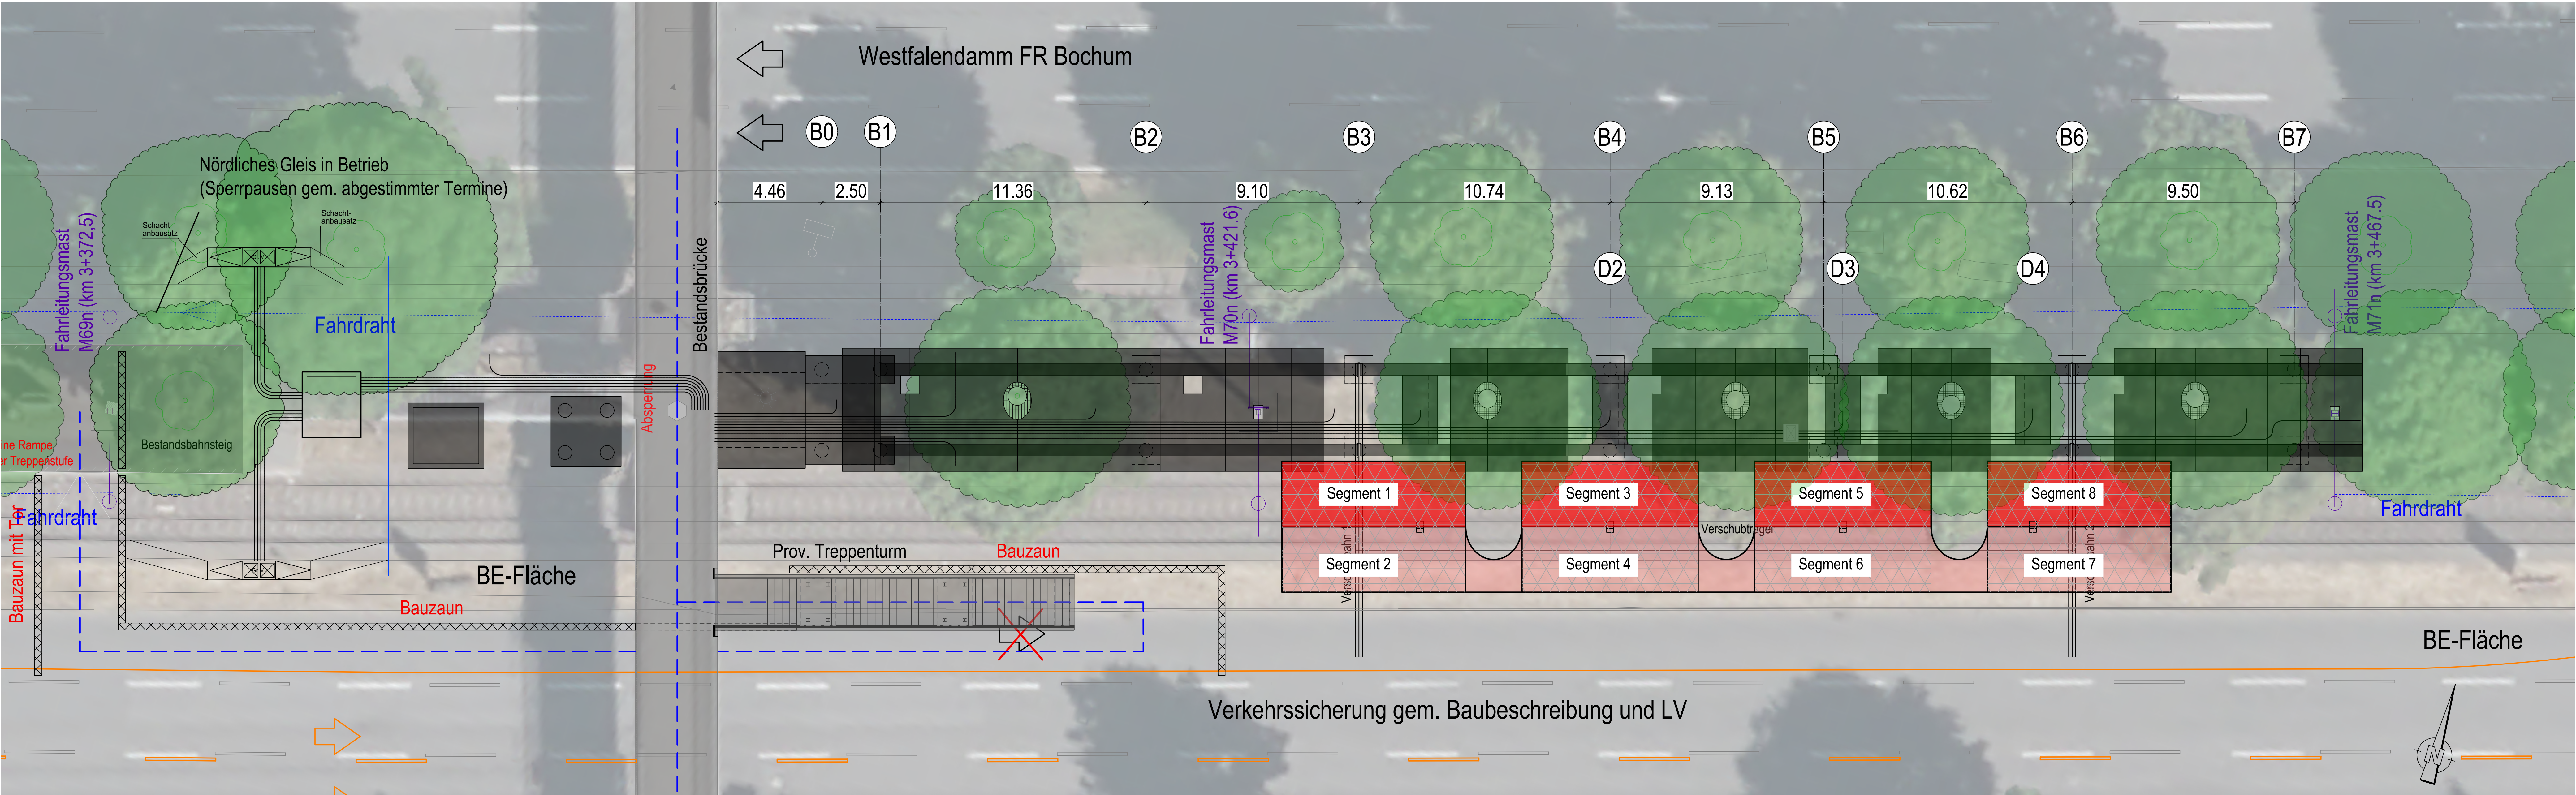

Bauphase 7: Verschiebung Stahldach und Restarbeiten Fertigteilbahnsteig (4.+5. Sperrpause)

09.10.2027 - 17.10.2027 (4. Sperrpause: 09.10.2027+10.10.2027, 5. Sperrpause: 16.10.2027+17.10.2027)

Vergabepaket Tiefbau/Brückenbau Weitere Vergabepakete Hinweise

Segmentweise Herstellung

- Das Stahldach wird abschnittsweise in Seitenlage hergestellt. Insgesamt entstehen acht Segmente, die von Westen nach Osten auf einem Traggerüst montiert werden.
- Für die Anlieferung und den Einhub der Dachsegmente wird die mittlere Fahrspur der B1 temporär gesperrt. Die Arbeiten erfolgen in verkehrsberuhigten Phasen (in der Nacht).
- Anschließend erfolgt das Verschweißen mit den bereits eingebauten Segmenten.

Anschluss der Stützenfüße

- Nach dem Querverschiebung und dem Ablassen des Dachs werden die Stützenfüße über Fußplattenanschlüsse mit Gewindestangen an den Querträgern verschraubt.

Bereich Baumstämme

- Im Bereich der Baumstämme wird das Dach zunächst nicht vollständig montiert. Die Öffnungen im nördlichen Randbereich werden erst nach dem Verschiebung geschlossen.

Bauzustand

- In den Abbildungen wird der Bauzustand des Dachs unmittelbar vor dem Verschiebung in Querlage dargestellt und in seiner Endlage.

Fertigteilbahnsteigplatten komplettieren

- Die letzten Bahnsteigplatten auflegen.

Rückbau Hilfskonstruktionen

- Nach Abschluss der Dachmontage werden die Verschiebungsträger und das Traggerüst zurückgebaut.

HINWEISE

- Änderungen zu Sperrpausen und Arbeiten im Gleisbereich (u.a. Sperr) siehe Baubeschreibung und Anlagen zu den Vergaberichtlinien

Lagesystem: UTM ETRS89, UTM32 Erdbebenzone: 0
Höhenystem: DHHN 2016 (NN+1,6 cm) Windzone: 1

Gilt nur für die Ausschreibung!

Index Art der Änderungen Datum Sachb.

• Ausfertigung Anlage



Ausschreibungszeichnung

Strecke 82 Baulos 73

Herstellung barrierefreier Haltestellen in der B1

Haltestelle Stadtkrone Ost

Bauphasen 7

Zeichen-Nr. 47/73/SKR/3/BP/723 Datum 27.08.2026

Amteitung: gez. Uehlingdahl, 1. St. Stad. Bauinsp. Bereichsteitung: gez. Hannen, 1. St. Stad. Bauinsp. Teamleitung: gez. Kastenbals, 1. St. Stad. Bauinsp. Projeksteitung: gez. Schweinsberg, 1. St. Stad. Bauinsp. Projektgenieurin: gez. Prehm, 1. St. Stad. Bauinsp.
