


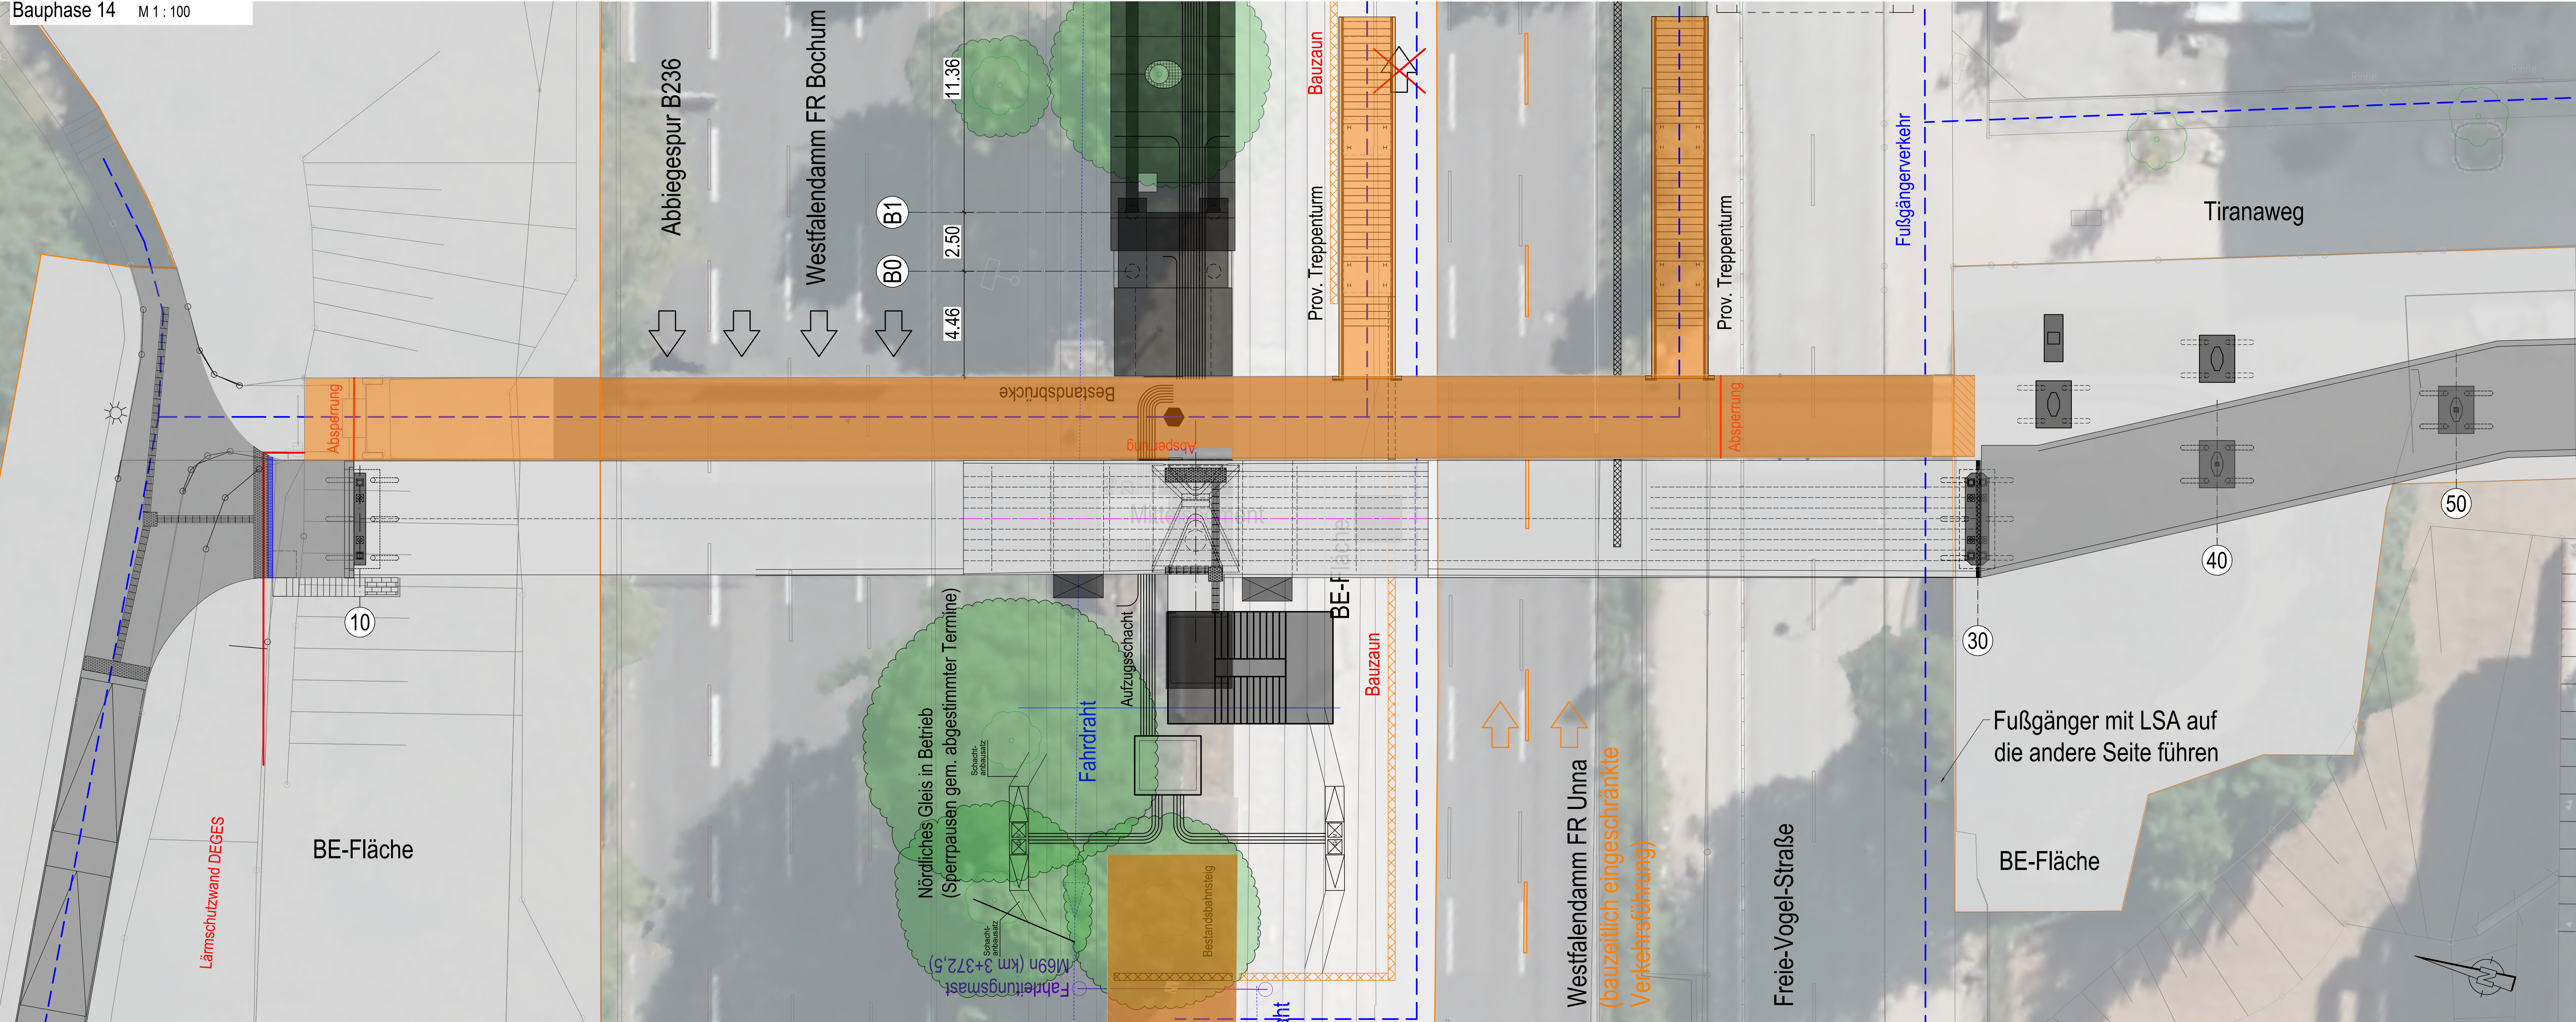

Bauphase 14: Rückbauarbeiten Bestandsanlagen

15.05.2028 - 14.07.2028

Vergabepaket Tiefbau/Brückenbau Weitere Vergabepakete Hinweise

Provisorische Anlagen


- Rückbau der östlichen provisorischen Treppentürme.
- Rückbau der Fußgängerverkehrsführung durch das südliche BE-Feld zum alten Bahnsteig.

Bestandsbrücke

- Rückbau des Überbaus: Schneiden des Überbaus ca. 3 m südlich der Pfeilerachse; Herausheben der südlichen Hälfte mit Mobilkran; Herausheben der nördlichen Hälfte mit Mobilkran; Für diese Arbeiten ist eine Sperrung der B1 erforderlich.
- Rückbau des Bestandspfeilers bis zur Pfahlkopfplatte (Tiefgründung verbleibt im Baugrund).
- Rückbau des Trennpfeilers.
- Rückbau des nördlichen Widerlagers bis ca. 0,5 m unter GOK.

Bestandsbahnsteig

- Vollständiger Rückbau des Bestandsbahnsteigs.

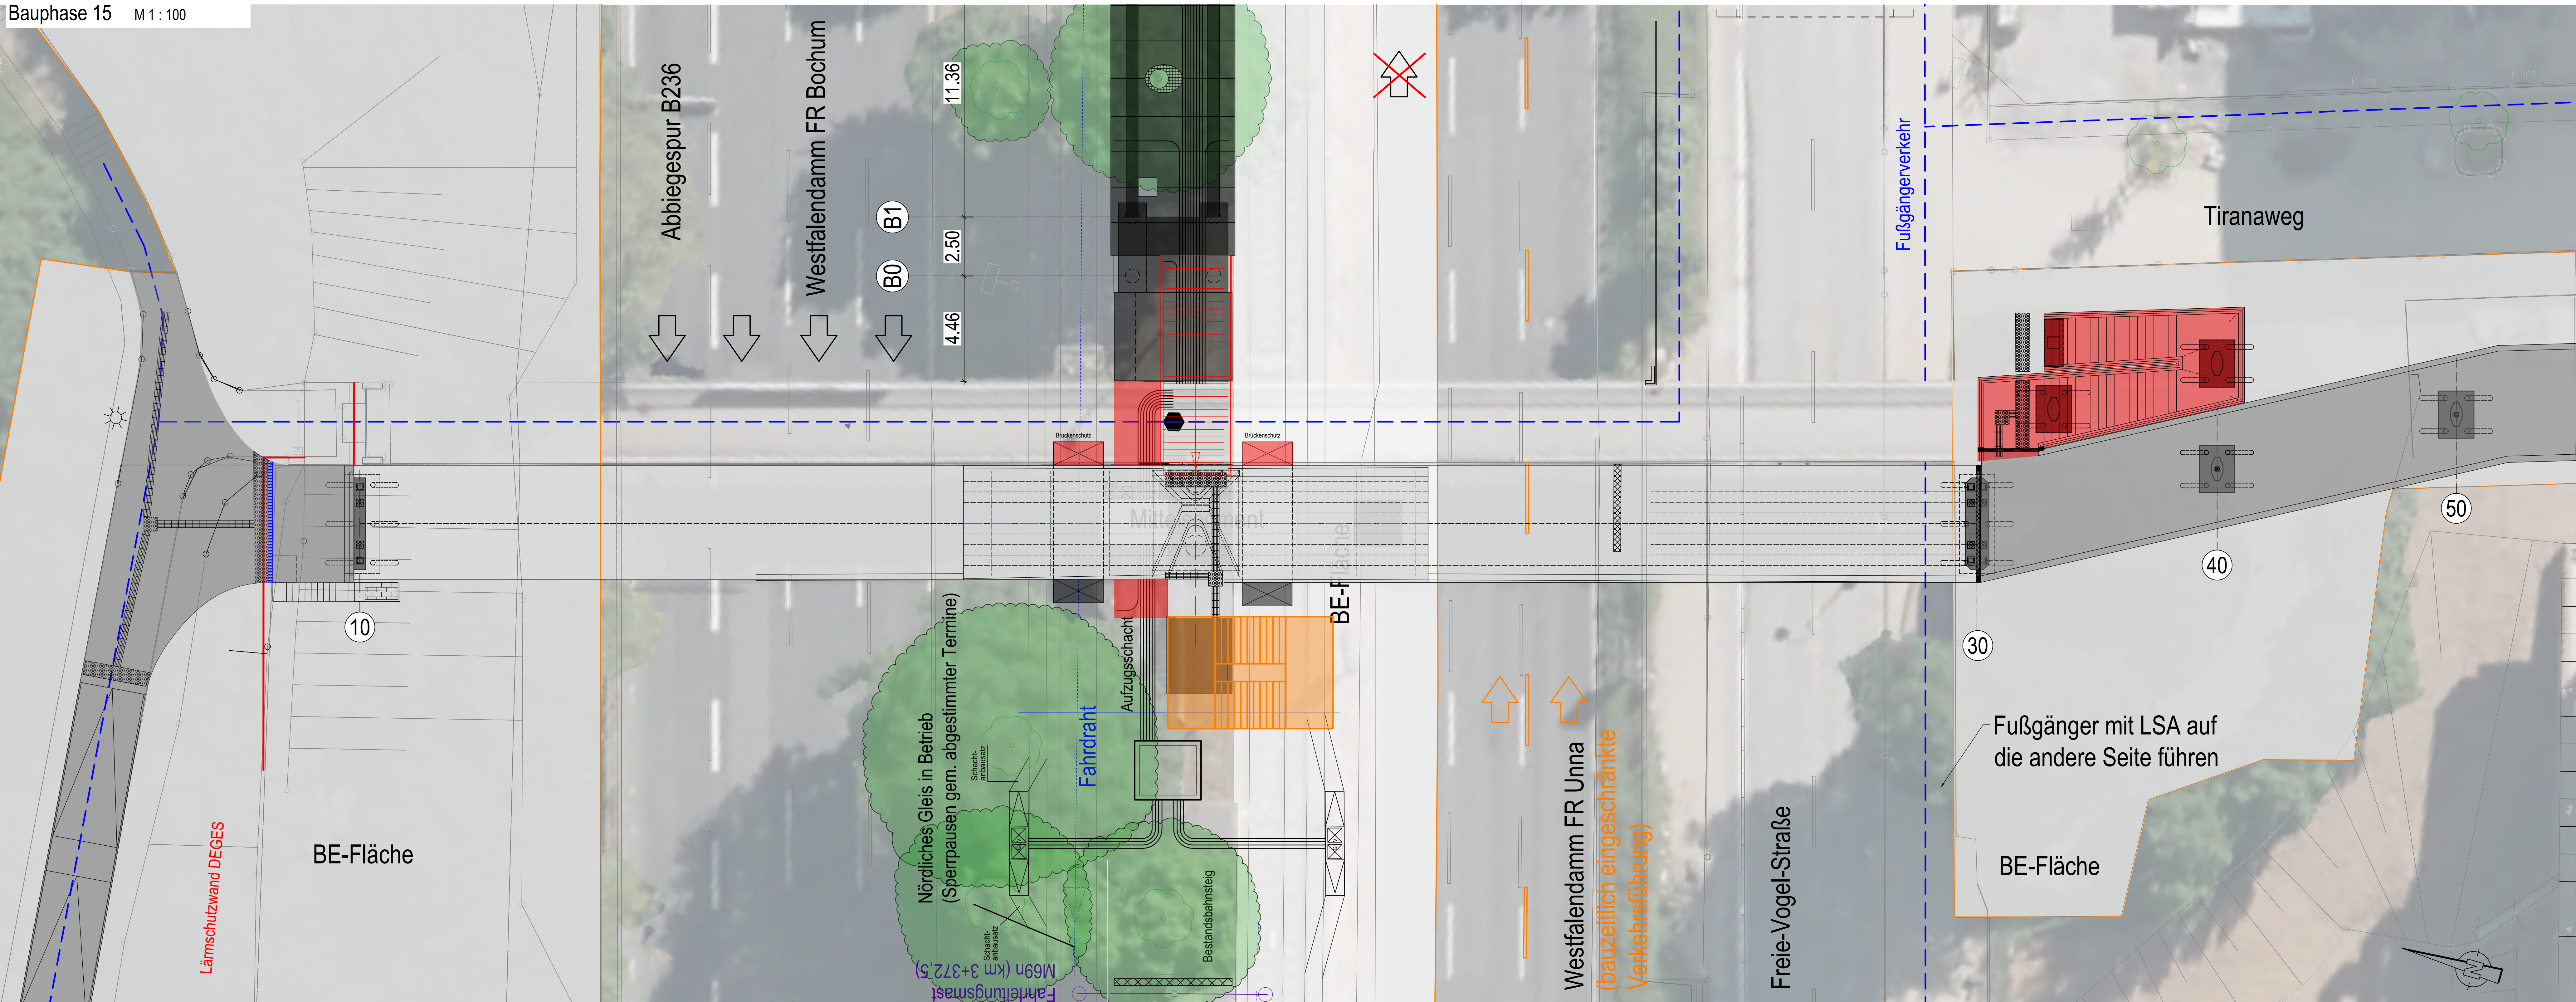

Bauphase 15: Arbeiten nach Rückbau der Bestandsbrücke

15.07.2028 + 16.07.2028(7. Sperrpause)

Vergabepaket Tiefbau/Brückenbau Weitere Vergabepakete Hinweise

Brückenschutz

- Unmittelbar nach dem Rückbau der Bestandsbrücke ist der östliche Brückenschutz anzubringen, damit die Brücke für den Fußgängerverkehr freigegeben werden kann.

Bahnsteig West

- Fertigstellung des westlichen Bahnsteigs (u. a. Herstellung der L-Winkelsteine nördlich und südlich).

Stahlterasse

- Einheben und Montage der Stahlterasse (Gewicht ca. 13 t).
- Nach Montage kann die Behelfskonstruktion am Treppenaufgang zur Brücke zurückgebaut werden.
- Umleitung des Fußgängerverkehrs auf die neue Stahlterasse.
- Rückbau des provisorischen Treppenturms.

Stahlbetonterasse Tiranaweg

- Herstellung der Stahlbetonterasse im Bereich Tiranaweg.

HINWEISE

- Änderungen zu Sperrpausen und Arbeiten im Gleisbereich (u. a. Sperr) siehe Baubeschreibung und Anlagen zu den Vergabeunterlagen

Lagesystem: UTM ETRS89, UTM32 Erdbebenzone: 0
Höhenystem: D/HN 2016 (NN) = NN+1,6 cm) Windzone: 1

Gilt nur für die Ausschreibung!

Index	Art der Änderungen	Datum	Sachb.
-------	--------------------	-------	--------

• Ausfertigung Anlage



Ausschreibungszeichnung

Strecke 82 Baulos 73

Herstellung barrierefreier Haltestellen in der B1

Haltestelle Stadtkrone Ost Maßstab

Bauphasen 14+15 1:100

Zeichen-Nr. 47/73/SKR/3/BP/727 Datum 27.08.2026

Amteileitung: gez. Uehlenhuth, 1. St. St. Bauingenieur, Bereichsleitung: gez. Hannen, 1. St. St. Bauingenieur, Teamleitung: gez. Kastenholz, 1. St. St. Bauingenieur, Projektleitung: gez. Schweinsberg, 1. St. St. Bauingenieur, Projektgenieurin: gez. Prehm, 1. St. St. Bauingenieurin
