


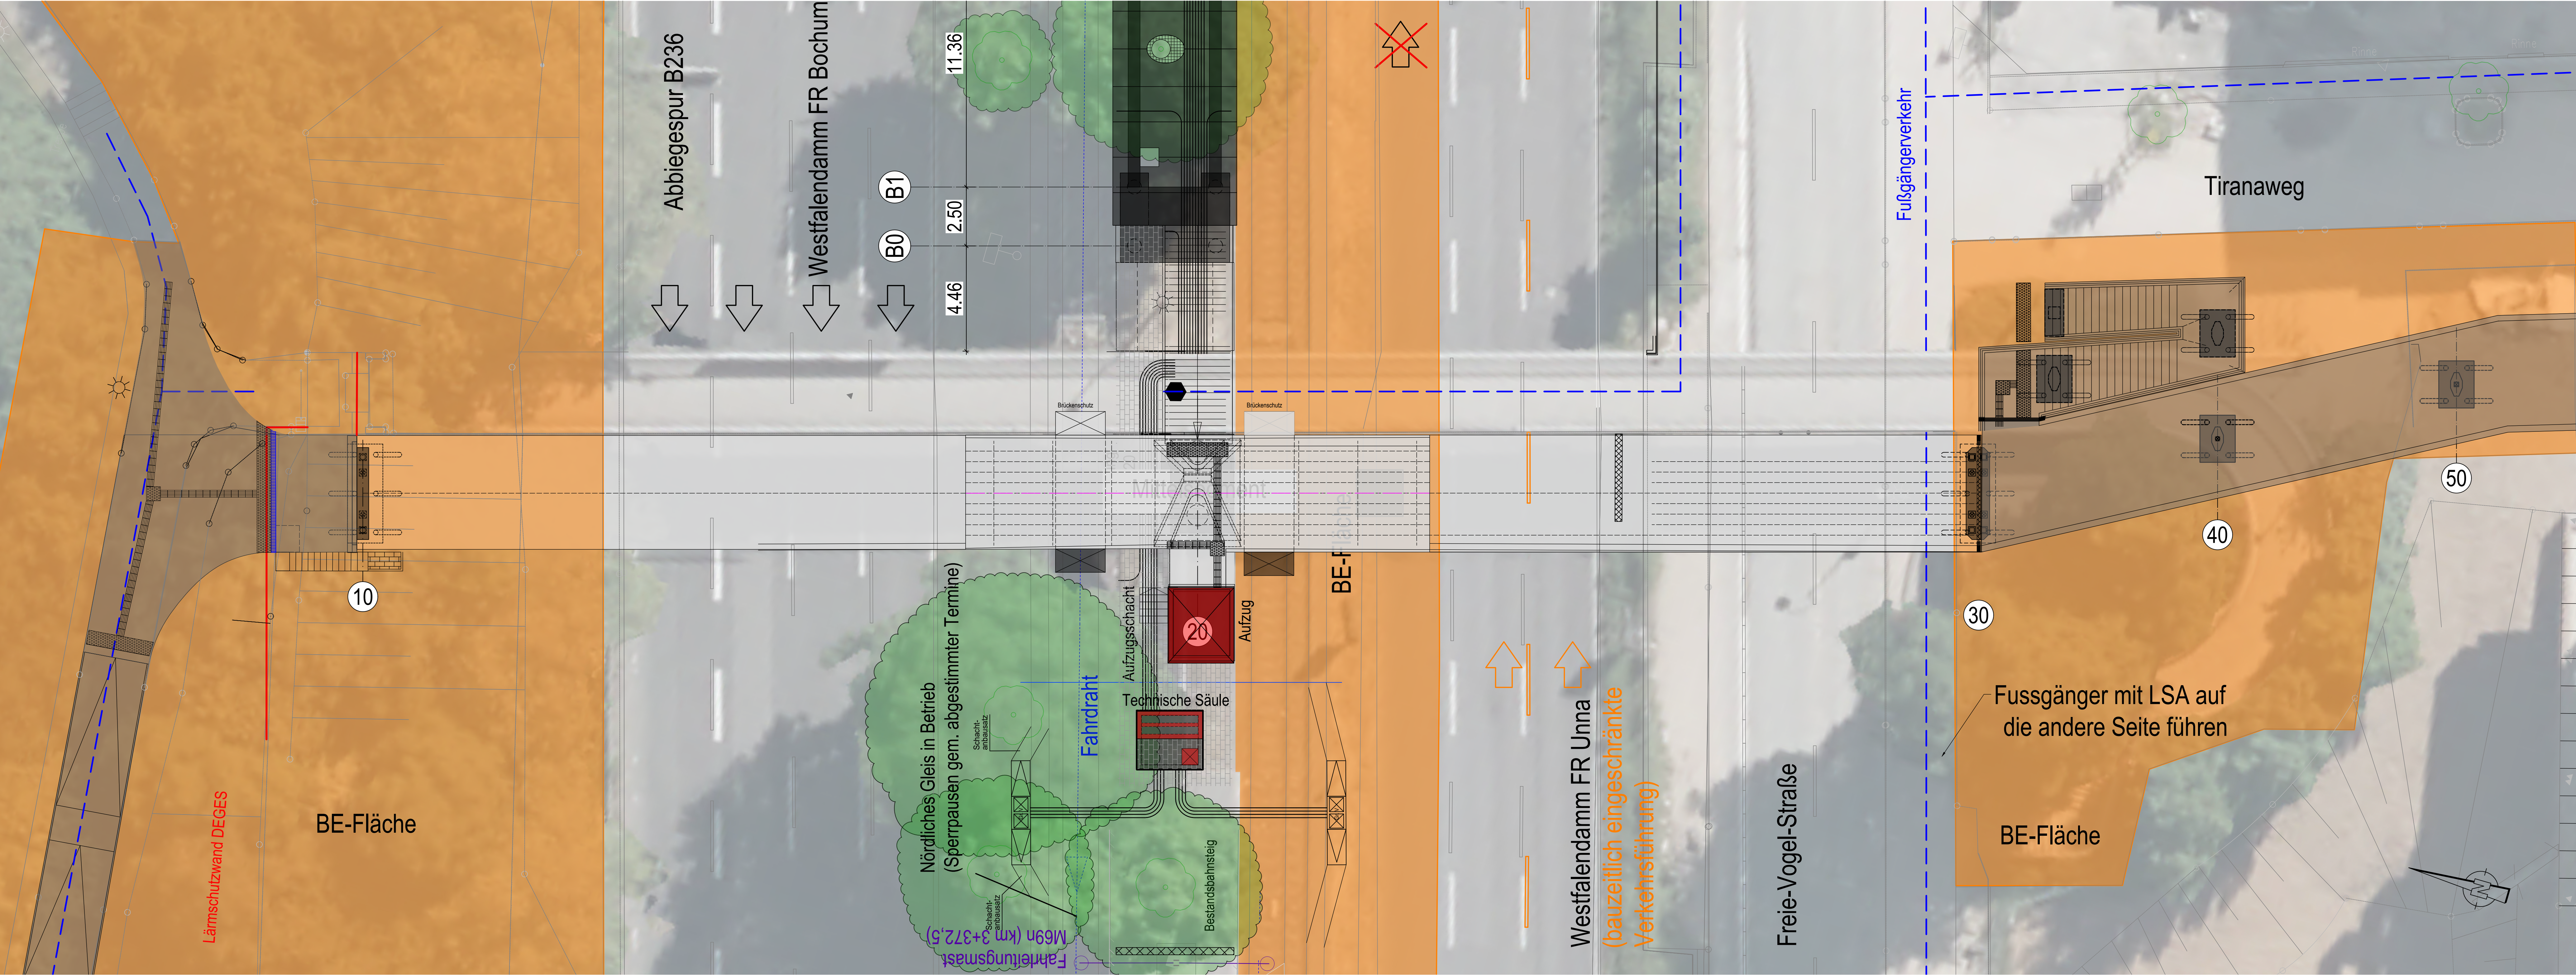

Bauphase 16+17: Abschlussarbeiten (und 8. Sperrpause)

17.07.2028 - 17.09.2028(8. Sperrpause 16.09.2028 + 17.09.2028)

Vergabepaket Tiefbau/Brückenbau Weitere Vergabepakete Hinweise

Aufzug

- Montage des Aufzugs.

Technische Säule (TS)

- Montage und Anschluss der Technischen Säule.
- Pflasterung der umgebenden Flächen.

Oberleitungsanlage


- Einhängen des Fahrdrahts für die südlichen Gleise.

Rückbau Baustelleneinrichtungsfächen

- Rückbau der BE-Flächen und Wiederherstellung des regulären Verkehrs auf der B1.

Bahnverkehr

- Wiederinbetriebnahme des südlichen Gleises.

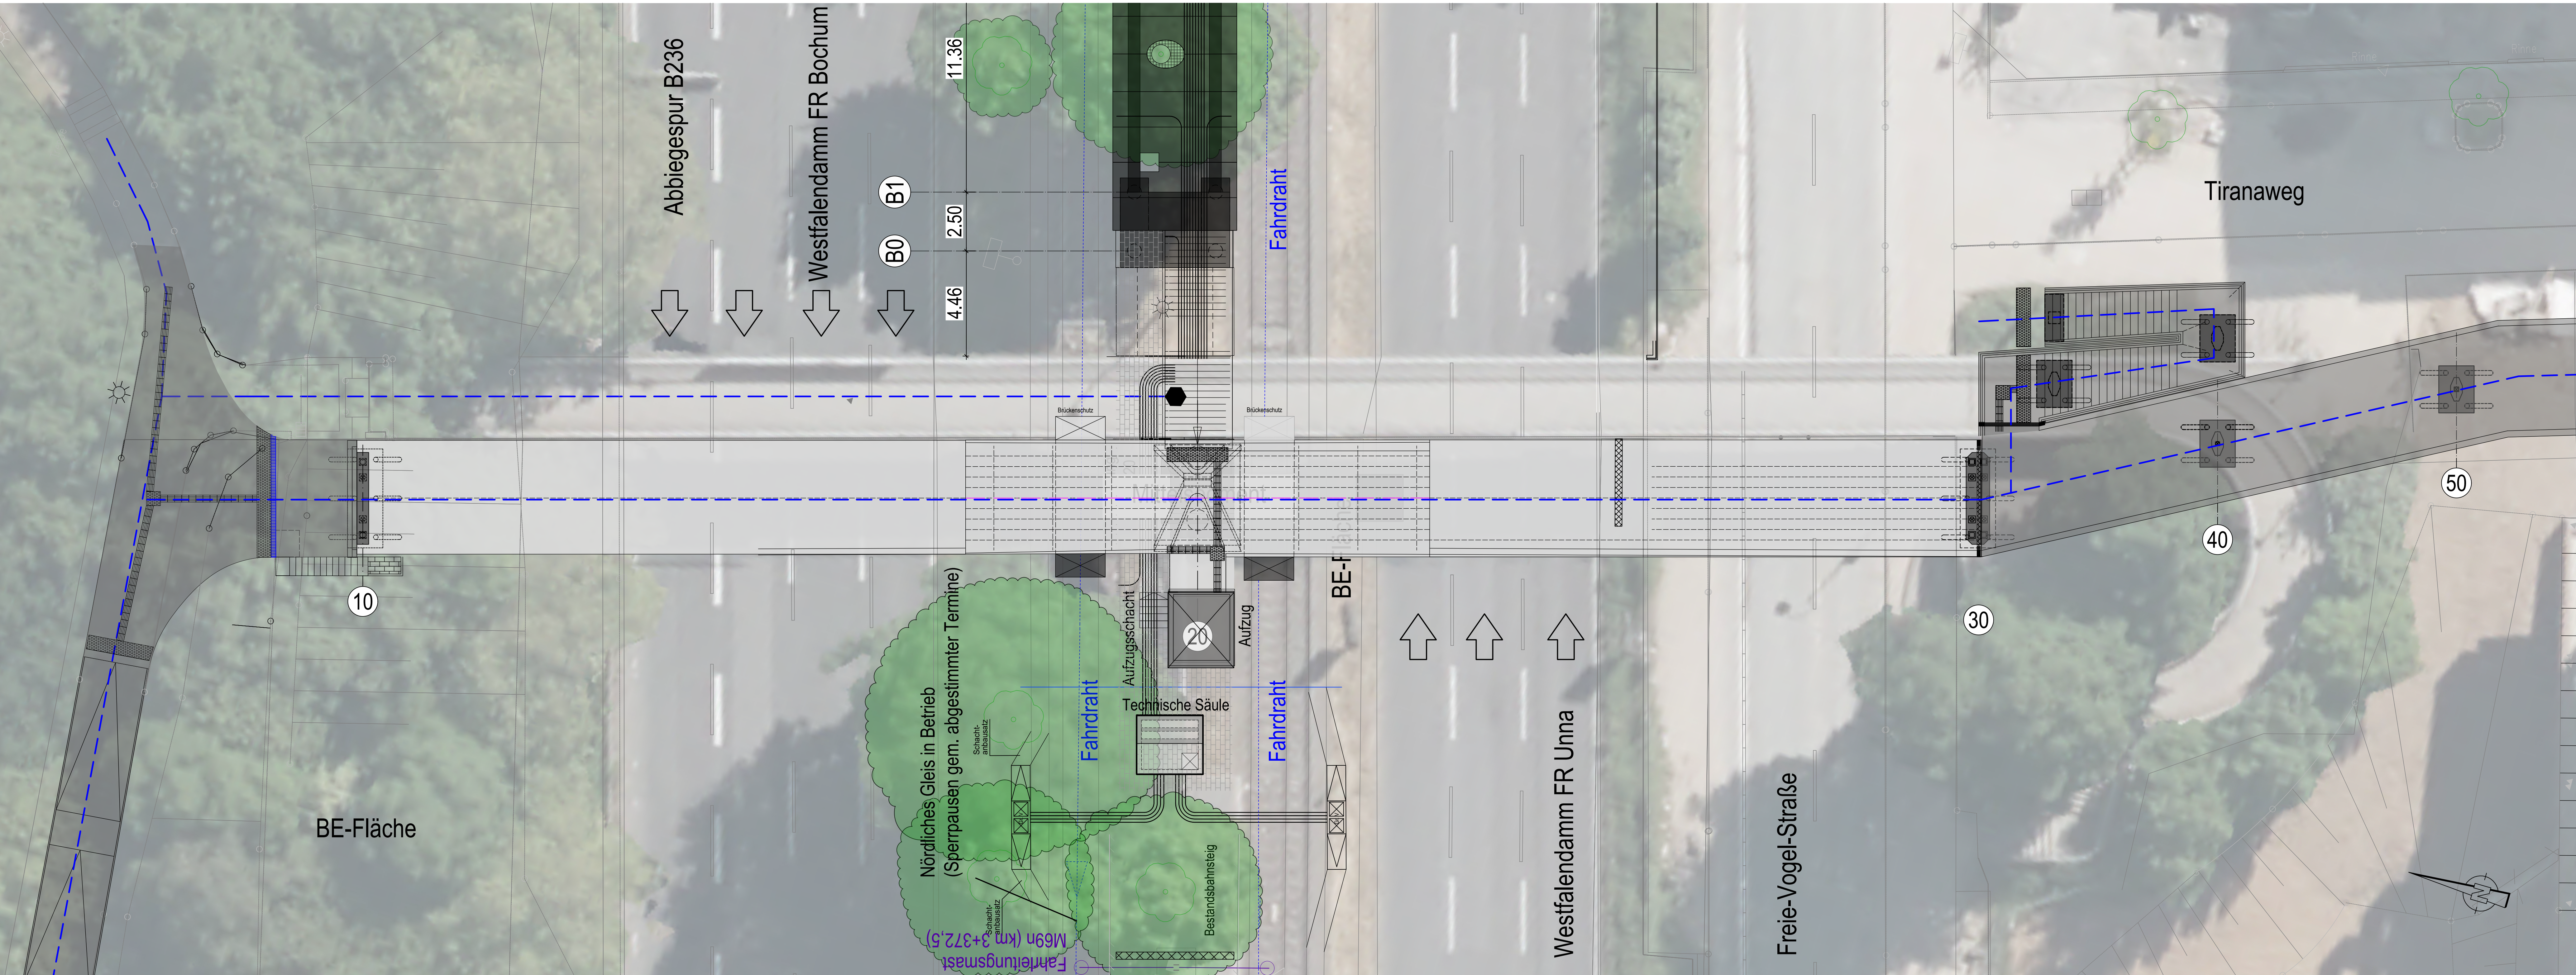

Bauphase 18: Abschluss der Maßnahme


18.09.2028 - 30.09.2028

Vergabepaket Tiefbau/Brückenbau

- Nach Abschluss aller Rückbau- und Wiederherstellungsarbeiten ist der Neubau vollständig fertiggestellt.

HINWEISE			
• Regelungen zu Sperrpausen und Arbeiten im Gleisbereich (u.a. SpG) siehe Baubeschreibung und Anlagen zu den Vergabeunterlagen			
Lagesystem:	UTM ETRS89, UTM32	Erdbebenzone:	0
Höhenystem:	D/H+N 2016 (NNH = NN+1,6 cm)	Windzone:	1

Gilt nur für die Ausschreibung!				
Index	Art der Änderungen		Datum	Sachb.
• Ausfertigung		Anlage		



Ausschreibungszeichnung				
Strecke 82	Baulos 73			
Herstellung barrierefreier Haltestellen in der B1				
Haltestelle Stadtkrone Ost				
Bauphasen 16+17+18				
Zeichen-Nr. 47/73/SKR/3/BP/728				
Amtsleitung	Bereichsleitung	Teamleitung	Projektleitung	Projektungsamtm.
gez. U. Hendschell Lfd. Stab. Baubereich	gez. H. Hannen Lfd. Stab. Baubereich	gez. K. Kastenbals Lfd. Stab. Baubereich	gez. S. Schweinsberg Lfd. Stab. Baubereich	gez. P. Prehm Lfd. Stab. Baubereich
