

Analge 2 – Baustelleneinrichtungsfläche



Abbildung 1 Draufsicht Talbrücke Helfe

Die Helfer Straße ist im Bereich der Talbrücke Helfe vollständig zu sperren.



Abbildung 2 Baustelleneinrichtungsfläche

In Abbildung 2 ist die Baustelleneinrichtungsfläche blau dargestellt. Die rot markierte Linie zeigt den geplanten Bauzaunverlauf.

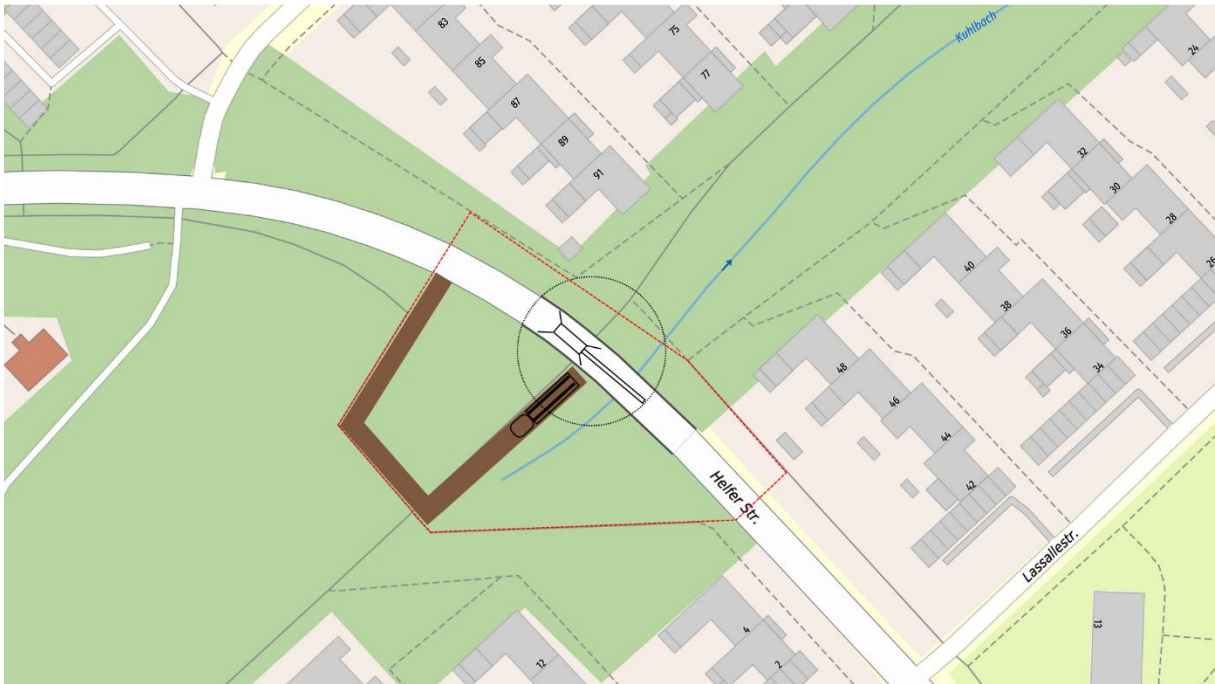


Abbildung 3 Platzierung von Kran und Tieflader

Abbildung 3 zeigt die Position des Mobilkrans, der zum Einheben der Spannbeton-Fertigträger eingesetzt wird. Der Kran wird hinter dem Widerlager auf der Helfer Straße aufgestellt, um die Träger vom Tieflader/Telesattler aufzunehmen und an der vorgesehenen Stelle zu lagern.

Für das Befahren des Bereichs unter der Brücke ist ein temporäres Schotterbett herzustellen, das von der Helfer Straße bis zur vorgesehenen Abstellposition führt. Diese Leistung ist in Pos. 5.1.20 beschrieben. In Abbildung 3 ist das Schotterbett dargestellt.



Abbildung 4 Erhaltung der Gehwege und Schutz des Kuhlbachs

In Abbildung 4 sind die Gehwege sowie der Kuhlbach dargestellt. Der Kuhlbach (Braun) soll aus stählernen Platten von herabfallenden Materialien sowie für den Übergang von Geräten ausgeführt werden und umfasst das in der Pos. 1.4.30 beschriebenen Leistungen.

Die Gehwege grün dargestellt sollen während der Bauphase erhalten bleiben und den Verkehr durchlaufen zu ermöglichen. Der in Rot dargestellte Gehweg soll für die Bauphase ausgebaut werden und nach dem Arbeiten wieder hergestellt werden. Das umfasst die Leistungen aus Pos. 2.1.50-80
