


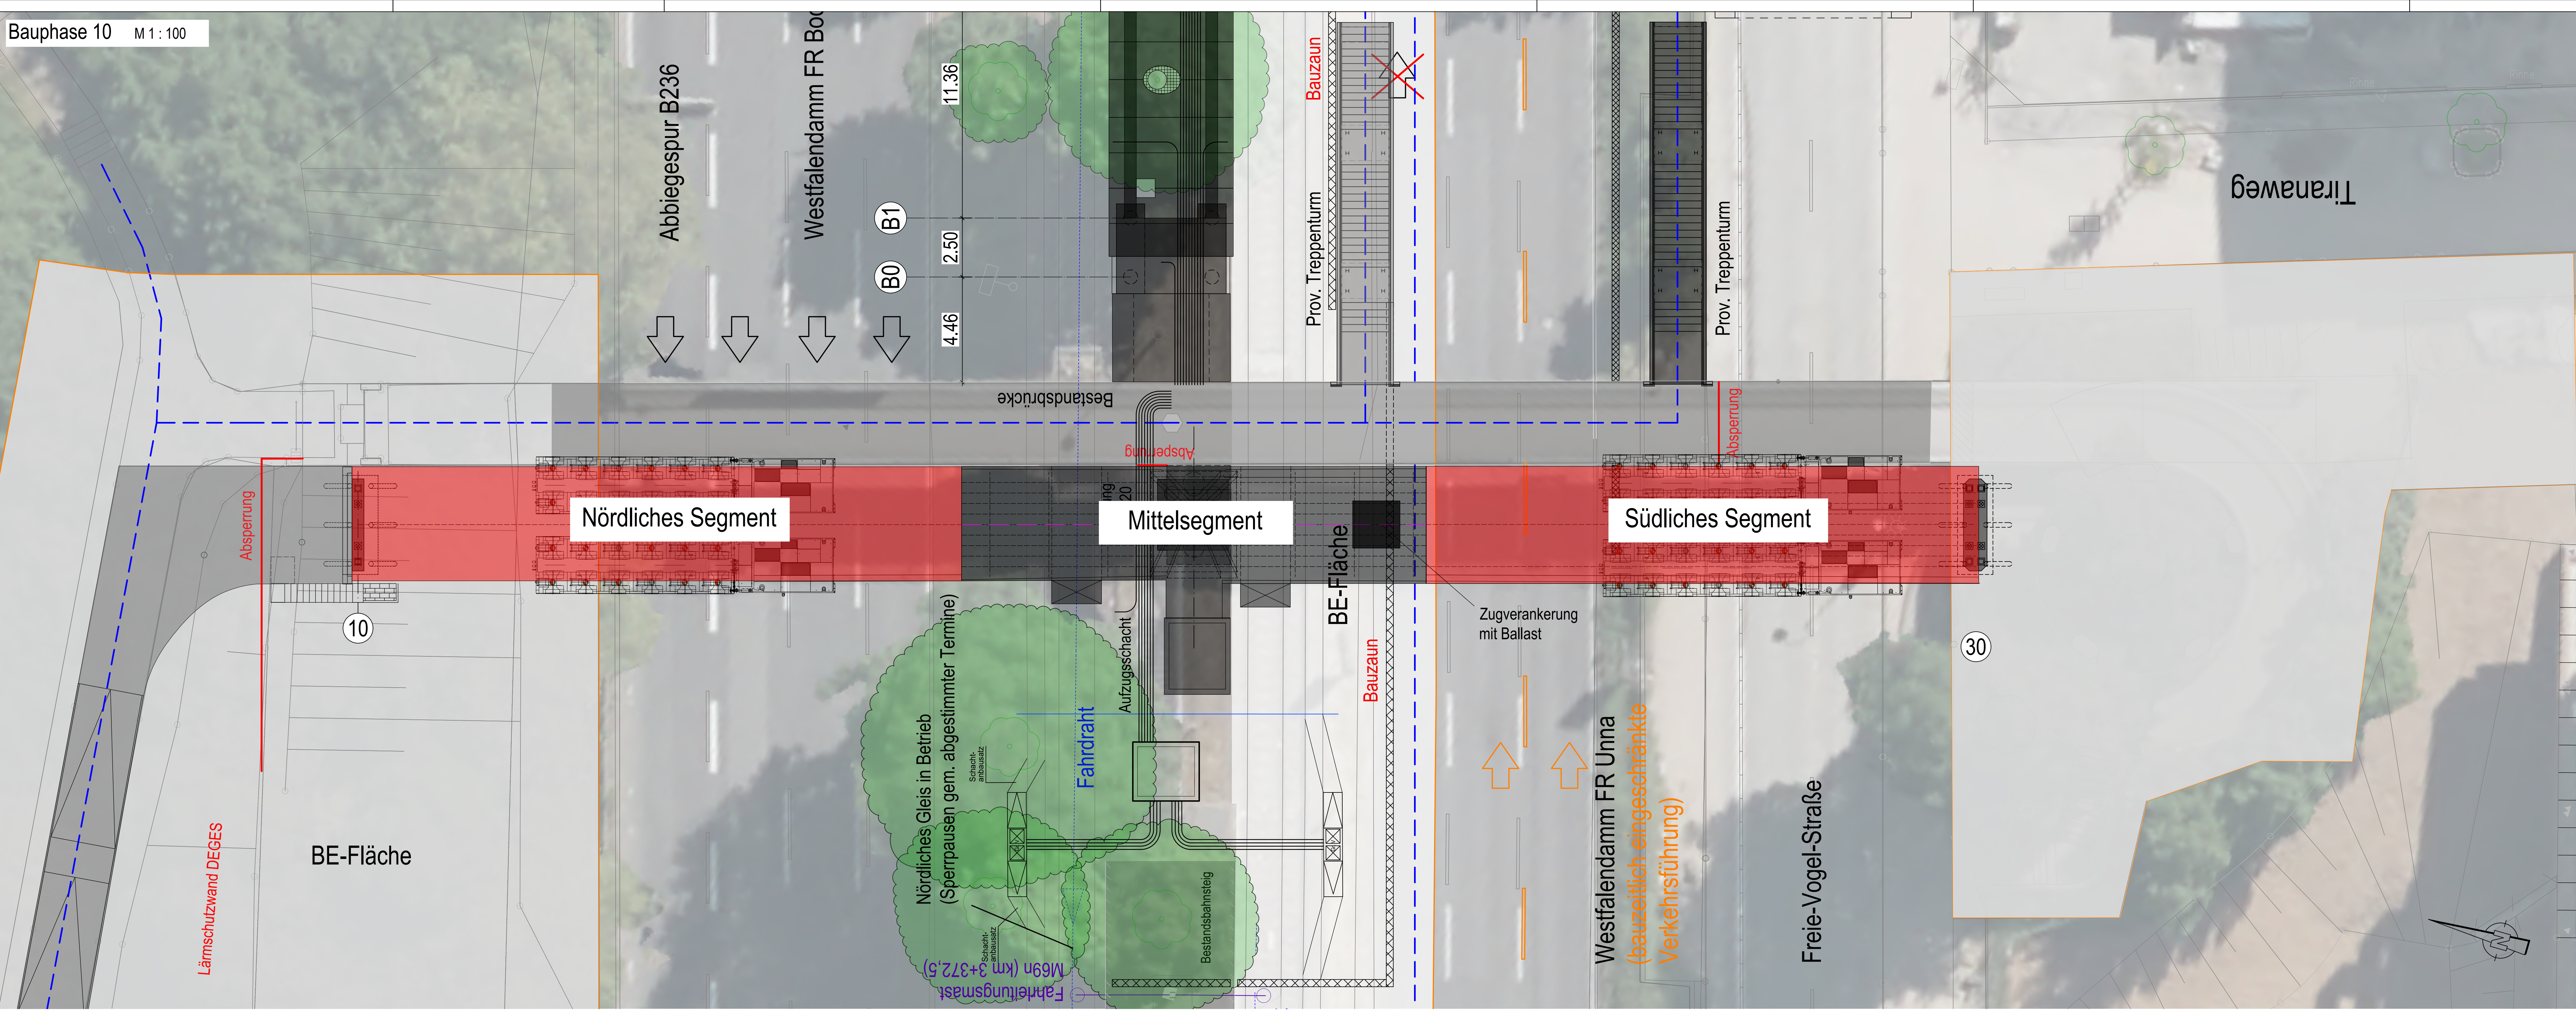

Bauphase 10: Einbau Nord- und Südsegment Brücke (6. Sperrpause)

08.01.2027+09.01.2027

Vergabepaket Tiefbau/Brückenbau Weitere Vergabepakete Hinweise

- Transport und Positionierung**
- Den nördlichen Brückenüberbau auf SPMT-Fahrzeugen hochstapeln und in die Endposition verfahren.
 - Anschließend das Verfahren analog mit dem südlichen Brückensegment durchführen.

- Montagearbeiten**
- Verschlossern der Stahlüberbauten.
 - Verschweißen der Verbindungen.



Bauphase 11: Arbeiten im Bereich BE-Fläche Tiranaweg

10.01.2028 - 18.02.2028

Vergabepaket Tiefbau/Brückenbau Weitere Vergabepakete Hinweise

- Gründungen und Unterbauten**
- Herstellung der Mikropfahlgründungen sowie der Unterbauten (Pfeiler und Widerlagerwand) in den Achsen 40, 50 und 60.
 - Herstellung der Gründungen und Unterbauten für die Stahlbetontreppe.

- Conti-Zugang**
- Der Zugang zur Conti wird mit einem **Lehrgerüst** umhüllt, sodass ein provisorischer **Tunneldurchgang** entsteht.
 - Das Lehrgerüst dient gleichzeitig als Schalengerüst für die anschließende Betonierung des Stahlbetonüberbaus.

HINWEISE			
• Regelungen zu Sperrpausen und Arbeiten im Gleisbereich (u.a. SpSt) siehe Baubeschreibung und Anlagen zu den Vergabebeschreibungen			
Lagesystem:	UTM ETRS89, UTM32	Erdbenenzone:	0
Höhenystem:	DHN 2016 (NN = NN+1,6 cm)	Windzone:	1

Gilt nur für die Ausschreibung!

Index	Art der Änderungen	Datum	Sachz.
• Ausfertigung		Anlage	
 DO Stadt Dortmund Tiefbauamt		 stadt dortmund	
Ausschreibungszeichnung			
Strecke 82		Baulos 73	
Herstellung barrierefreier Haltestellen in der B1			
Haltestelle Stadtkrone Ost			Maßstab
Bauphasen 10+11			1:100
Zeichen-Nr. 47/73/SKR/3/BP/725			
Datum 27.08.2026		Datum 27.08.2026	
Amtsleitung gez. Uehlingsdahl Lst. Stadt Baubereich	Bereichsleitung gez. Hannen Lst. Stadt Baubereich	Teamentleitung gez. Kistenbals Lst. Ing.	Projektleitung gez. Schweinsberg Lst. Ing.
Projektingenieurin gez. Prehm Lst. Ing.			
