



Bauphase 1: Einbau Bauweichen und Umschluss auf nördliches Gleis (1. Sperrpause)

20./21.02.2027

Vergabepaket Tiefbau/Brückenbau

Weitere Vergabepakete


Hinweise

Ausgangslage und Vorabmaßnahmen

- Einrichtung der provisorischen Verkehrsführung in der Freie-Vogel-Straße sowie Durchführung der Baumrodungen.
- Herstellung provisorischer Treppenturm einschließlich Geländerarbeiten auf der Brücke.
- Absperrung auf der Brücke im Bereich der Wendel.
- Wendel zurückgebaut
- Umverlegung der Wassertransportleitung DN 800.
- Die DONetz hat im Jahr 2022 Suchschachtungen im Bereich der Achsen B0 bis B3 durchgeführt. Es ist nicht mit einer Kollision zwischen Tiefgründungen und Leitungen zu rechnen. Vor Beginn der Gründungsarbeiten sind jedoch Suchschürfe an den geplanten Bohrpunkten erforderlich, um sicherzustellen, dass die Leitungen nicht beeinträchtigt werden. Vor allem die Lage der Telekomleitungen ist zu überprüfen.

Außerbetriebnahme des südlichen Gleises

- Aufbau der Oberleitungsanlagen (OLA) und Fahrstromanlagen (FSA).
- Einbau der Weichen.
- Umschluss auf das nördliche Gleis.
- Außerbetriebnahme des südlichen Gleises.
- Wiedereinbetriebnahme des nördlichen Gleises (Betrieb im eingeleisigen Zustand).
- Abhängen des Fahrdrachts zwischen den Leitungsmasten M69n und M71n sowie Errichtung der Endfahrleitungsmasten. (Eine Fahrdrachtabhängung erfolgt ausschließlich für das südliche Gleis).

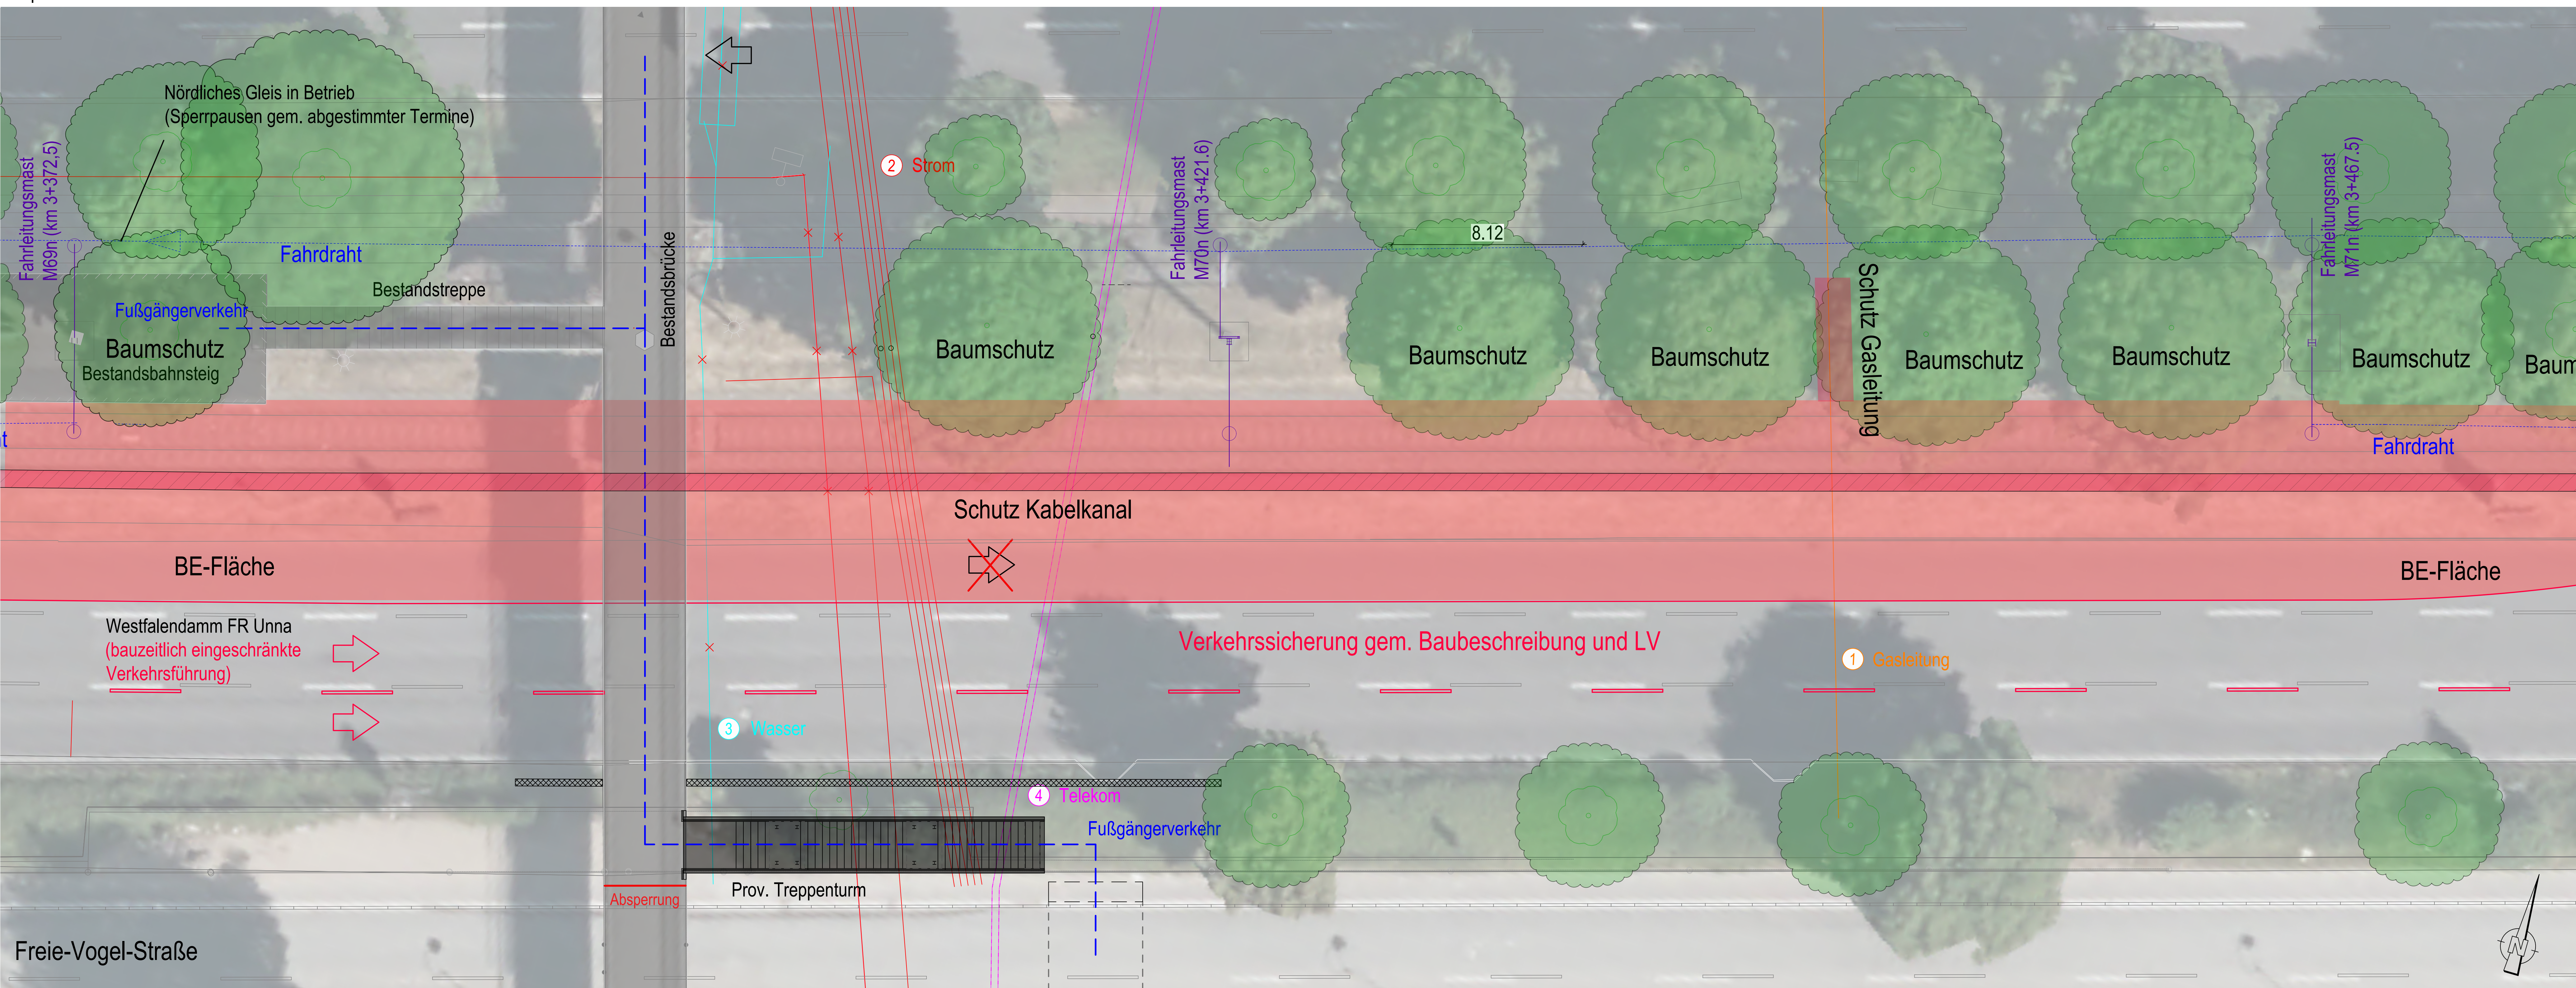

Bauphase 2: Einrichtung südliche Baustelleneinrichtungsfläche und Schutzarbeiten

22.02.2027 - 19.03.2027

Vergabepaket Tiefbau/Brückenbau

Weitere Vergabepakete

Hinweise

Einrichtung der südlichen Baustelleneinrichtungsfläche

- Durchführung provisorischer Verkehrssicherungsarbeiten auf der B1 (Fahrtrichtung Unna).
- Einrichtung des Baubereichs Süd (BE-Fläche) einschließlich Ausbohlung des südlichen Gleises (siehe LV-Positionen).

Schutzarbeiten

- Baumschutz herstellen (Stammschutz und Schutzmatten zur Lastverteilung).
- Schutzkonstruktion (Verbau) für die Gasleitung herstellen.
- Schutzkonstruktion für den südlichen Kabelkanal der Stadtbahn herstellen.

LEGENDE LEITUNGEN

Gas	①	Mischwasser-Kanal	⑤
Strom	②	Regenwasser-Kanal	⑥
Wasser	③	städtische Leitungen Bestand LWL	⑦
Telekom	④	Stadtbahn	⑧

Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten bei den Versorgungsunternehmen über die genaue Lage der Versorgungsanlagen erkundigen.

HINWEISE

- Regelungen zu Sperrpausen und Arbeiten im Gleisbereich (u.a. Sperr) siehe Baubeschreibung und Anlagen zu den Vergabebereichen

Lagesystem: UTM ETR898 UTM32 Erdbebenzone: 0
Höhensystem: DHHN 2016 (NN=NN+1,6 cm) Windzone: 1

Gilt nur für die Ausschreibung!

Index	Art der Änderungen	Datum	Schreib.
-------	--------------------	-------	----------

- Ausfertigung



Ausschreibungszeichnung

Strecke 82 Baulos 73

Herstellung barrierefreier Haltestellen in der B1

Haltestelle Stadtkrone Ost

Bauphasen 1+2 Maßstab 1:100

Zeichen-Nr. 47/73/SKR/3/BP/720 Datum 27.08.2026

Amteileitung	Bereichsleitung	Teamentleitung	Projektleitung	Projektingenieur
gez. Uehendahl Lfd. Stab. Baubeschreibung	gez. Hannen Lfd. Stab. Baubeschreibung	gez. Kastenbals Lfd. Stab. Baubeschreibung	gez. Schweinsberg Lfd. Stab. Baubeschreibung	gez. Priebe Lfd. Stab. Baubeschreibung
