



Probenahmeprotokoll

Projekt:	Sanierung Gasbodenfackel Kokerei Zollverein, Essen	Entnahmedatum:	17.04.2026
Probenbezeichnung:	MP 14a	Probenehmer:	Ed
Projektadresse	Gelsenkirchener Str. 181, 45309 Essen		
Etage / Raum	-		
Lagedetail	Innenwandung; obere Lage		
Probenart	Hitzeschutzverkleidung		
Materialdetail	Schamottebeton		
Analytik	EBV RC-Material		

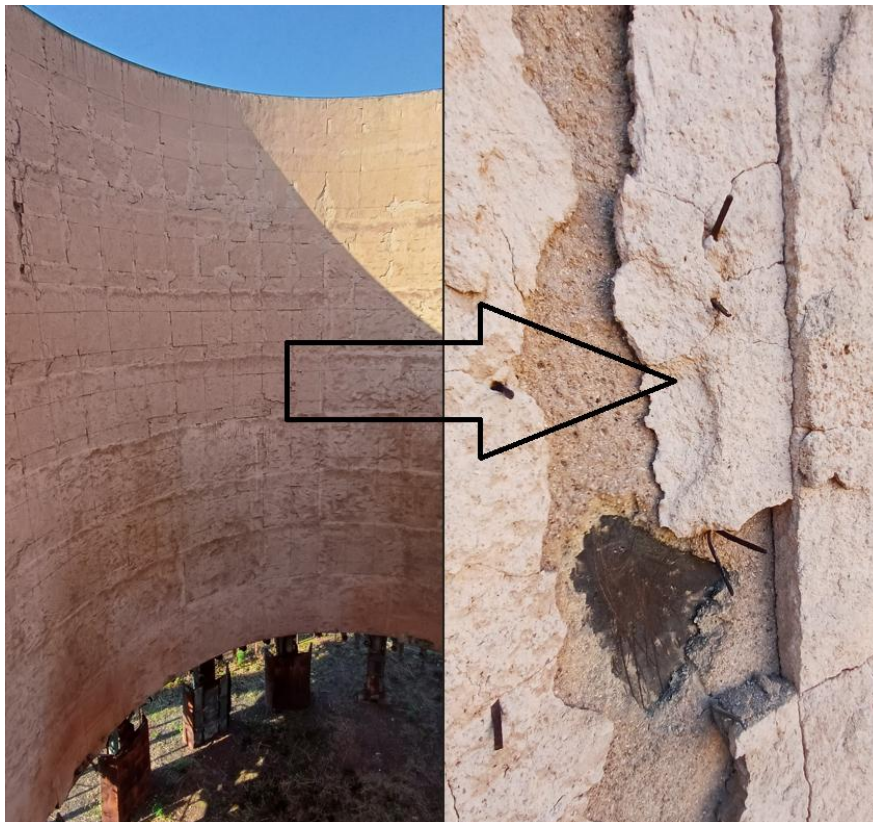

Ergebnis:

RC-3

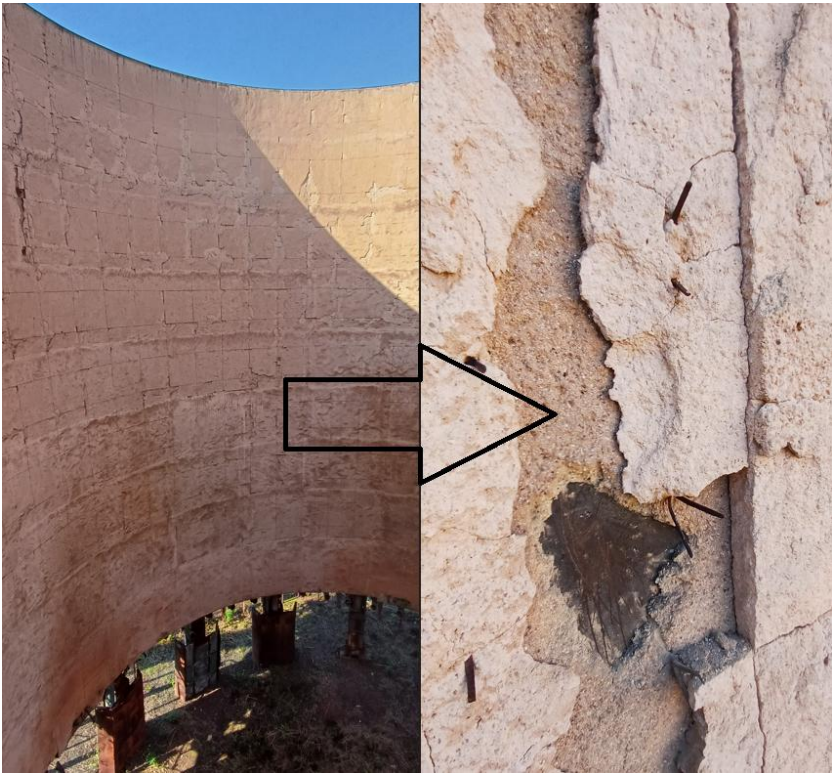Probenahmeprotokoll		
Projekt:	Sanierung Gasbodenfackel Kokerei Zollverein, Essen	Entnahmedatum: 17.04.2026
Probenbezeichnung:	MP 14b	Probenehmer: Ed
Projektadresse	Gelsenkirchener Str. 181, 45309 Essen	
Etage / Raum	-	
Lagedetail	Innenwandung; untere Lage	
Probenart	Bettung der Hitzeschutzverkleidung	
Materialdetail	Bettungsmaterial der Hitzeschutzverkleidung	
Analytik	EBV RC-Material	
		
Ergebnis:	RC-1 im Eluat	Überwachungswert für Chrom im Feststoff ist überschritten

Probenahmeprotokoll		
Projekt:	Sanierung Gasbodenfackel Kokerei Zollverein, Essen	Entnahmedatum: 17.04.2026
Probenbezeichnung:	MP 15	Probenehmer: Ed
Projektadresse	Gelsenkirchener Str. 181, 45309 Essen	
Etage / Raum	-	
Lagedetail	Innenwandung; zwischen Metall und Bettung	
Probenart	Farbanstrich / Trennlage	
Materialdetail	Anstrich (Schwarz)	
Analytik	PAK, Asbest (NWG 0,001 %)	
		
Ergebnis:	PAK: 1,54 [mg/kg]	Asbest nicht nachgewiesen
