
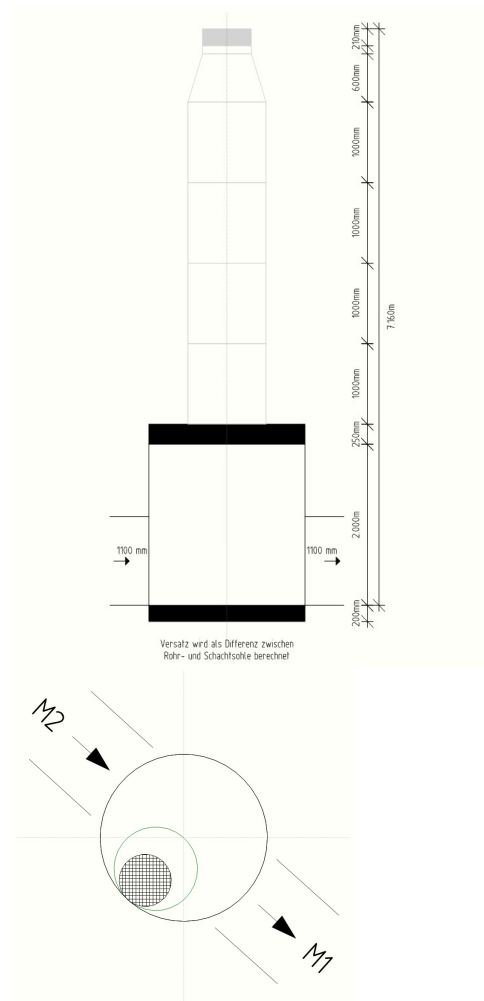


Schachtliste 3. BA Vestische Straße

Schacht- bezeichnung	Rechtswert	Hochwert	Schacht- durch- messer	Deckel- höhe	Ordinaten bezogen auf mNN					Rohrnnennweiten/Material			Schacht- höhe	Bemerkungen		
					Sohlhöhen/Richtungswinkel											
	E1	W1			E2	W2	A	E1	E2	A	h					
[m]	[m]	[m]	[mm]	[m]	[m]	[gon]	[m]	[gon]	[m]	[mm]/---	[mm]/---	[mm]/---	[m]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
M1	32352207,111	5708357,893	2000	48,260	41,100	200,437			41,100	1100	SB		1100	SB	7,160	
M2	32352173,804	5708388,211	2000	47,860	41,250	199,731			41,250	1100	SB		1100	SB	6,610	
M5	32352088,776	5708464,953	2000	46,430	41,640	199,987			41,640	1100	SB		1100	SB	4,790	
M7	32352003,600	5708540,617	1500	45,820	42,206	199,993			42,206	600	SB		600	SB	3,614	
M9	32351867,099	5708660,734	1200	48,370	43,241	200,000			43,241	500	SB		500	SB	5,129	
M10	32351811,315	5708709,615	1200	48,870					43,660				500	SB	5,210	
M8b	32351966,125	5708573,694	1500	46,260	42,490	199,994			42,490	600	SB		600	SB	3,770	
M8c	32351997,133	5708534,733	1000	45,715					42,720				300	STZ	2,995	
M8d	32351930,152	5708624,974	1200	47,557	44,460	200,001			43,360	350	STZ		400	STZ	4,197	
M6.1	32352067,920	5708491,535	1500	46,047	41,770	183,155			41,770	700	B		700	SB	4,277	

Maß- und Bestellblatt für Fertigteilschächte DIN 4034




Baustelle			
Bezeichnung:	3. BA Vestische Straße	Nummer:	
Schachtbezeichnung:	M1	OKante/Deckel:	48.260 mNN
		Schachtsohle:	41.100 mNN
Schacht-DN:	2000 mm	Schachthöhe:	7.160 m
Lieferfolge:		Liefertermin:	

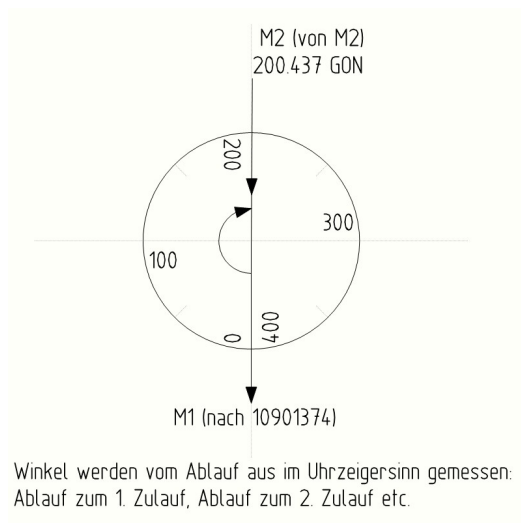

Anschluss	DN	Rohrart	Versatz [m]	Winkel [gon]	Gefälle [‰]
Ablauf (10901374)	1100	Stahlbeton	0,000		3,37
Zulauf (M2)	1100	Stahlbeton	0,000	200,437	3,330
Steighilfe	einläufig				
Gerinneart	Kreis bis Kämpfer				
Bemerkung					

Maß- und Bestellblatt für Fertigteilschächte DIN 4034



Baustelle		
Bezeichnung:	3. BA Vestische Straße	Nummer:
Schachtbezeichnung:	M2	OKante/Deckel: 47.860 mNN
Schacht-DN:	2000 mm	Schachtsohle: 41.250 mNN
Lieferfolge:		Schachthöhe: 6.610 m
		Liefertermin:

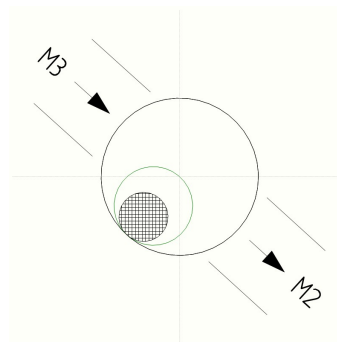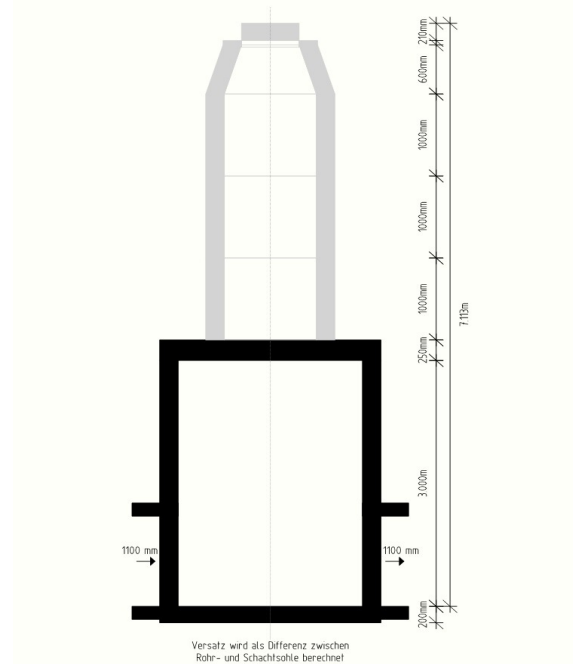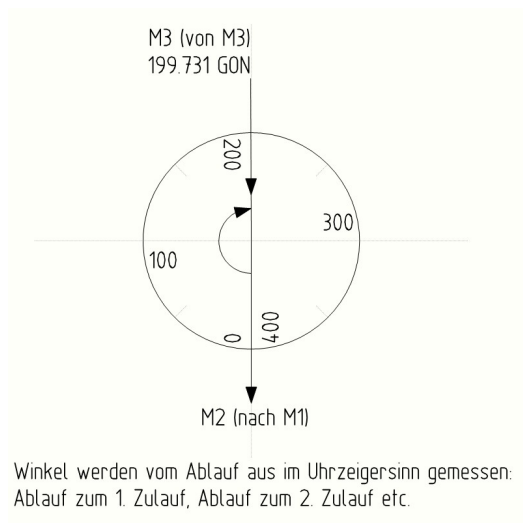

Anschluss	DN	Rohrart	Versatz [m]	Winkel [gon]	Gefälle [‰]
Ablauf (M1)	1100	Stahlbeton	0,000		3,330
Zulauf (M3)	1100	Stahlbeton	0,000	199,731	3,400
Steighilfe	einläufig				
Gerinneart	Kreis bis Kämpfer				
Bemerkung					

Maß- und Bestellblatt für Fertigteilschächte DIN 4034



Baustelle		
Bezeichnung:	3. BA Vestische Straße	Nummer:
Schachtbezeichnung:	M5	OKante/Deckel: 46.430 mNN
Schacht-DN:	2000 mm	Schachtsohle: 41.640 mNN
Lieferfolge:		Schachthöhe: 4.790 m
		Liefertermin:

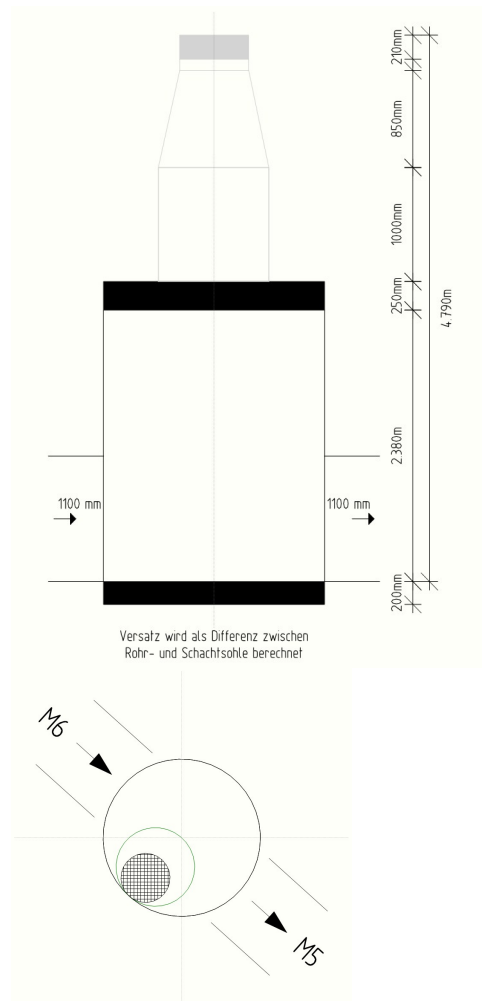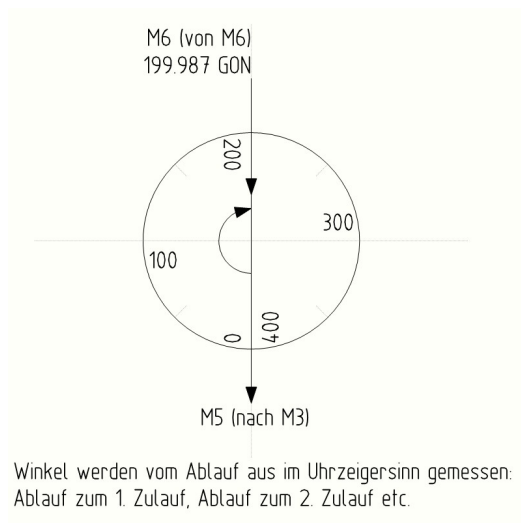

Anschluss	DN	Rohrart	Versatz [m]	Winkel [gon]	Gefälle [‰]
Ablauf (M3)	1100	Stahlbeton	0,000		3,430
Zulauf (M6)	1100	Stahlbeton	0,000	199,987	3,350
Steighilfe	einläufig				
Gerinneart	Kreis bis Kämpfer				
Bemerkung					

Maß- und Bestellblatt für Fertigteilschächte DIN 4034



Baustelle		
Bezeichnung:	3. BA Vestische Straße	Nummer:
Schachtbezeichnung:	M7	OKante/Deckel: 45.820 mNN
Schacht-DN:	1500 mm	Schachtsohle: 42.206 mNN
Lieferfolge:		Schachthöhe: 3.614 m
		Liefertermin:

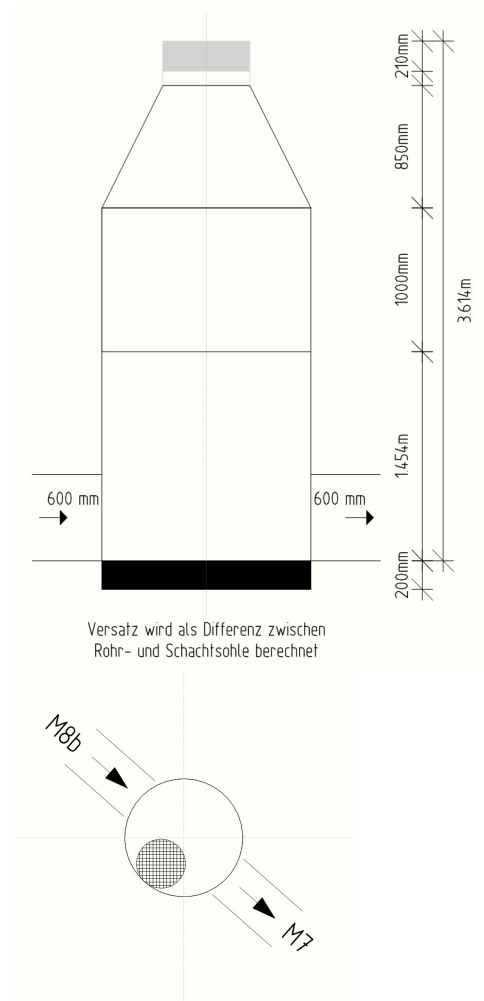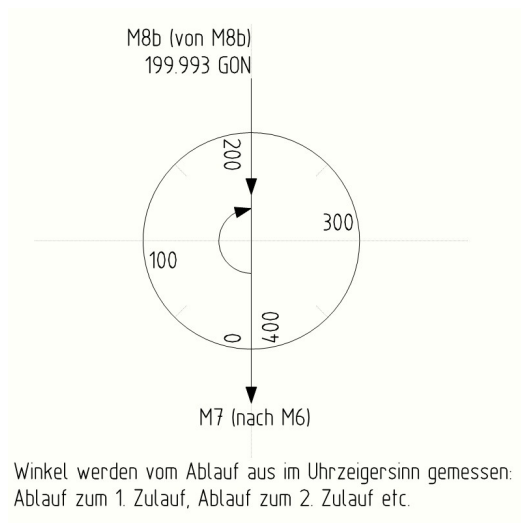

Anschluss	DN	Rohrart	Versatz [m]	Winkel [gon]	Gefälle [‰]
Ablauf (M6)	600	Stahlbeton	0,000		5,660
Zulauf (M8b)	600	Stahlbeton	0,000	199,993	5,600
Steighilfe	einläufig				
Gerinneart	Kreis bis Kämpfer				
Bemerkung					

Maß- und Bestellblatt für Fertigteilschächte DIN 4034



Baustelle		
Bezeichnung:	3. BA Vestische Straße	Nummer:
Schachtbezeichnung:	M9	OKante/Deckel: 48.370 mNN
Schacht-DN:	1200 mm	Schachtsohle: 43.241 mNN
Lieferfolge:		Schachthöhe: 5.129 m
		Liefertermin:

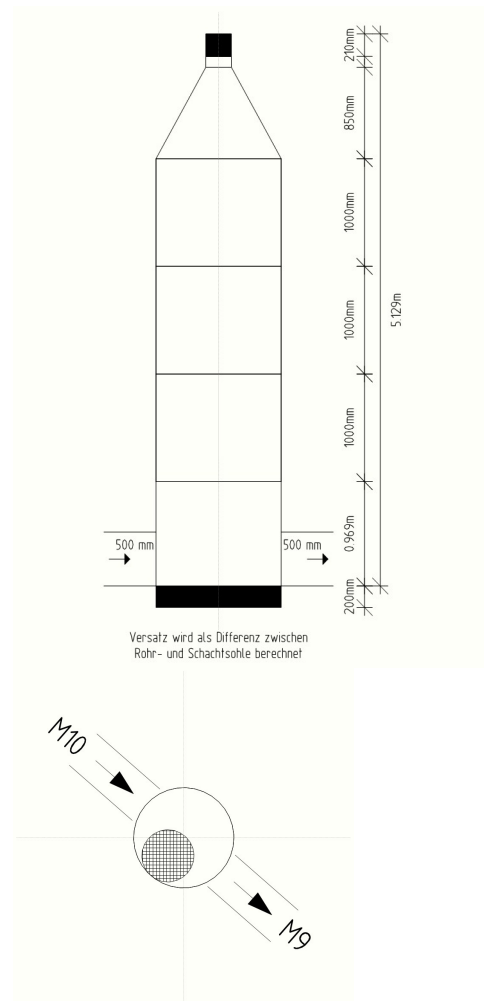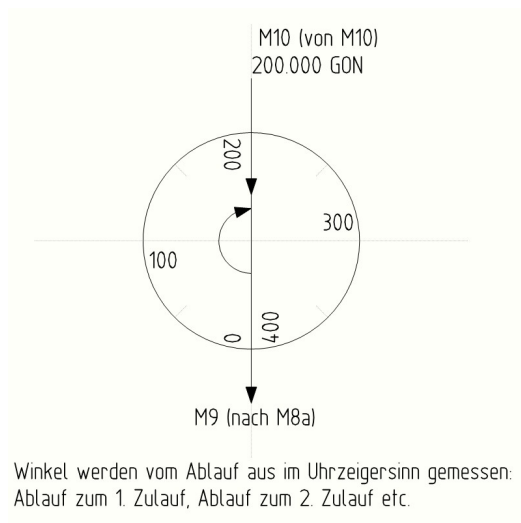

Anschluss	DN	Rohrart	Versatz [m]	Winkel [gon]	Gefälle [‰]
Ablauf (M8a)	500	Stahlbeton	0,000		5,660
Zulauf (M10)	500	Stahlbeton	0,000	200,000	5,660
Steighilfe	einläufig				
Gerinneart	Kreis bis Kämpfer				
Bemerkung					

Maß- und Bestellblatt für Fertigteilschächte DIN 4034



Baustelle		
Bezeichnung:	3. BA Vestische Straße	Nummer:
Schachtbezeichnung:	M10	OKante/Deckel: 48.870 mNN
Schacht-DN:	1200 mm	Schachtsohle: 43.660 mNN
Lieferfolge:		Schachthöhe: 5.210 m
		Liefertermin:

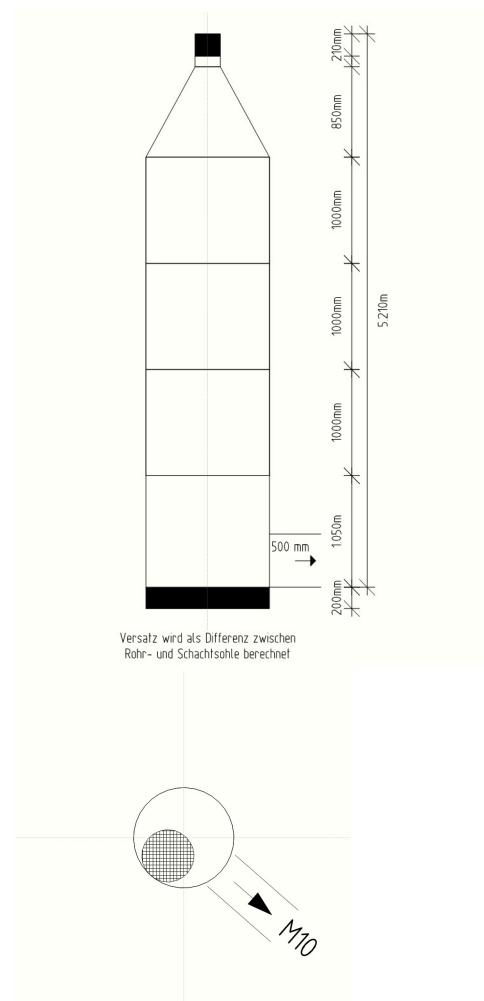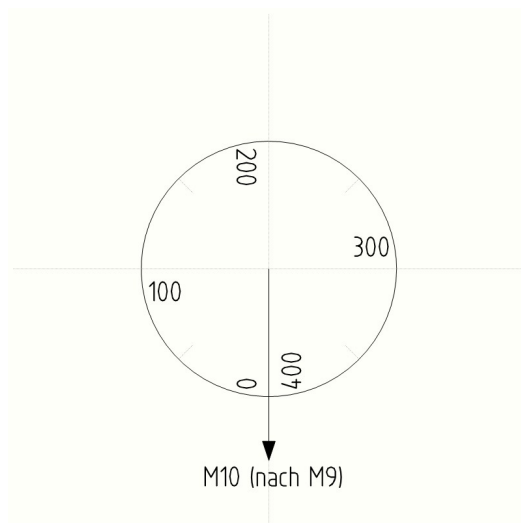

Anschluss	DN	Rohrart	Versatz [m]	Winkel [gon]	Gefälle [‰]
Ablauf (M9)	500	Stahlbeton	0,000		5,660
Steighilfe	einläufig				
Gerinneart	Kreis bis Kämpfer				
Bemerkung					

Maß- und Bestellblatt für Fertigteilschächte DIN 4034



Baustelle		
Bezeichnung:	3. BA Vestische Straße	Nummer:
Schachtbezeichnung:	M8b	OKante/Deckel: 46.260 mNN
Schacht-DN:	1500 mm	Schachtsohle: 42.490 mNN
Lieferfolge:		Schachthöhe: 3.770 m
		Liefertermin:

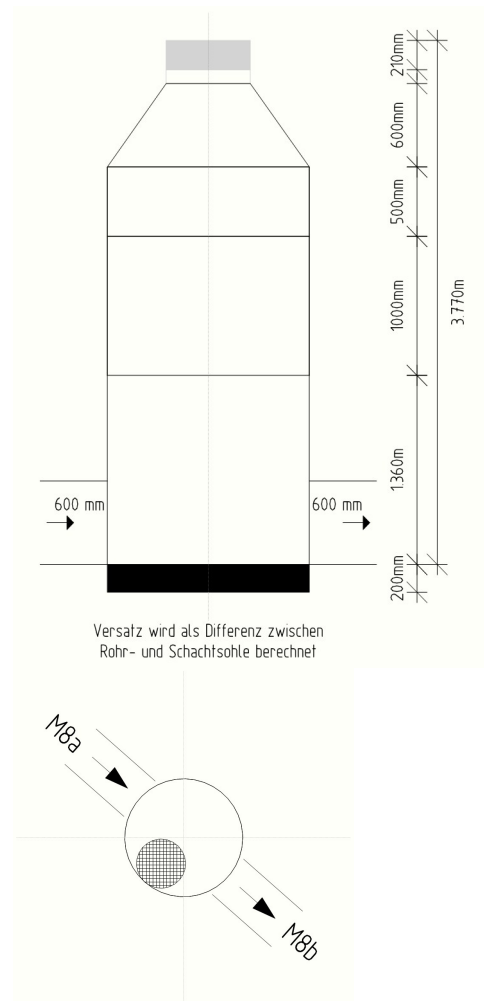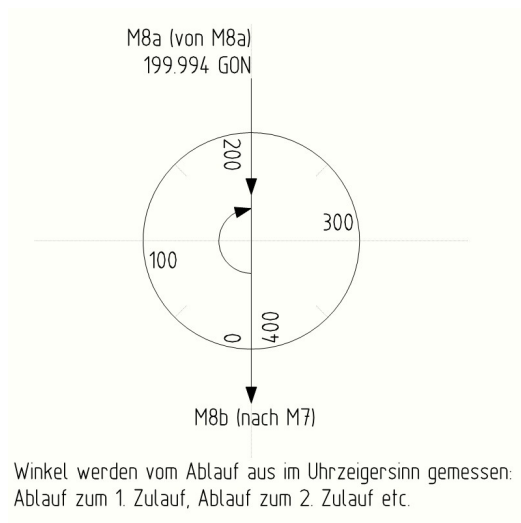

Anschluss	DN	Rohrart	Versatz [m]	Winkel [gon]	Gefälle [‰]
Ablauf (M7)	600	Stahlbeton	0,000		5,600
Zulauf (M8a)	600	Stahlbeton	0,000	199,994	5,720
Steighilfe	einläufig				
Gerinneart	Kreis bis Kämpfer				
Bemerkung					

Maß- und Bestellblatt für Fertigteilschächte DIN 4034



Baustelle		
Bezeichnung:	3. BA Vestische Straße	Nummer:
Schachtbezeichnung:	M8c	OKante/Deckel: 45.715 mNN
Schacht-DN:	1000 mm	Schachtsohle: 42.720 mNN
Lieferfolge:		Schachthöhe: 2.995 m
		Liefertermin:

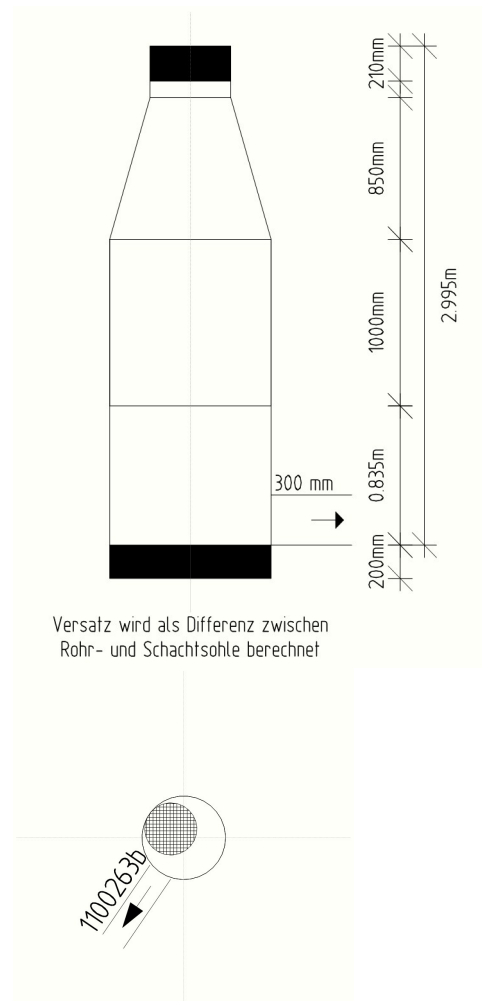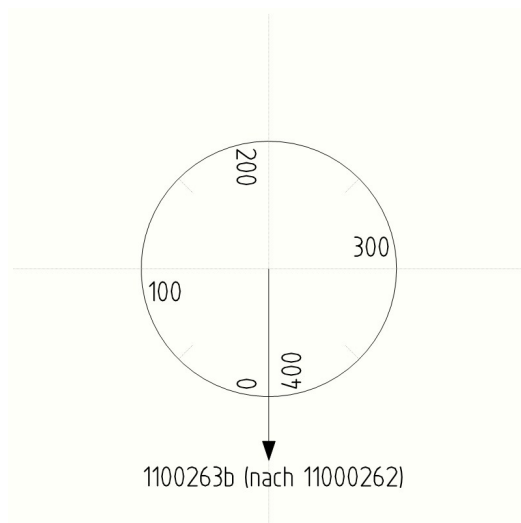

Anschluss	DN	Rohrart	Versatz [m]	Winkel [gon]	Gefälle [‰]
Ablauf (11000262)	300	Steinzeug	0,000		4,651
Steighilfe	einläufig				
Gerinneart	Kreis bis Kämpfer				
Bemerkung					

Maß- und Bestellblatt für Fertigteilschächte DIN 4034



Baustelle		
Bezeichnung:	3. BA Vestische Straße	Nummer:
Schachtbezeichnung:	M8d	OKante/Deckel: 47.557 mNN
Schacht-DN:	1200 mm	Schachtsohle: 43.360 mNN
Lieferfolge:		Schachthöhe: 4.197 m
		Liefertermin:

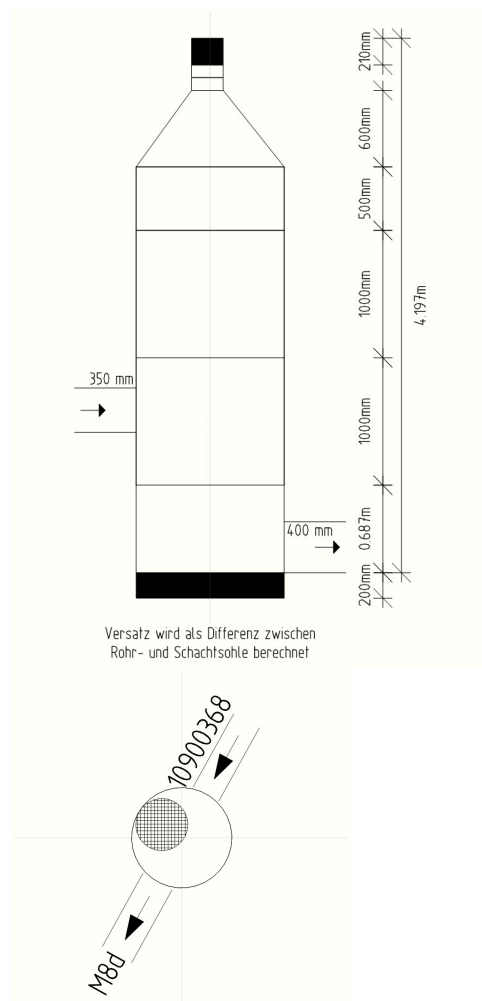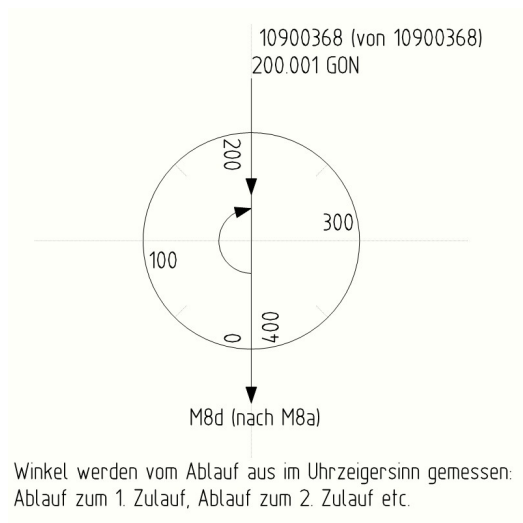

Anschluss	DN	Rohrart	Versatz [m]	Winkel [gon]	Gefälle [‰]
Ablauf (M8a)	400	Steinzeug	0,000		36,067
Zulauf (10900368)	350	Steinzeug	1,100	200,001	25,948
Steighilfe					
Gerinneart	einläufig				
Bemerkung	Kreis bis Kämpfer				

Maß- und Bestellblatt für Fertigteilschächte DIN 4034

Baustelle		
Bezeichnung:	3. BA Vestische Straße	Nummer:
Schachtbezeichnung:	M6.1	OKante/Deckel: 46.047 mNN
Schacht-DN:	1500 mm	Schachtsohle: 41.770 mNN
Lieferfolge:		Schachthöhe: 4.277 m
		Liefertermin:

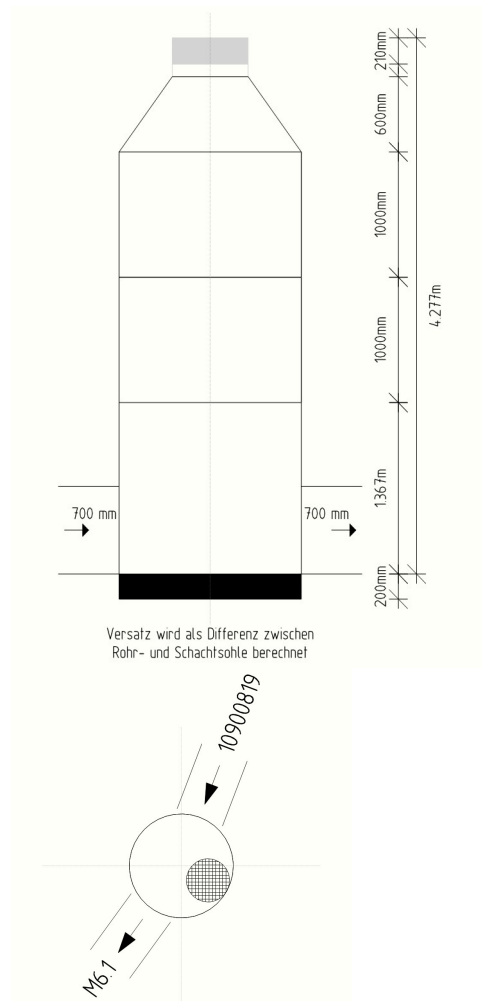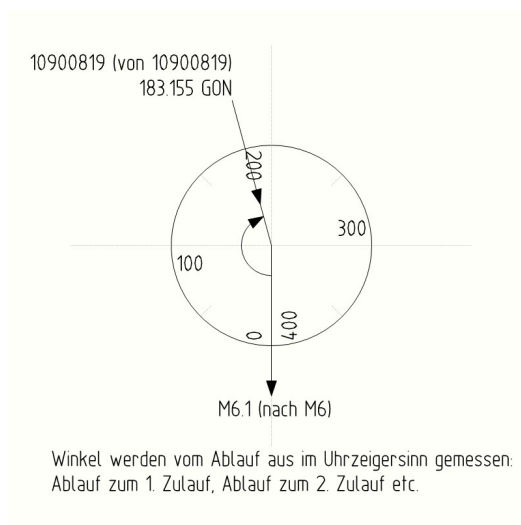

Anschluss	DN	Rohrart	Versatz [m]	Winkel [gon]	Gefälle [‰]
Ablauf (M6)	700	Stahlbeton	0,000		3,449
Zulauf (10900819)	700	Beton	0,000	183,155	7,847
Steighilfe					
Gerinneart	einläufig				
Bemerkung	Kreis bis Kämpfer				
