
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger	Ressourcennamen
1						
2						
3	Genehmigung EWS / SWN / LWWÜ	60 Tage	Do 01.09.22	Mi 23.11.22		Untere Wasserbehörde
4	Genehmigungsbescheid liegt vor	0 Tage	Mi 23.11.22	Mi 23.11.22	3	SER
5	Auswertung Genehmigungsbescheid	5 Tage	Do 24.11.22	Mi 30.11.22	4	Planung EVK;SER
6	Baugenehmigung EZ	60 Tage	Do 01.09.22	Mi 23.11.22		Bauamt
7	Baugenehmigung liegt vor	0 Tage	Mi 23.11.22	Mi 23.11.22	6	SER
8	Auswertung Baugenehmigung	5 Tage	Do 24.11.22	Mi 30.11.22	7	Planung EVK;SER
9						
10						
11						
12	Beauftragung LPH 5-8 - Start Modul II Wärmenetze 4.0	0 Tage	Do 01.12.22	Do 01.12.22		SER
13	**Planung, Errichichtung und Inbetriebnahme Nahwärmenetz**	**962 Tage**	**Do 01.12.22**	**Fr 07.08.26**		
14	**Erdwärmesonden (EWS)**	**635 Tage**	**Do 01.12.22**	**Mi 07.05.25**		
15	Ausführungsplanung EWS	90 Tage	Do 01.12.22	Mi 05.04.23	12	Planung EVK
16	Erstellung Ausschreibungs-unterlagen EWS	20 Tage	Do 06.04.23	Mi 03.05.23	15	Planung EVK
17	Ausschreibung EWS	40 Tage	Do 04.05.23	Mi 28.06.23	16	SER
18	Auswertung und Vergabe EWS	10 Tage	Do 29.06.23	Mi 12.07.23	17	Planung EVK;SER
19	Vorlauf Bohrunternehmen	180 Tage	Do 13.07.23	Mi 20.03.24	18	AN EWS
20	**Erstellung Sondenfeld See**	**125 Tage**	**Do 25.07.24**	**Mi 15.01.25**		
21	Baustelleneinrichtung	5 Tage	Do 25.07.24	Mi 31.07.24	19;32;49	AN EWS
22	Bohrarbeiten	100 Tage	Do 01.08.24	Mi 18.12.24	21	AN EWS
23	Anbindung	40 Tage	Do 21.11.24	Mi 15.01.25	22EE+20 Ta	AN EWS
24	**Erstellung Sondenfeld südl. Landschaft**	**100 Tage**	**Do 19.12.24**	**Mi 07.05.25**		
25	Bohrarbeiten	80 Tage	Do 19.12.24	Mi 09.04.25	22	AN EWS
26	Anbindung	40 Tage	Do 13.03.25	Mi 07.05.25	25EE+20 Ta	AN EWS
27	**Wärmeversorgungsnetz (WVN)**	**962 Tage**	**Do 01.12.22**	**Fr 07.08.26**		
28	Ausführungsplanung WVN	90 Tage	Do 01.12.22	Mi 05.04.23	12	Planung EVK
29	Erstellung Ausschreibungs-unterlagen WVN	20 Tage	Do 06.04.23	Mi 03.05.23	28	Planung EVK
30	Ausschreibung WVN	40 Tage	Do 04.05.23	Mi 28.06.23	29	SER
31	Auswertung und Vergabe WVN	10 Tage	Do 29.06.23	Mi 12.07.23	30	Planung EVK;SER
32	Vorlauf Netzbau	60 Tage	Do 13.07.23	Mi 04.10.23	31	AN WVN
33	Verlegung WVN (Haupttrassen + Versorgungsleitungen)	120 Tage	Do 05.10.23	Mi 20.03.24	32	AN WVN
34	Hochbau 1. Bauabschnitt bereit zur Erstellung Hausanschluss	0 Tage	Mi 02.10.24	Mi 02.10.24		AN Hochbau
35	Erstellung Hausanschlüsse inkl. Hausübergabestation 1. Bauabschnitt	50 Tage	Mi 02.10.24	Di 10.12.24	34	AN WVN
36	Hochbau 2. Bauabschnitt bereit zur Erstellung Hausanschluss	0 Tage	Di 01.04.25	Di 01.04.25		AN Hochbau
37	Erstellung Hausanschlüsse inkl. Hausübergabestation 2. Bauabschnitt	50 Tage	Di 01.04.25	Mo 09.06.25	36	AN WVN
38	Hochbau 3. Bauabschnitt bereit zur Erstellung Hausanschluss	0 Tage	Di 01.04.25	Di 01.04.25		AN Hochbau
39	Erstellung Hausanschlüsse inkl. Hausübergabestation 3. Bauabschnitt	50 Tage	Di 01.04.25	Mo 09.06.25	38	AN WVN
40	Hochbau 4. Bauabschnitt bereit zur Erstellung Hausanschluss	0 Tage	Mi 01.10.25	Mi 01.10.25		AN Hochbau
41	Erstellung Hausanschlüsse inkl. Hausübergabestation 4. Bauabschnitt	50 Tage	Mi 01.10.25	Di 09.12.25	40	AN WVN
42	Hochbau 5. Bauabschnitt bereit zur Erstellung Hausanschluss	0 Tage	Mo 01.06.26	Mo 01.06.26		AN Hochbau
43	Erstellung Hausanschlüsse inkl. Hausübergabestation 5. Bauabschnitt	50 Tage	Mo 01.06.26	Fr 07.08.26	42	AN WVN
44	**Seewassernutzung (SWN)**	**337 Tage**	**Do 10.08.23**	**Fr 22.11.24**		
45	Ausführungsplanung SWN	90 Tage	Do 10.08.23	Mi 13.12.23	15EA+90 Tage	Planung EVK
46	Erstellung Ausschreibungs-unterlagen SWN	20 Tage	Do 14.12.23	Mi 10.01.24	45	Planung EVK
47	Ausschreibung SWN	40 Tage	Do 11.01.24	Mi 06.03.24	46	SER
48	Auswertung und Vergabe SWN	10 Tage	Do 07.03.24	Mi 20.03.24	47	Planung EVK;SER
49	Vorlauf SWN	90 Tage	Do 21.03.24	Mi 24.07.24	48	AN SWN
50	Fertigstellung Seeabdichtung	0 Tage	Mo 02.09.24	Mo 02.09.24		Seeplanung/ Ausführung
51	Installation Wärmeübertrager SWN inkl. Anbindung	60 Tage	Mo 02.09.24	Fr 22.11.24	49;50	AN SWN
52	**Luft-Wasser-Wärmeübertrager (LWWÜ)**	**290 Tage**	**Do 14.12.23**	**Mi 22.01.25**		
53	Ausführungsplanung LWWÜ	90 Tage	Do 14.12.23	Mi 17.04.24	45	Planung EVK
54	Erstellung Ausschreibungsunterlagen LWWÜ	20 Tage	Do 18.04.24	Mi 15.05.24	53	Planung EVK
55	Ausschreibung LWWÜ	40 Tage	Do 16.05.24	Mi 10.07.24	54	SER
56	Auswertung und Vergabe LWWÜ	10 Tage	Do 11.07.24	Mi 24.07.24	55	Planung EVK;SER
57	Vorlauf LWWÜ	90 Tage	Do 25.07.24	Mi 27.11.24	56	AN LWWÜ
58	Installation LWWÜ inkl. Anbindung	40 Tage	Do 28.11.24	Mi 22.01.25	57	AN LWWÜ
59	**Energiezentrale (EZ**	**529 Tage**	**Do 01.12.22**	**Di 10.12.24**		
60	Ausführungsplanung EZ	90 Tage	Do 01.12.22	Mi 05.04.23	12	Planung EVK
61	Erstellung Ausschreibungsunterlagen EZ	20 Tage	Do 06.04.23	Mi 03.05.23	60	Planung EVK
62	Ausschreibung EZ	40 Tage	Do 04.05.23	Mi 28.06.23	61	SER
63	Auswertung und Vergabe EZ	10 Tage	Do 29.06.23	Mi 12.07.23	62	Planung EVK;SER
64	Vorlauf EZ	60 Tage	Do 13.07.23	Mi 04.10.23	63	AN EZ;AN Hochbau EZ
65	Hochbau EZ	120 Tage	Do 05.10.23	Mi 20.03.24	64	AN Hochbau EZ
66	Anlagenbau EZ	120 Tage	Do 21.03.24	Mi 04.09.24	65	AN EZ
67	Inbetriebnahme EZ + EWS (See)	0 Tage	Di 10.12.24	Di 10.12.24	66;35	AN EZ
68	Abschluss Gesamtinbetriebnahme	0 Tage	Fr 07.08.26	Fr 07.08.26	14;27;44;52	Alle

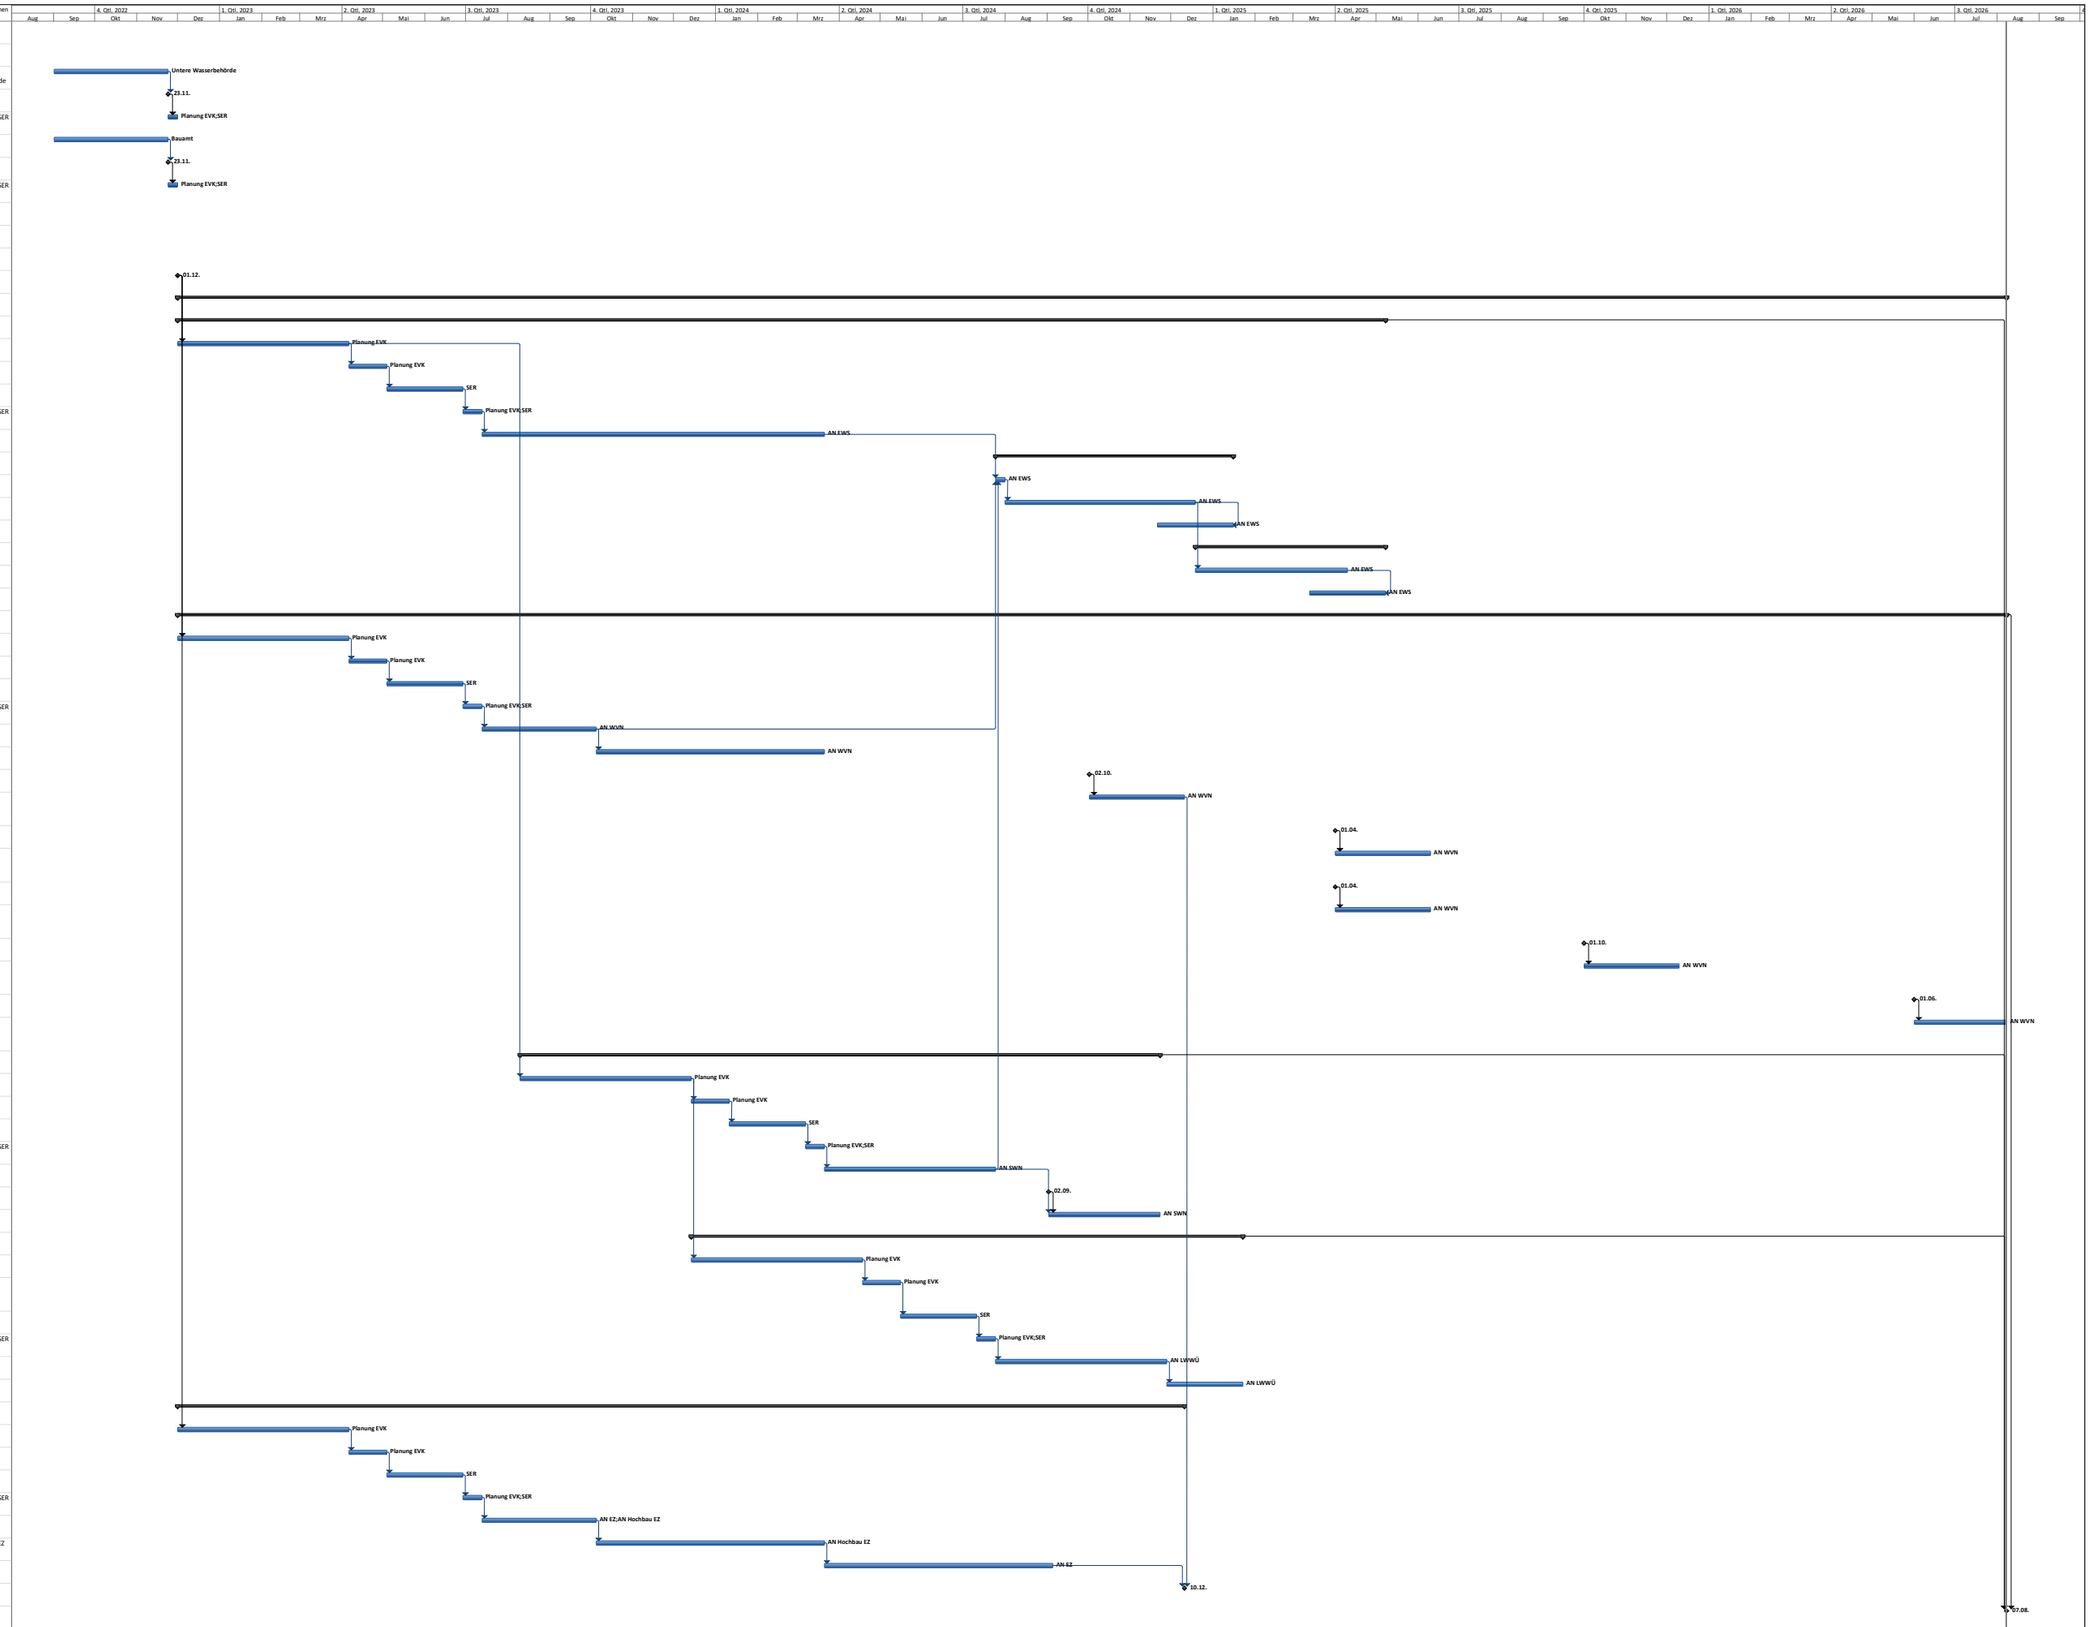

Projekt: 220715_Terminplan_WN
Datum: Fr 15.07.22

Vorgang · Unterbrechung · Meilenstein · Sammelvorgang · Projektsammelvorgang · Externe Vorgänge · Externer Meilenstein · Inaktiver Vorgang · Inaktiver Meilenstein · Inaktiver Sammelvorgang · Manueller Vorgang · Nur Dauer · Manueller Sammelvorgang · Manueller Sammelvorlup · Nur Anfang · Nur Ende · Stichtag · In Arbeit
