
Projektterminplan - 08

- Entwurf -

25-184 KHR: Neubau Kita Hibernia
Stand: Mit 23.09.26

Nr.		PSP-C	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1		1	vorraussichtliche Beauftragung	0 Tage	Fre 26.02.27	Fre 26.02.27
2		2	Ausführungsplanung GU	80 Tage	Fre 12.03.27	Don 01.07.27
3		2.1	Objektplanung	60 Tage	Fre 12.03.27	Don 03.06.27
4		2.2	Prüfung OP	10 Tage	Fre 04.06.27	Don 17.06.27
5		2.3	Freigabe OP	0 Tage	Don 17.06.27	Don 17.06.27
6		2.4	HLS	50 Tage	Fre 26.03.27	Don 03.06.27
7		2.5	ELT	50 Tage	Fre 26.03.27	Don 03.06.27
8		2.6	TWP - Detailstatik	40 Tage	Fre 26.03.27	Don 20.05.27
9		2.7	TWP - Prüfstatik	30 Tage	Fre 21.05.27	Don 01.07.27
10		3	Werkstattplanung	110 Tage	Fre 07.05.27	Don 07.10.27
11		3.1	Werkstattplanung	110 Tage	Fre 07.05.27	Don 07.10.27
12		4	Lieferzeiten	50 Tage	Fre 16.07.27	Don 23.09.27
13		4.1	Lieferzeiten Fenster und Türen	50 Tage	Fre 16.07.27	Don 23.09.27
14		5	Fertigung	40 Tage	Fre 27.08.27	Don 21.10.27
15		5.1	Fertigung Holzbauelemente	40 Tage	Fre 27.08.27	Don 21.10.27
16		6	5 - Ausführung	275 Tage	Fre 07.05.27	Don 08.06.28
17		6.1	Arbeitsvorbereitung	40 Tage	Fre 07.05.27	Don 01.07.27
18		6.1.1	Gewerk Hochbau- Dispositionszeit	40 Tage	Fre 07.05.27	Don 01.07.27
19		6.1.2	Baubeginn	0 Tage	Don 01.07.27	Don 01.07.27
20		6.2	Erd- und Rohbau	70 Tage	Fre 02.07.27	Don 07.10.27
21		6.2.1	Erdarbeiten inkl. Grundleitungen	20 Tage	Fre 02.07.27	Don 29.07.27
22		6.2.2	Bodenplatte	20 Tage	Fre 30.07.27	Don 26.08.27
23		6.2.3	Treppenhaus und Aufzug	30 Tage	Fre 27.08.27	Don 07.10.27
24		6.2.4	EG/Decke 1. OG	30 Tage	Fre 27.08.27	Don 07.10.27
25		6.3	Holzbau	80 Tage	Fre 08.10.27	Don 10.02.28
26		6.3.1	Montage Wände und Decken	40 Tage	Fre 08.10.27	Don 02.12.27
27		6.3.2	Dacharbeiten	50 Tage	Fre 19.11.27	Don 10.02.28
28		6.4	Ausbau	120 Tage	Fre 10.12.27	Don 08.06.28
29		6.4.1	Innenausbau	120 Tage	Fre 10.12.27	Don 08.06.28
30		6.5	Außenanlagen	70 Tage	Fre 03.03.28	Don 08.06.28
31		6.5.1	Außenanlagen	70 Tage	Fre 03.03.28	Don 08.06.28
32		7	Phase 5: Tech. Und recht. Abnahmen	40 Tage	Fre 09.06.28	Don 03.08.28
33		7.1	technische Abnahmen	10 Tage	Fre 09.06.28	Don 22.06.28
34		7.2	SV- Abnahmen	10 Tage	Fre 23.06.28	Don 06.07.28
35		7.3	baurechtl. Abnahmen	10 Tage	Fre 07.07.28	Don 20.07.28
36		7.4	rechtgesch. Abnahmen	10 Tage	Fre 21.07.28	Don 03.08.28
37		7.5	Übergabe an Bauherr	0 Tage	Don 03.08.28	Don 03.08.28
38		8	Projektabschluss	10 Tage	Fre 04.08.28	Don 17.08.28
39		8.1	Zusammenstellen der Dokumentationunterlagen	10 Tage	Fre 04.08.28	Don 17.08.28
40		8.2	Abschluss Projekt	0 Tage	Don 17.08.28	Don 17.08.28

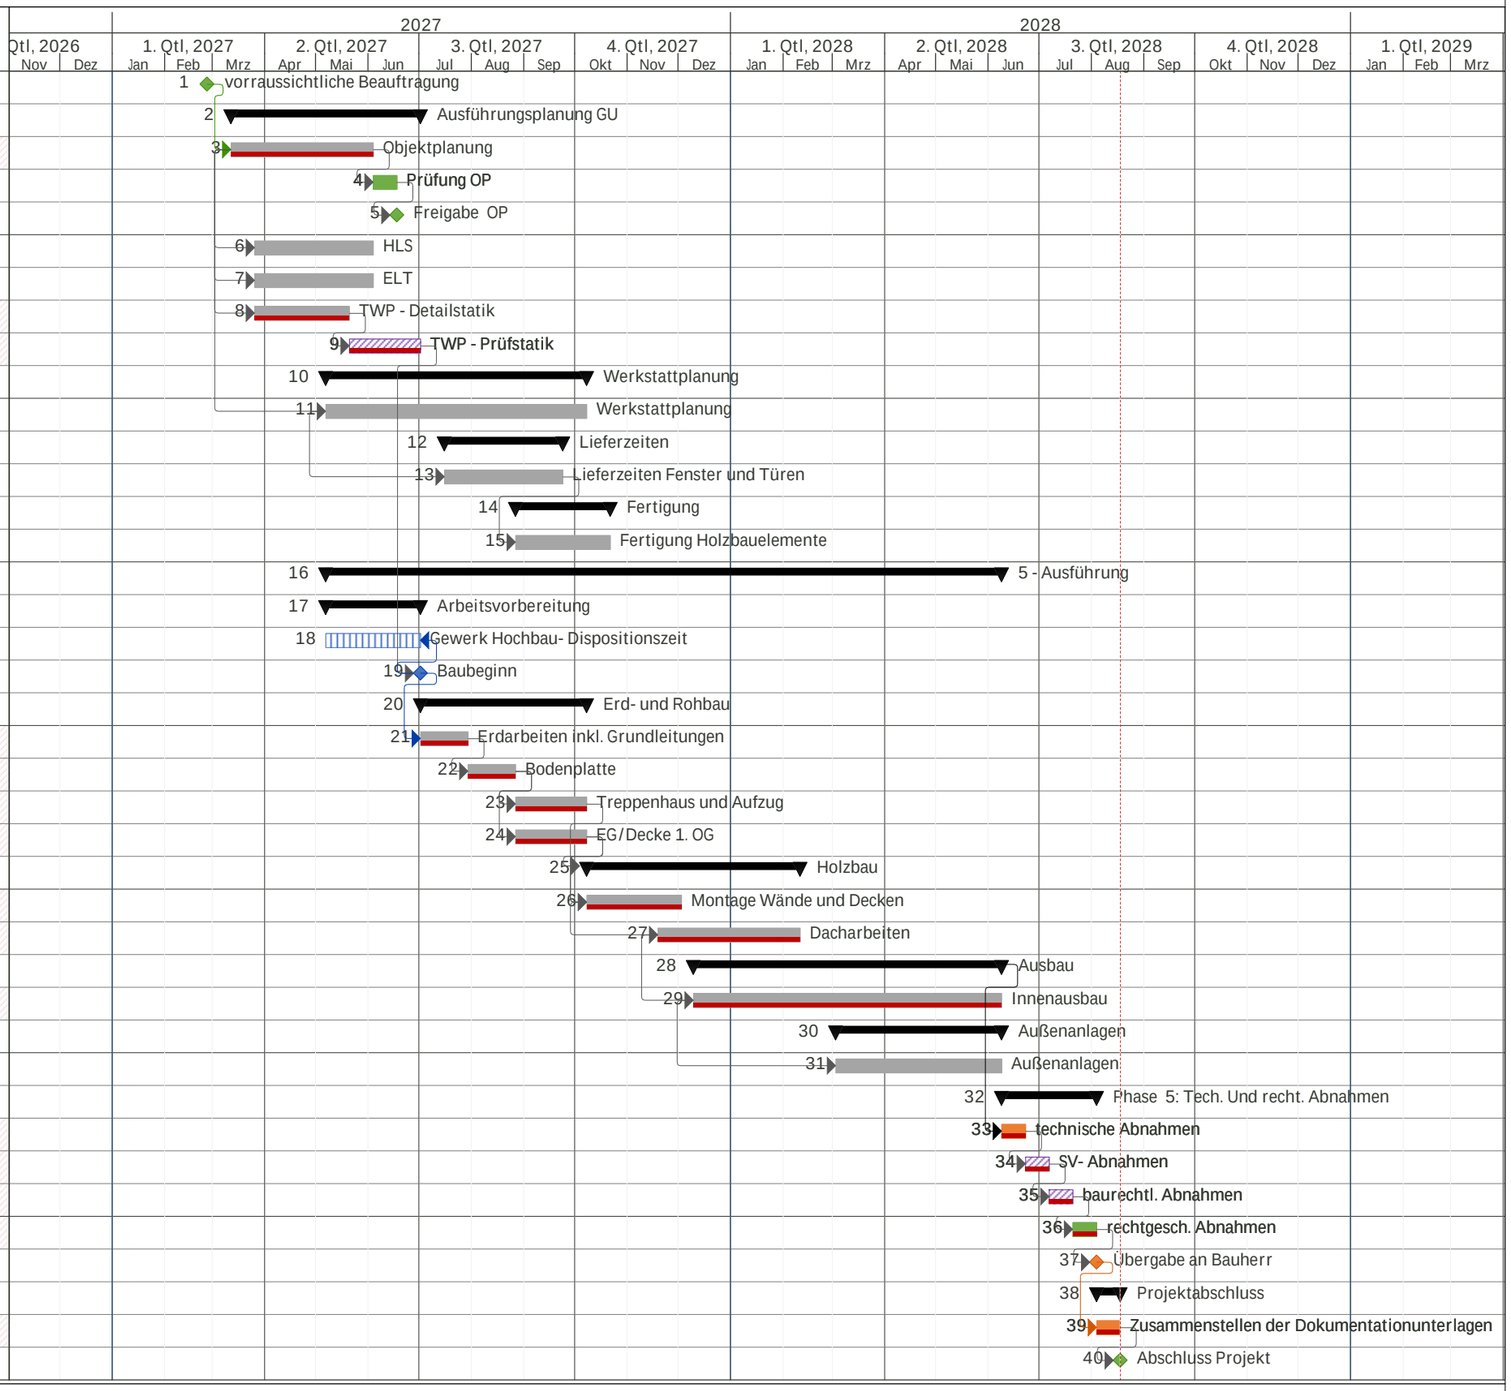

Sammelvorgang: Allgemein
Sammelvorgang: Extern
Vorgang: Standard
Vorgang: Planung
Vorgang: Bauherr
Vorgang: Extern
Vorgang: Dispositionszeit
Vorgang: Ausführende Firma
Manueller Vorgang
Kritischer Vorgang
Inaktiver Vorgang
Meilenstein: Planung
Meilenstein: Bauherr
Meilenstein: Extern
Meilenstein: Firma
Unterbrechung
