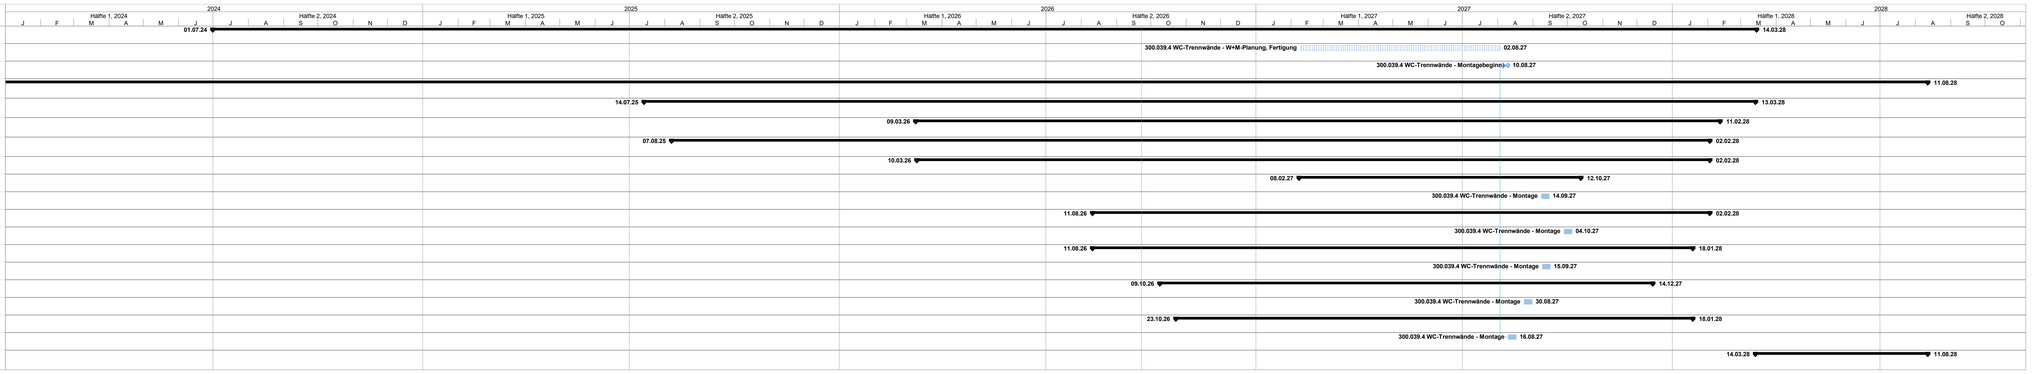Nr.	Vorgangsname	Wer	%	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
138	**LPH 6+7 Ausschreibung + Vergabe**		**57%**	**912 Tage**	**Mon 01.07.24**	**Die 14.03.28**	
560	300.039.4 WC-Trennwände - W+M-Planung, Fertigung	AN 300.039.4	0%	120 Tage	Die 09.02.27	Mon 02.08.27	557
561	300.039.4 WC-Trennwände - Montagebeginn	AN 300.039.4	0%	1 Tag	Die 10.08.27	Die 10.08.27	1512AA
933	**LPH 8 Bauausführung**		**17%**	**1142 Tage**	**Mon 18.12.23**	**Fre 11.08.28**	
976	**Neubau**		**13%**	**657 Tage**	**Mon 14.07.25**	**Mon 13.03.28**	
992	**Bauteil 1 (Achse 1-9/A-H) EG-2.OG**		**7%**	**475 Tage**	**Mon 09.03.26**	**Fre 11.02.28**	
1219	**Bauteil 2 (Achse 2-11/H-Q) UG-4.OG**		**10%**	**611 Tage**	**Don 07.08.25**	**Mit 02.02.28**	
1277	**Ausbau + TGA**		**2%**	**467 Tage**	**Die 10.03.26**	**Mit 02.02.28**	
1304	**UG WC-Anlagen**		**0%**	**172 Tage**	**Mon 08.02.27**	**Die 12.10.27**	
1321	300.039.4 WC-Trennwände - Montage	AN 300.039.4	0%	5 Tage	Mit 08.09.27	Die 14.09.27	1319
1371	**1.OG Cluster Mitte B**		**0%**	**362 Tage**	**Die 11.08.26**	**Mit 02.02.28**	
1395	300.039.4 WC-Trennwände - Montage	AN 300.039.4	0%	5 Tage	Die 28.09.27	Mon 04.10.27	1390
1410	**2.OG Cluster Mitte D**		**0%**	**351 Tage**	**Die 11.08.26**	**Die 18.01.28**	
1434	300.039.4 WC-Trennwände - Montage	AN 300.039.4	0%	5 Tage	Don 09.09.27	Mit 15.09.27	1429
1449	**3.OG Cluster Mitte E**		**0%**	**295 Tage**	**Fre 09.10.26**	**Die 14.12.27**	
1473	300.039.4 WC-Trennwände - Montage	AN 300.039.4	0%	5 Tage	Die 24.08.27	Mon 30.08.27	1468
1488	**4.OG Cluster Biologie/Physik, Hauswirtschaft**		**0%**	**298 Tage**	**Fre 23.10.26**	**Die 18.01.28**	
1512	300.039.4 WC-Trennwände - Montage	AN 300.039.4	0%	5 Tage	Die 10.08.27	Mon 16.08.27	1508
1660	**Forum - Rückbau Küche Bestand**		**0%**	**103 Tage**	**Die 14.03.28**	**Fre 11.08.28**
