**25154 Neubau Anne-Frank-Gesamtschule Dortmund**

# ATP Ausführungsterminplan LPH 8

(Stand 11.02.2026)
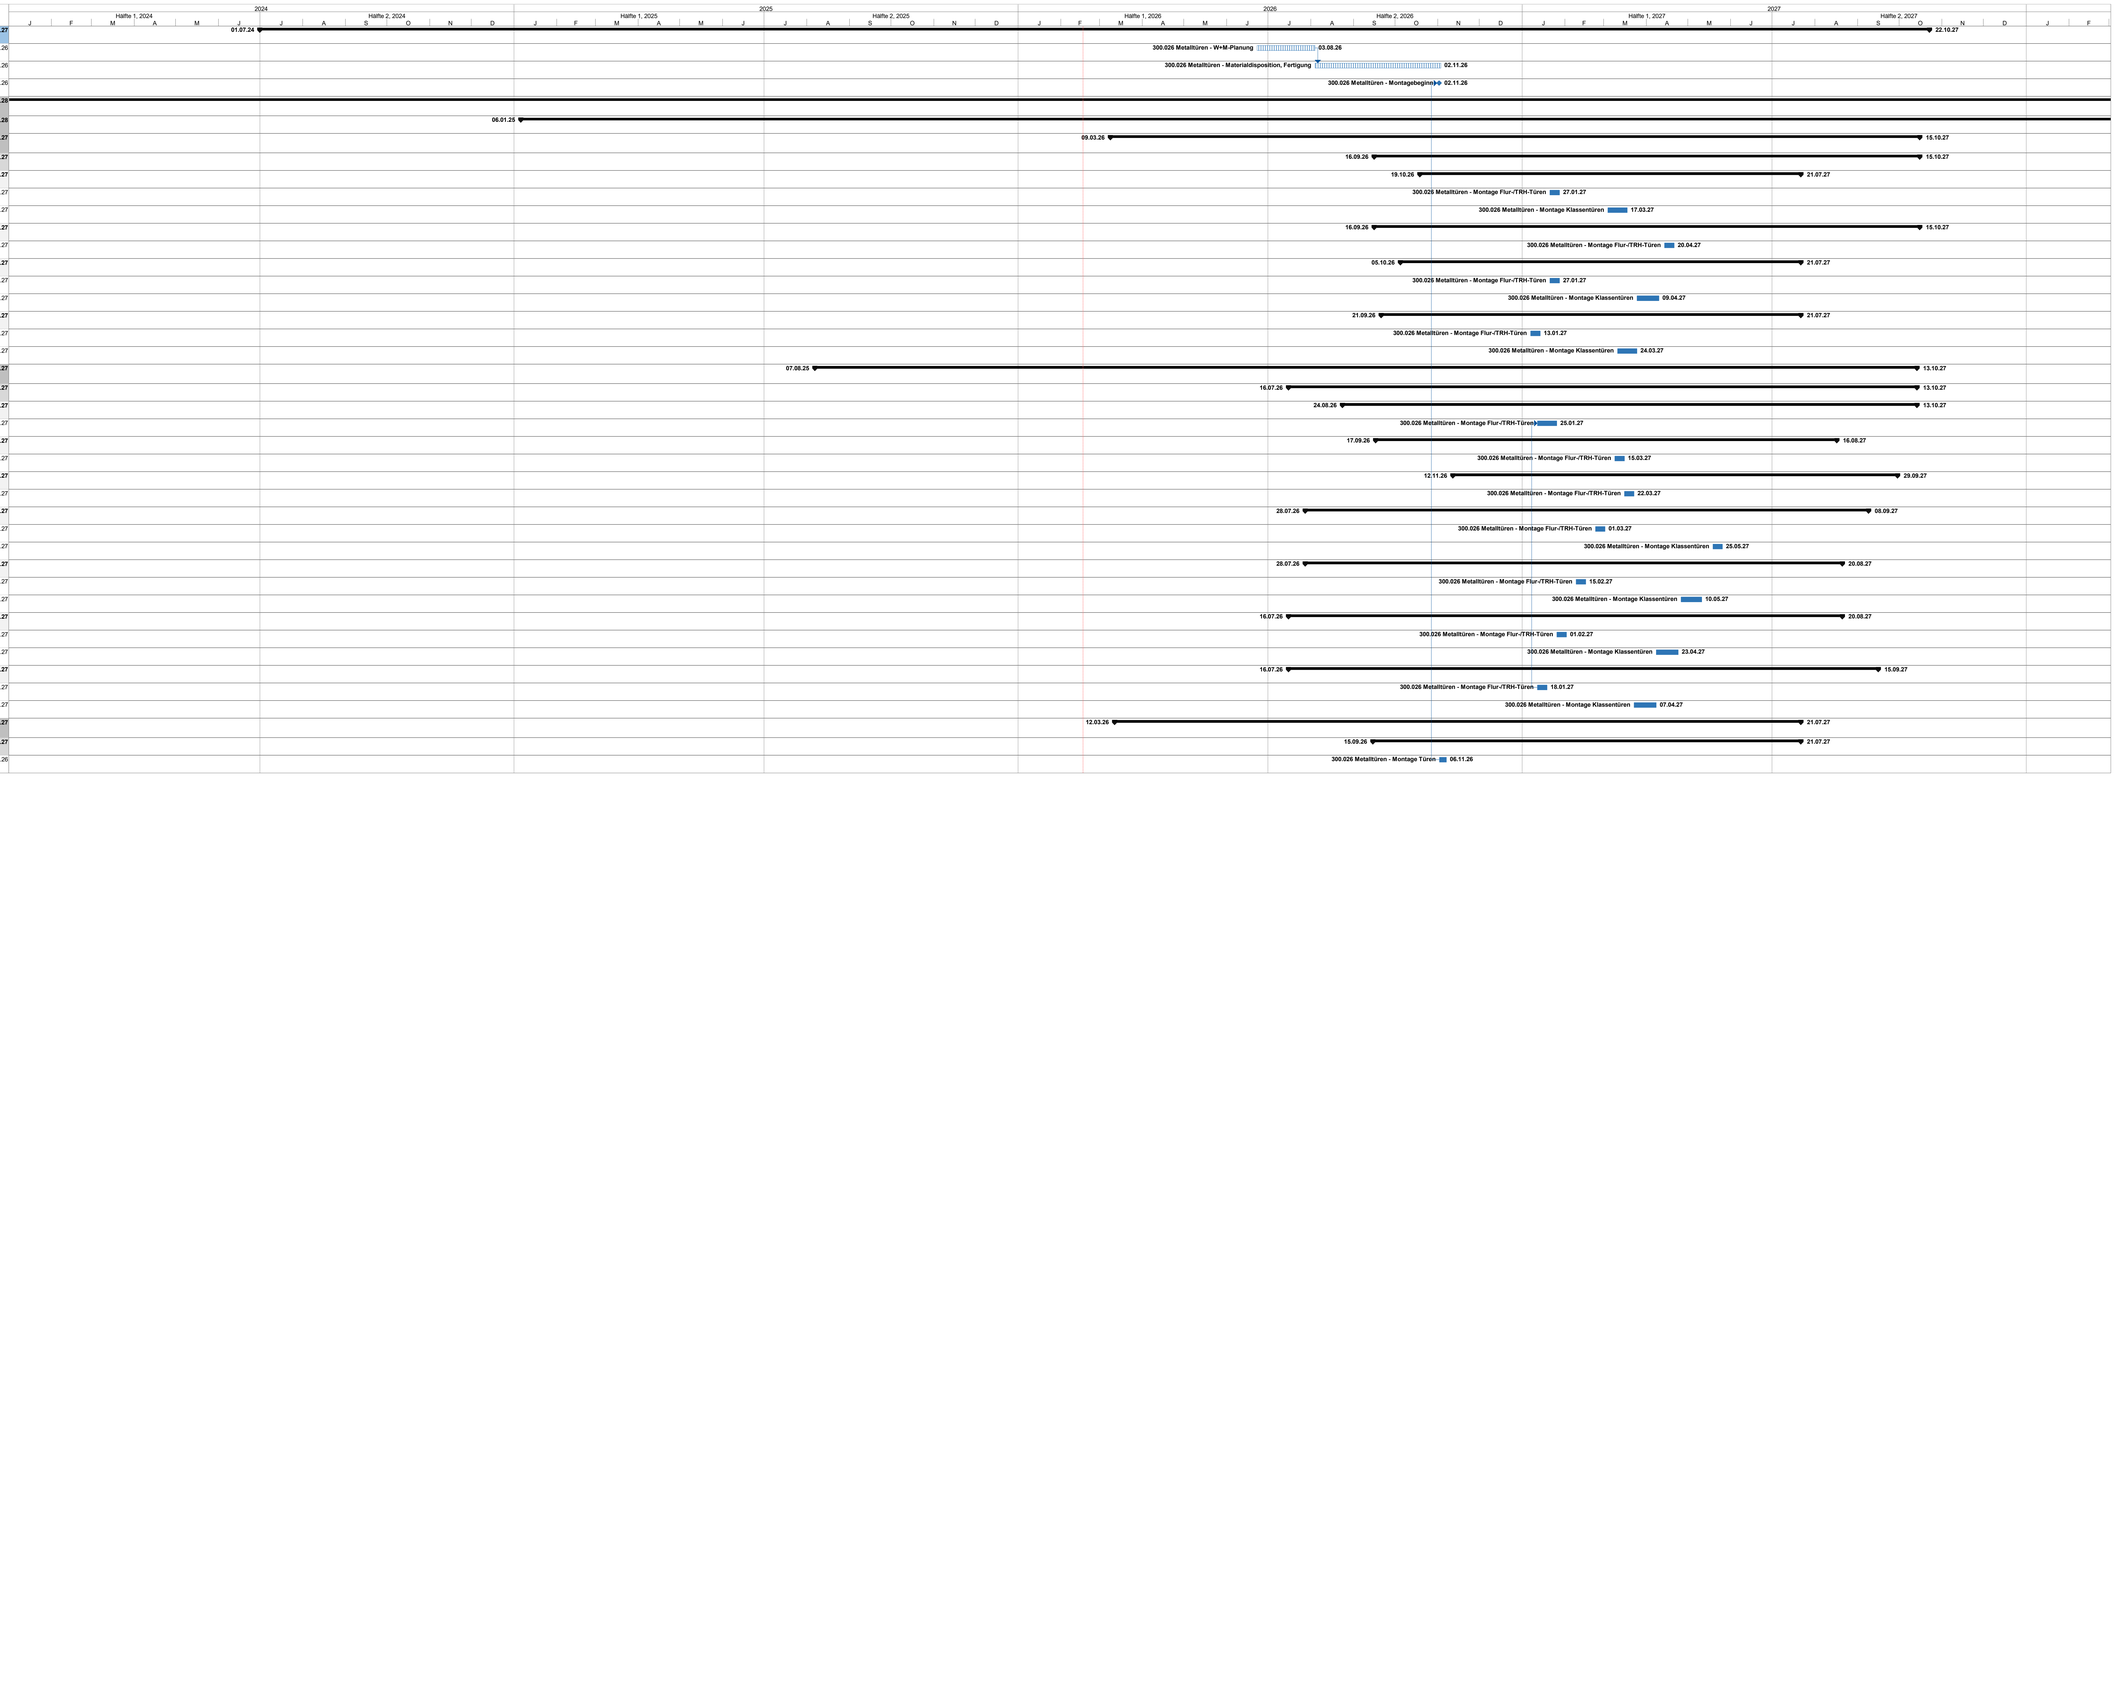
| Nr. | Vorgangsname | Wer | % | Dauer | Anfang | Ende |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | **LPH 6+7 Ausschreibung + Vergabe** | | **32%** | **822 Tage** | **Mon 01.07.24** | **Fre 22.10.27** |
| 354 | 300.026 Metalltüren - W+M-Planung | AN 300.026 | 0% | 30 Tage | Die 23.06.26 | Mon 03.08.26 |
| 355 | 300.026 Metalltüren - Materialdisposition, Fertigung | AN 300.026 | 0% | 65 Tage | Die 04.08.26 | Mon 02.11.26 |
| 356 | 300.026 Metalltüren - Montagebeginn | AN 300.026 | 0% | 1 Tag | Mon 02.11.26 | Mon 02.11.26 |
| 964 | **LPH 8 Bauausführung** | | **9%** | **1052 Tage** | **Mon 18.12.23** | **Don 23.03.28** |
| 1007 | **Neubau** | | **4%** | **799 Tage** | **Mon 06.01.25** | **Don 23.03.28** |
| 1022 | **Bauteil 1 (Achse 1-9/A-H) EG-2.OG** | | **0%** | **402 Tage** | **Mon 09.03.26** | **Fre 15.10.27** |
| 1060 | **Ausbau + TGA** | | **0%** | **270 Tage** | **Mit 16.09.26** | **Fre 15.10.27** |
| 1061 | **EG Willkommensklassen, Beratung** | | **0%** | **185 Tage** | **Mon 19.10.26** | **Mit 21.07.27** |
| 1072 | 300.026 Metalltüren - Montage Flur-/TRH-Türen | AN 300.026 | 0% | 5 Tage | Don 21.01.27 | Mit 27.01.27 |
| 1076 | 300.026 Metalltüren - Montage Klassentüren | AN 300.026 | 0% | 10 Tage | Don 04.03.27 | Mit 17.03.27 |
| 1091 | **EG Küchenbereich** | | **0%** | **270 Tage** | **Mit 16.09.26** | **Fre 15.10.27** |
| 1108 | 300.026 Metalltüren - Montage Flur-/TRH-Türen | AN 300.026 | 0% | 5 Tage | Mit 14.04.27 | Die 20.04.27 |
| 1134 | **1.OG Cluster Mitte A** | | **0%** | **195 Tage** | **Mon 05.10.26** | **Mit 21.07.27** |
| 1149 | 300.026 Metalltüren - Montage Flur-/TRH-Türen | AN 300.026 | 0% | 5 Tage | Don 21.01.27 | Mit 27.01.27 |
| 1153 | 300.026 Metalltüren - Montage Klassentüren | AN 300.026 | 0% | 10 Tage | Don 25.03.27 | Fre 09.04.27 |
| 1173 | **2.OG Cluster Mitte C** | | **0%** | **205 Tage** | **Mon 21.09.26** | **Mit 21.07.27** |
| 1188 | 300.026 Metalltüren - Montage Flur-/TRH-Türen | AN 300.026 | 0% | 5 Tage | Don 07.01.27 | Mit 13.01.27 |
| 1192 | 300.026 Metalltüren - Montage Klassentüren | AN 300.026 | 0% | 10 Tage | Don 11.03.27 | Mit 24.03.27 |
| 1247 | **Bauteil 2 (Achse 2-11/H-Q) UG-4.OG** | | **4%** | **543 Tage** | **Don 07.08.25** | **Mit 13.10.27** |
| 1304 | **Ausbau + TGA** | | **0%** | **312 Tage** | **Mon 16.07.26** | **Mit 13.10.27** |
| 1305 | **UG Technikzentralen** | | **0%** | **285 Tage** | **Mon 24.08.26** | **Mit 13.10.27** |
| 1319 | 300.026 Metalltüren - Montage Flur-/TRH-Türen | AN 300.026 | 0% | 10 Tage | Die 12.01.27 | Mon 25.01.27 |
| 1331 | **UG WC-Anlagen** | | **0%** | **225 Tage** | **Don 17.09.26** | **Mon 16.08.27** |
| 1344 | 300.026 Metalltüren - Montage Flur-/TRH-Türen | AN 300.026 | 0% | 5 Tage | Die 09.03.27 | Mon 15.03.27 |
| 1361 | **EG Mensa, Speisesaal** | | **0%** | **217 Tage** | **Don 12.11.26** | **Mit 29.09.27** |
| 1373 | 300.026 Metalltüren - Montage Flur-/TRH-Türen | AN 300.026 | 0% | 5 Tage | Die 16.03.27 | Mon 22.03.27 |
| 1398 | **1.OG Cluster Mitte B** | | **0%** | **279 Tage** | **Die 28.07.26** | **Mit 08.09.27** |
| 1414 | 300.026 Metalltüren - Montage Flur-/TRH-Türen | AN 300.026 | 0% | 5 Tage | Die 23.02.27 | Mon 01.03.27 |
| 1418 | 300.026 Metalltüren - Montage Klassentüren | AN 300.026 | 0% | 5 Tage | Mit 19.05.27 | Die 25.05.27 |
| 1438 | **2.OG Cluster Mitte D** | | **0%** | **266 Tage** | **Die 28.07.26** | **Fre 20.08.27** |
| 1454 | 300.026 Metalltüren - Montage Flur-/TRH-Türen | AN 300.026 | 0% | 5 Tage | Die 09.02.27 | Mon 15.02.27 |
| 1458 | 300.026 Metalltüren - Montage Klassentüren | AN 300.026 | 0% | 10 Tage | Mon 26.04.27 | Mon 10.05.27 |
| 1478 | **3.OG Cluster Mitte E** | | **0%** | **274 Tage** | **Don 16.07.26** | **Fre 20.08.27** |
| 1494 | 300.026 Metalltüren - Montage Flur-/TRH-Türen | AN 300.026 | 0% | 5 Tage | Die 26.01.27 | Mon 01.02.27 |
| 1498 | 300.026 Metalltüren - Montage Klassentüren | AN 300.026 | 0% | 12 Tage | Don 08.04.27 | Fre 23.04.27 |
| 1518 | **4.OG Cluster Biologie/Physik, Hauswirtschaft** | | **0%** | **292 Tage** | **Don 16.07.26** | **Mit 15.09.27** |
| 1534 | 300.026 Metalltüren - Montage Flur-/TRH-Türen | AN 300.026 | 0% | 5 Tage | Die 12.01.27 | Mon 18.01.27 |
| 1538 | 300.026 Metalltüren - Montage Klassentüren | AN 300.026 | 0% | 10 Tage | Die 23.03.27 | Mit 07.04.27 |
| 1599 | **Bauteil 3 (Achse 11/Q-Z) EG** | | **0%** | **337 Tage** | **Don 12.03.26** | **Mit 21.07.27** |
| 1618 | **Ausbau + TGA** | | **0%** | **209 Tage** | **Die 15.09.26** | **Mit 21.07.27** |
| 1629 | 300.026 Metalltüren - Montage Türen | AN 300.026 | 0% | 5 Tage | Mon 02.11.26 | Fre 06.11.26 |
