ATP Ausführungsterminplan LPH 8

(Stand 24.06.2026)
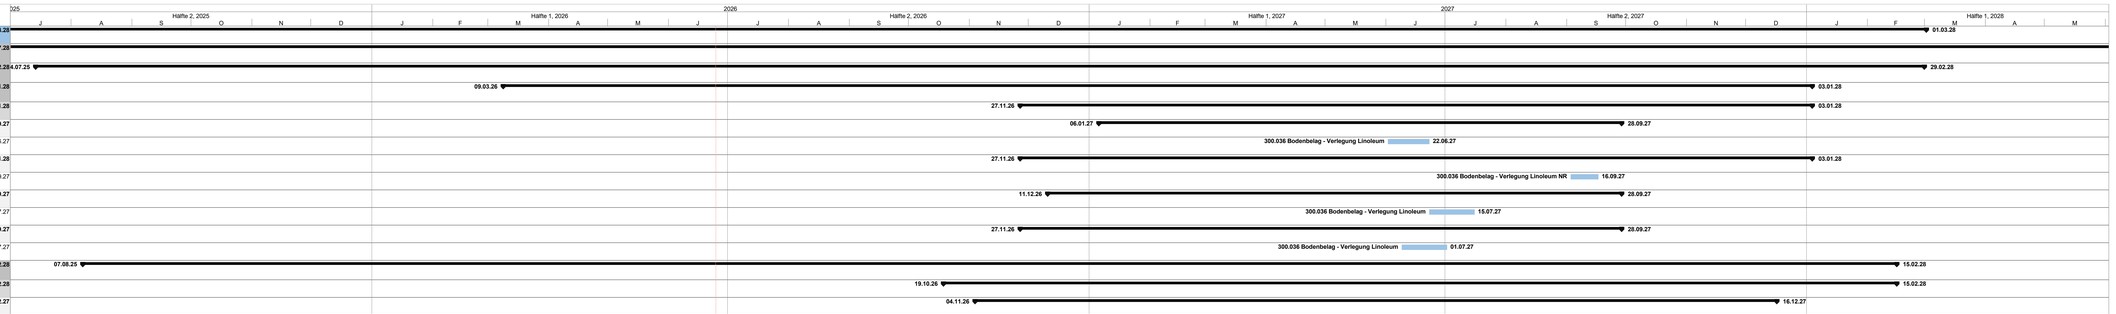
Nr.	Vorgangsname	Wer	%	Dauer	Anfang	Ende
138	**LPH 6+7 Ausschreibung + Vergabe**		**41%**	**906 Tage**	**Mon 01.07.24**	**Mit 01.03.28**
932	**LPH 8 Bauausführung**		**12%**	**1138 Tage**	**Mon 18.12.23**	**Mon 31.07.28**
975	**Neubau**		**8%**	**653 Tage**	**Mon 14.07.25**	**Die 29.02.28**
991	**Bauteil 1 (Achse 1-9/A-H) EG-2.OG**		**2%**	**451 Tage**	**Mon 09.03.26**	**Mon 03.01.28**
1039	**Ausbau + TGA**		**0%**	**267 Tage**	**Fre 27.11.26**	**Mon 03.01.28**
1040	**EG Willkommensklassen, Beratung**		**0%**	**185 Tage**	**Mit 06.01.27**	**Die 28.09.27**
1058	300.036 Bodenbelag - Verlegung Linoleum	AN 300.036	0%	15 Tage	Mit 02.06.27	Die 22.06.27
1070	**EG Küchenbereich**		**0%**	**267 Tage**	**Fre 27.11.26**	**Mon 03.01.28**
1094	300.036 Bodenbelag - Verlegung Linoleum NR	AN 300.036	0%	10 Tage	Fre 03.09.27	Don 16.09.27
1113	**1.OG Cluster Mitte A**		**0%**	**195 Tage**	**Fre 11.12.26**	**Die 28.09.27**
1134	300.036 Bodenbelag - Verlegung Linoleum	AN 300.036	0%	17 Tage	Mit 23.06.27	Don 15.07.27
1152	**2.OG Cluster Mitte C**		**0%**	**205 Tage**	**Fre 27.11.26**	**Die 28.09.27**
1174	300.036 Bodenbelag - Verlegung Linoleum	AN 300.036	0%	17 Tage	Mit 09.06.27	Don 01.07.27
1226	**Bauteil 2 (Achse 2-11/H-Q) UG-4.OG**		**5%**	**625 Tage**	**Don 07.08.25**	**Die 15.02.28**
1297	**Ausbau + TGA**		**0%**	**327 Tage**	**Mon 19.10.26**	**Die 15.02.28**
1391	**1.OG Cluster Mitte B**		**0%**	**279 Tage**	**Mit 04.11.26**	**Don 16.12.27**
1414	300.036 Bodenbelag - Verlegung Linoleum	AN 300.036	0%	20 Tage	Fre 10.09.27	Don 07.10.27
1431	**2.OG Cluster Mitte D**		**0%**	**266 Tage**	**Mit 04.11.26**	**Mon 29.11.27**
1454	300.036 Bodenbelag - Verlegung Linoleum	AN 300.036	0%	20 Tage	Fre 20.08.27	Don 16.09.27
1471	**3.OG Cluster Mitte E**		**0%**	**274 Tage**	**Fre 23.10.26**	**Mon 29.11.27**
1494	300.036 Bodenbelag - Verlegung Linoleum	AN 300.036	0%	15 Tage	Fre 06.08.27	Don 26.08.27
1511	**4.OG Cluster Biologie/Physik, Hauswirtschaft**		**0%**	**292 Tage**	**Fre 23.10.26**	**Mon 03.01.28**
1535	300.036 Bodenbelag - Verlegung Linoleum	AN 300.036	0%	22 Tage	Mit 21.07.27	Don 19.08.27
1594	**Bauteil 3 (Achse 11/Q-Z) EG**		**0%**	**319 Tage**	**Mon 22.06.26**	**Die 28.09.27**
1618	**Ausbau + TGA**		**0%**	**194 Tage**	**Mon 14.12.26**	**Die 28.09.27**
1633	300.036 Bodenbelag - Verlegung Linoleum	AN 300.036	0%	10 Tage	Mit 21.04.27	Die 04.05.27
1690	**Forum - Rückbau Küche Bestand**		**0%**	**103 Tage**	**Mit 01.03.28**	**Mon 31.07.28**
