25154 Neubau Anne-Frank-Gesamtschule Dortmund

ATP Ausführungsterminplan LPH 8

(Stand 27.05.2026)
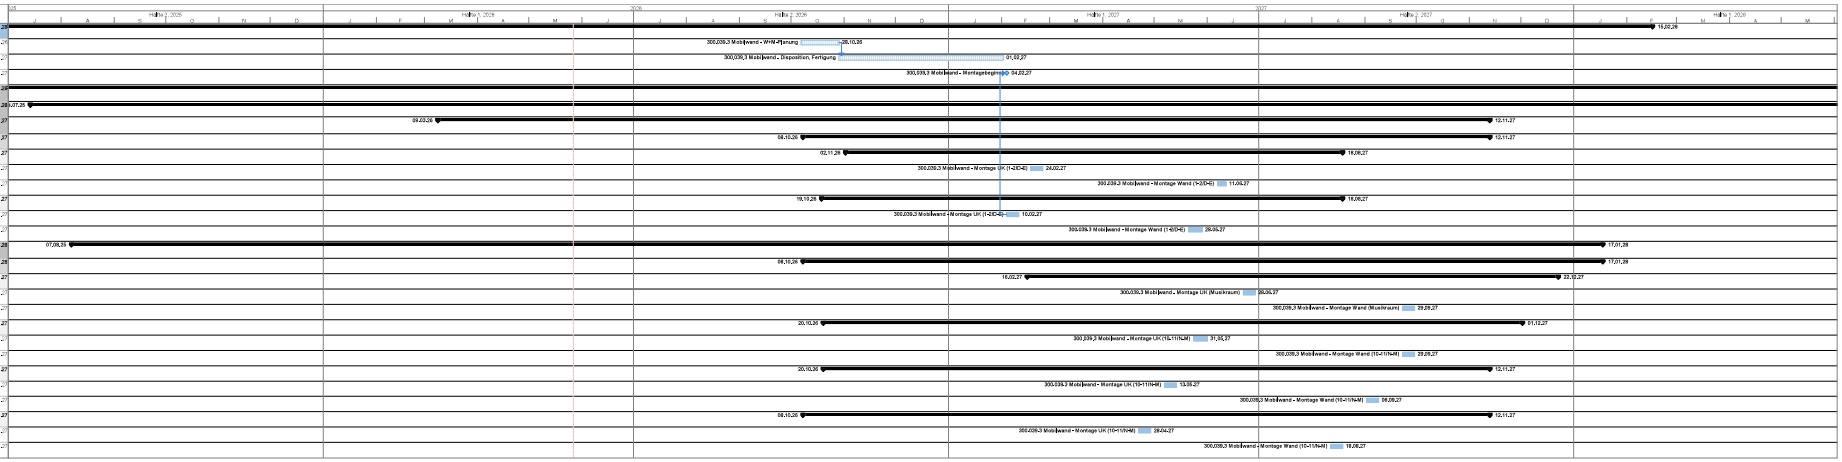
Nr.	Vorgangsname	Wer	%	Dauer	Anfang	Ende
138	**LPH 6+7 Ausschreibung + Vergabe**		37%	897 Tage	Mon 01.07.24	Di 15.02.28
448	300.039.3 Mobilwand - W+N-Planung	AN 300.039.3	0%	16 Tage	Mi 07.10.26	Mi 28.10.26
449	300.039.3 Mobilwand - Disposition, Fertigung	AN 300.039.3	0%	60 Tage	Don 29.10.26	Mon 01.03.27
450	300.039.3 Mobilwand - Montagebeginn	AN 300.039.3	0%	1 Tag	Don 04.02.27	Don 04.02.27
528	**LPH 8 Bauausführung**		12%	2807 Tage?	Mi 01.03.17	Fre 14.07.28
571	**Neubau**		7%	745 Tage?	Mon 14.07.25	Fre 14.07.28
967	**Bauteil 1 (Achse 1-6/A-H) EG-2.OG**		2%	422 Tage	Mon 09.03.26	Fre 12.11.27
1034	**Ausbau + TGA**		0%	274 Tage	Don 08.10.26	Fre 12.11.27
1108	**1.OG Cluster Mitte A**		0%	195 Tage	Mon 02.11.26	Mi 18.08.27
1122	300.039.3 Mobilwand - Montage UK (1-2/E-G)	AN 300.039.3	0%	5 Tage	Don 18.02.27	Mi 24.02.27
1131	300.039.3 Mobilwand - Montage Wand (1-2/E-G)	AN 300.039.3	0%	5 Tage	Mon 07.06.27	Fre 11.06.27
1147	**2.OG Cluster Mitte C**		0%	205 Tage	Mon 16.10.26	Mi 18.08.27
1161	300.039.3 Mobilwand - Montage UK (1-2/E-G)	AN 300.039.3	0%	5 Tage	Don 04.02.27	Mi 10.02.27
1170	300.039.3 Mobilwand - Montage Wand (1-2/E-G)	AN 300.039.3	0%	5 Tage	Fre 21.05.27	Fre 26.05.27
1221	**Bauteil 2 (Achse 2-11/H-G) UG-4.OG**		5%	604 Tage?	Don 07.09.25	Mon 17.01.28
1250	**Ausbau + TGA**		0%	313 Tage	Don 08.10.26	Mon 17.01.28
1250	**EG Mensa, Speisensa[**		0%	217 Tage	Di 16.02.27	Mi 22.12.27
1364	300.039.3 Mobilwand - Montage UK (Aula+Bühne)	AN 300.039.3	0%	5 Tage	Di 22.06.27	Mon 28.06.27
1371	300.039.3 Mobilwand - Montage Wand (Musikraum)	AN 300.039.3	0%	5 Tage	Don 23.09.27	Mi 29.09.27
1387	**1.OG Cluster Mitte B**		0%	279 Tage	Di 20.10.26	Mi 01.12.27
1401	300.039.3 Mobilwand - Montage UK (10-11/N-M)	AN 300.039.3	0%	5 Tage	Mon 24.08.27	Mon 31.08.27
1411	300.039.3 Mobilwand - Montage Wand (10-11/N-M)	AN 300.039.3	0%	5 Tage	Don 23.09.27	Mi 29.09.27
1427	**2.OG Cluster Mitte D**		0%	266 Tage	Di 20.10.26	Fre 12.11.27
1441	300.039.3 Mobilwand - Montage UK (10-11/N-M)	AN 300.039.3	0%	5 Tage	Fre 07.08.27	Don 13.08.27
1451	300.039.3 Mobilwand - Montage Wand (10-11/N-M)	AN 300.039.3	0%	5 Tage	Don 02.09.27	Mi 08.09.27
1467	**3.OG Cluster Mitte E**		0%	274 Tage	Don 08.10.26	Fre 12.11.27
1481	300.039.3 Mobilwand - Montage UK (10-11/N-M)	AN 300.039.3	0%	5 Tage	Don 22.04.27	Mi 28.04.27
1491	300.039.3 Mobilwand - Montage Wand (10-11/N-M)	AN 300.039.3	0%	5 Tage	Don 12.08.27	Mi 18.08.27
