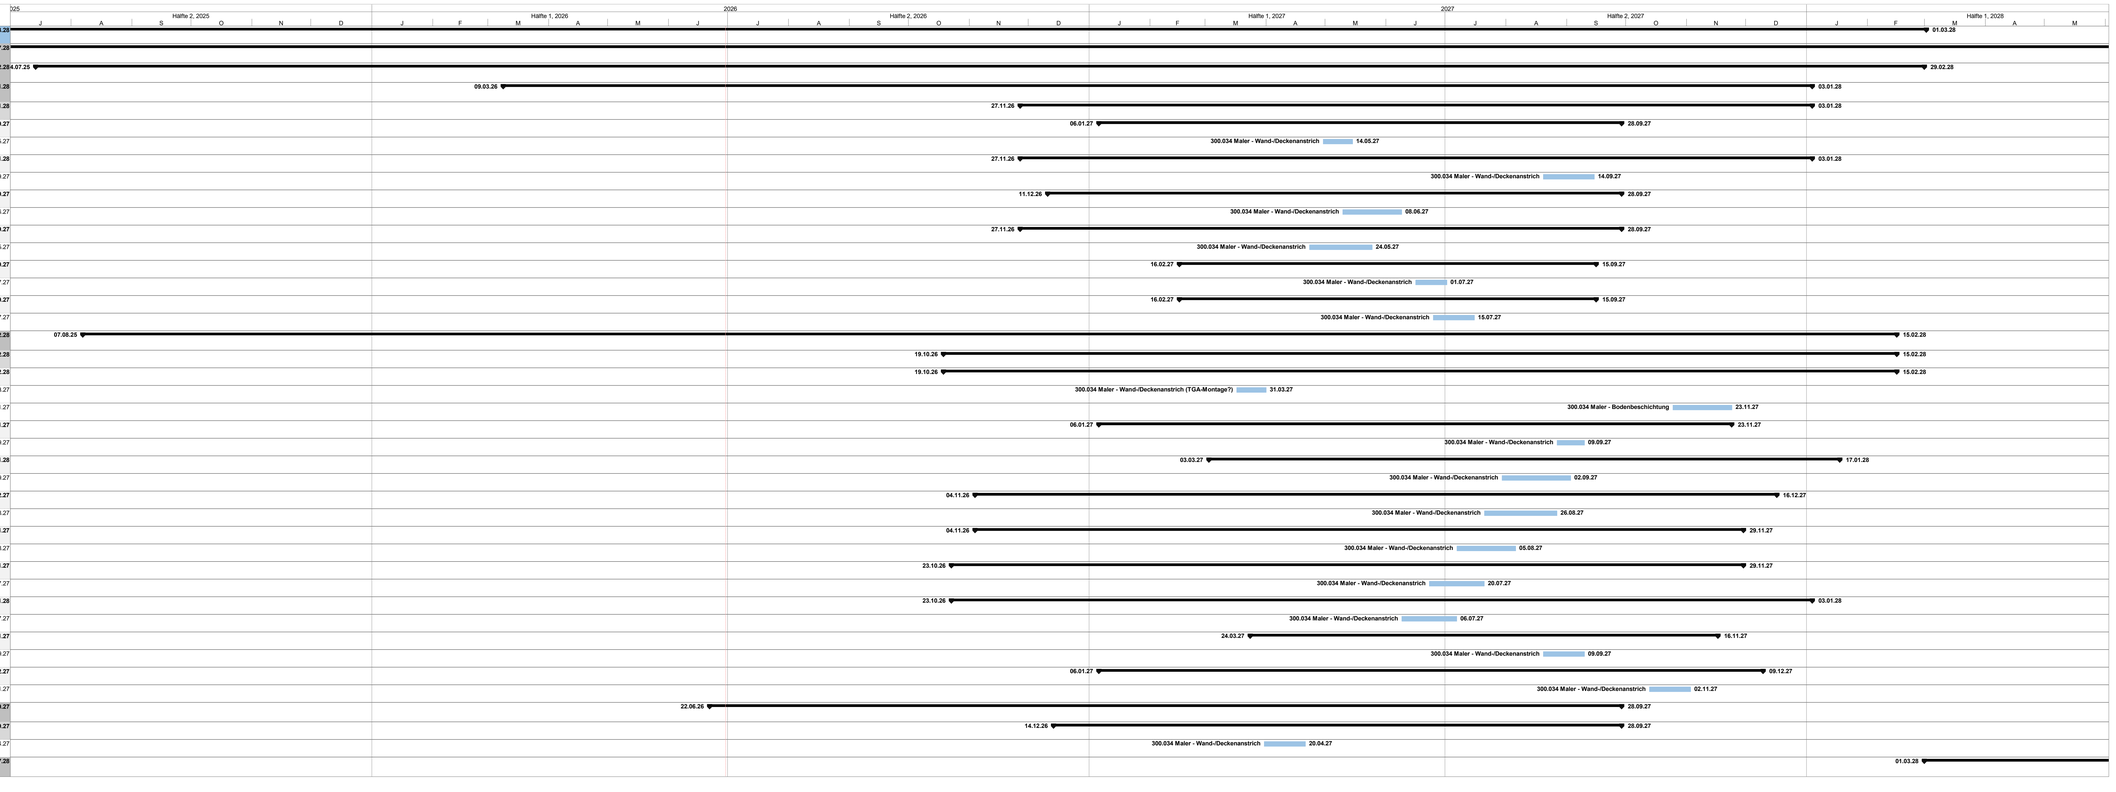Nr.	Vorgangsname	Wer	%	Dauer	Anfang	Ende
138	**LPH 6+7 Ausschreibung + Vergabe**		**41%**	**906 Tage**	**Mon 01.07.24**	**Mit 01.03.28**
932	**LPH 8 Bauausführung**		**12%**	**1138 Tage**	**Mon 18.12.23**	**Mon 31.07.28**
975	**Neubau**		**8%**	**653 Tage**	**Mon 14.07.25**	**Die 29.02.28**
991	**Bauteil 1 (Achse 1-9/A-H) EG-2.OG**		**2%**	**451 Tage**	**Mon 09.03.26**	**Mon 03.01.28**
1039	**Ausbau + TGA**		**0%**	**267 Tage**	**Fre 27.11.26**	**Mon 03.01.28**
1040	**EG Willkommensklassen, Beratung**		**0%**	**185 Tage**	**Mit 06.01.27**	**Die 28.09.27**
1054	300.034 Maler - Wand-/Deckenanstrich	AN 300.034	0%	10 Tage	Fre 30.04.27	Fre 14.05.27
1070	**EG Küchenbereich**		**0%**	**267 Tage**	**Fre 27.11.26**	**Mon 03.01.28**
1093	300.034 Maler - Wand-/Deckenanstrich	AN 300.034	0%	18 Tage	Fre 20.08.27	Die 14.09.27
1113	**1.OG Cluster Mitte A**		**0%**	**195 Tage**	**Fre 11.12.26**	**Die 28.09.27**
1131	300.034 Maler - Wand-/Deckenanstrich	AN 300.034	0%	20 Tage	Mon 10.05.27	Die 08.06.27
1152	**2.OG Cluster Mitte C**		**0%**	**205 Tage**	**Fre 27.11.26**	**Die 28.09.27**
1170	300.034 Maler - Wand-/Deckenanstrich	AN 300.034	0%	20 Tage	Fre 23.04.27	Mon 24.05.27
1191	**Treppenhaus TRH C**		**0%**	**147 Tage**	**Die 16.02.27**	**Mit 15.09.27**
1203	300.034 Maler - Wand-/Deckenanstrich	AN 300.034	0%	12 Tage	Mit 16.06.27	Don 01.07.27
1210	**Treppenhaus TRH D**		**0%**	**147 Tage**	**Die 16.02.27**	**Mit 15.09.27**
1219	300.034 Maler - Wand-/Deckenanstrich	AN 300.034	0%	15 Tage	Fre 25.06.27	Don 15.07.27
1226	**Bauteil 2 (Achse 2-11/H-Q) UG-4.OG**		**5%**	**629 Tage**	**Don 07.08.25**	**Die 15.02.28**
1297	**Ausbau + TGA**		**0%**	**327 Tage**	**Mon 19.10.26**	**Die 15.02.28**
1298	**UG Technikzentralen**		**1%**	**327 Tage**	**Mon 19.10.26**	**Die 15.02.28**
1303	300.034 Maler - Wand-/Deckenanstrich (TGA-Montage?)	AN 300.034	0%	9 Tage	Mit 17.03.27	Mit 31.03.27
1314	300.034 Maler - Bodenbeschichtung	AN 300.034	0%	22 Tage	Mon 25.10.27	Die 23.11.27
1324	**UG WC-Anlagen**		**0%**	**225 Tage**	**Mit 06.01.27**	**Die 23.11.27**
1340	300.034 Maler - Wand-/Deckenanstrich	AN 300.034	0%	10 Tage	Fre 27.08.27	Don 09.09.27
1354	**EG Mensa, Speisesaal**		**0%**	**217 Tage**	**Mit 03.03.27**	**Mon 17.01.28**
1371	300.034 Maler - Wand-/Deckenanstrich	AN 300.034	0%	25 Tage	Fre 30.07.27	Don 02.09.27
1391	**1.OG Cluster Mitte B**		**0%**	**279 Tage**	**Mit 04.11.26**	**Don 16.12.27**
1410	300.034 Maler - Wand-/Deckenanstrich	AN 300.034	0%	27 Tage	Mit 21.07.27	Don 26.08.27
1431	**2.OG Cluster Mitte D**		**0%**	**266 Tage**	**Mit 04.11.26**	**Don 29.11.27**
1450	300.034 Maler - Wand-/Deckenanstrich	AN 300.034	0%	22 Tage	Mit 07.07.27	Don 05.08.27
1471	**3.OG Cluster Mitte E**		**0%**	**274 Tage**	**Fre 23.10.26**	**Mon 29.11.27**
1490	300.034 Maler - Wand-/Deckenanstrich	AN 300.034	0%	20 Tage	Mit 23.06.27	Die 20.07.27
1511	**4.OG Cluster Biologie/Physik, Hauswirtschaft**		**0%**	**292 Tage**	**Fre 23.10.26**	**Mon 03.01.28**
1531	300.034 Maler - Wand-/Deckenanstrich	AN 300.034	0%	20 Tage	Mit 09.06.27	Die 06.07.27
1554	**Treppenhaus TRH A**		**0%**	**165 Tage**	**Mit 24.03.27**	**Die 16.11.27**
1566	300.034 Maler - Wand-/Deckenanstrich	AN 300.034	0%	15 Tage	Fre 20.08.27	Don 09.09.27
1573	**Treppenhaus TRH B**		**0%**	**237 Tage**	**Mit 06.01.27**	**Don 09.12.27**
1587	300.034 Maler - Wand-/Deckenanstrich	AN 300.034	0%	15 Tage	Mit 13.10.27	Die 02.11.27
1594	**Bauteil 3 (Achse 11/Q-Z) EG**		**0%**	**319 Tage**	**Mon 22.06.26**	**Die 28.09.27**
1618	**Ausbau + TGA**		**0%**	**194 Tage**	**Mon 14.12.26**	**Die 28.09.27**
1631	300.034 Maler - Wand-/Deckenanstrich	AN 300.034	0%	15 Tage	Mit 31.03.27	Die 20.04.27
1690	**Forum - Rückbau Küche Bestand**		**0%**	**103 Tage**	**Mit 01.03.28**	**Mon 31.07.28**
