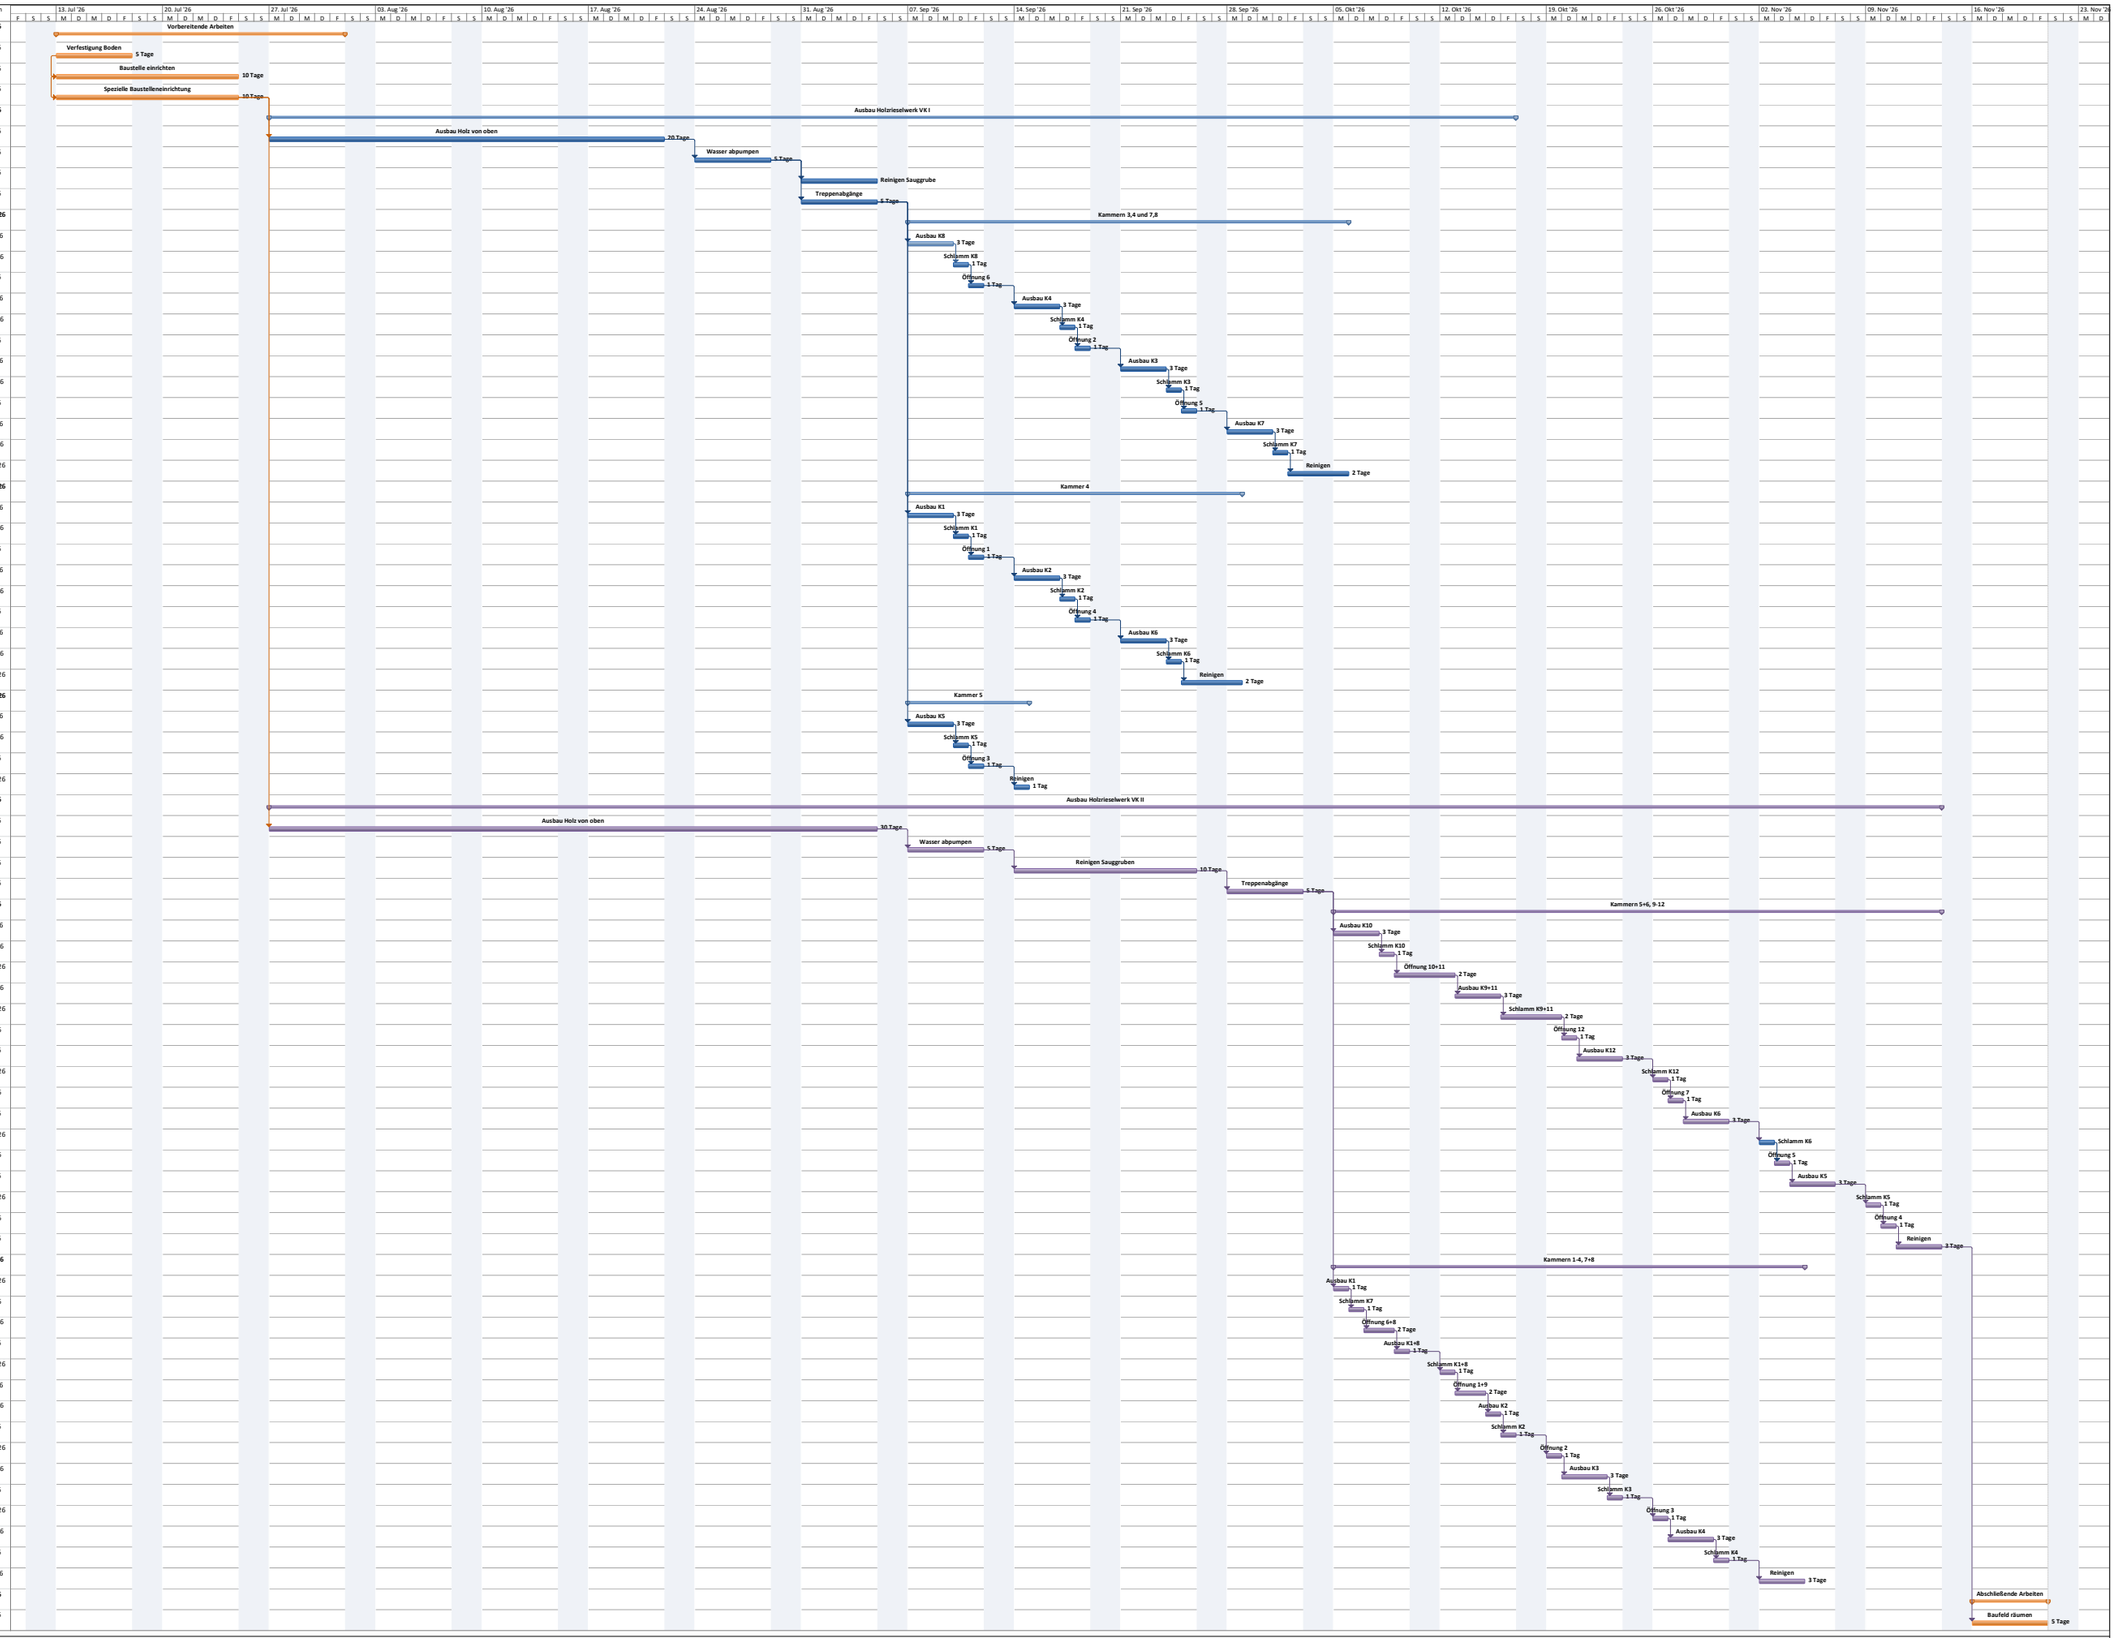Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen
1	**Vorbereitende Arbeiten**	**15 Tage**	**Mo 13.07.26**	**Fr 31.07.26**
2	Verfestigung Boden	5 Tage	Mo 13.07.26	Fr 17.07.26
3	Baustelle einrichten	10 Tage	Mo 13.07.26	Fr 24.07.26
4	Spezielle Baustelleneinrichtung	10 Tage	Mo 13.07.26	Fr 24.07.26
5	**Ausbau Holzrieselwerk VK I**	**60 Tage**	**Mo 27.07.26**	**Fr 16.10.26**
6	Ausbau Holz von oben (8 Kammern) + Aufmaß	20 Tage	Mo 27.07.26	Fr 21.08.26
7	Wasser abpumpen	5 Tage	Mo 24.08.26	Fr 28.08.26
8	Entfernen Schlamm + Reinigung Sauggrube	5 Tage	Mo 31.08.26	Fr 04.09.26
9	Treppenabgänge Kammern 1, 5, 8 (Gerüstbau)	5 Tage	Mo 31.08.26	Fr 04.09.26
10	**Kammern 3,4 und 7,8**	**21 Tage**	**Mo 07.09.26**	**Mo 05.10.26**
11	Ausbau Holz Kammer 8	3 Tage	Mo 07.09.26	Mi 09.09.26
12	Entfernen Schlamm Kammer 8	1 Tag	Do 10.09.26	Do 10.09.26
13	Herstellen Öffnung 6	1 Tag	Fr 11.09.26	Fr 11.09.26
14	Ausbau Holz Kammer 4	3 Tage	Mo 14.09.26	Mi 16.09.26
15	Entfernen Schlamm Kammer 4	1 Tag	Do 17.09.26	Do 17.09.26
16	Herstellen Öffnung 2	1 Tag	Fr 18.09.26	Fr 18.09.26
17	Ausbau Holz Kammer 3	3 Tage	Mo 21.09.26	Mi 23.09.26
18	Entfernen Schlamm Kammer 3	1 Tag	Do 24.09.26	Do 24.09.26
19	Herstellen Öffnung 5	1 Tag	Fr 25.09.26	Fr 25.09.26
20	Ausbau Holz Kammer 7	3 Tage	Mo 28.09.26	Mi 30.09.26
21	Entfernen Schlamm Kammer 7	1 Tag	Do 01.10.26	Do 01.10.26
22	Reinigen Kammern 3,4 und 7,8	2 Tage	Fr 02.10.26	Mo 05.10.26
23	**Kammern 1, 2 und 6**	**16 Tage**	**Mo 07.09.26**	**Mo 28.09.26**
24	Ausbau Holz Kammer 1	3 Tage	Mo 07.09.26	Mi 09.09.26
25	Entfernen Schlamm Kammer 1	1 Tag	Do 10.09.26	Do 10.09.26
26	Herstellen Öffnung 1	1 Tag	Fr 11.09.26	Fr 11.09.26
27	Ausbau Holz Kammer 2	3 Tage	Mo 14.09.26	Mi 16.09.26
28	Entfernen Schlamm Kammer 2	1 Tag	Do 17.09.26	Do 17.09.26
29	Herstellen Öffnung 4	1 Tag	Fr 18.09.26	Fr 18.09.26
30	Ausbau Holz Kammer 6	3 Tage	Mo 21.09.26	Mi 23.09.26
31	Entfernen Schlamm Kammer 6	1 Tag	Do 24.09.26	Do 24.09.26
32	Reinigen Kammern 1,2 und 6	2 Tage	Fr 25.09.26	Mo 28.09.26
33	**Kammer 5**	**6 Tage**	**Mo 07.09.26**	**Mo 14.09.26**
34	Ausbau Holz Kammer 5	3 Tage	Mo 07.09.26	Mi 09.09.26
35	Entfernen Schlamm Kammer 5	1 Tag	Do 10.09.26	Do 10.09.26
36	Herstellen Öffnung 3	1 Tag	Fr 11.09.26	Fr 11.09.26
37	Reinigen Kammer 5	1 Tag	Mo 14.09.26	Mo 14.09.26
38	**Ausbau Holzrieselwerk VK II**	**80 Tage**	**Mo 27.07.26**	**Fr 13.11.26**
39	Ausbau Holz von oben (12 Kammern) + Aufmaß	30 Tage	Mo 27.07.26	Fr 04.09.26
40	Wasser abpumpen	5 Tage	Mo 07.09.26	Fr 11.09.26
41	Entfernen Schlamm + Reinigung Sauggruben	10 Tage	Mo 14.09.26	Fr 25.09.26
42	Treppenabgänge Kammern 7, 10 (Gerüstbau)	5 Tage	Mo 28.09.26	Fr 02.10.26
43	**Kammern 5+6 und 9-12**	**30 Tage**	**Mo 05.10.26**	**Fr 13.11.26**
44	Ausbau Holz Kammer 10	3 Tage	Mo 05.10.26	Mi 07.10.26
45	Entfernen Schlamm Kammer 10	1 Tag	Do 08.10.26	Do 08.10.26
46	Herstellen Öffnung 10+11	2 Tage	Fr 09.10.26	Mo 12.10.26
47	Ausbau Holz Kammer 9+11	3 Tage	Di 13.10.26	Do 15.10.26
48	Entfernen Schlamm Kammer 9+11	2 Tage	Fr 16.10.26	Mo 19.10.26
49	Herstellen Öffnung 12	1 Tag	Di 20.10.26	Di 20.10.26
50	Ausbau Holz Kammer 12	3 Tage	Mi 21.10.26	Fr 23.10.26
51	Entfernen Schlamm Kammer 12	1 Tag	Mo 26.10.26	Mo 26.10.26
52	Herstellen Öffnung 7	1 Tag	Di 27.10.26	Di 27.10.26
53	Ausbau Holz Kammer 6	3 Tage	Mi 28.10.26	Fr 30.10.26
54	Entfernen Schlamm Kammer 6	1 Tag	Mo 02.11.26	Mo 02.11.26
55	Herstellen Öffnung 5	1 Tag	Di 03.11.26	Di 03.11.26
56	Ausbau Kammer 5	3 Tage	Mi 04.11.26	Fr 06.11.26
57	Entfernen Schlamm Kammer 5	1 Tag	Mo 09.11.26	Mo 09.11.26
58	Herstellen Öffnung 4	1 Tag	Di 10.11.26	Di 10.11.26
59	Reinigen Kammern 5,6 und 9-12	3 Tage	Mi 11.11.26	Fr 13.11.26
60	**Kammern 1-4 und 7+8**	**23 Tage**	**Mo 05.10.26**	**Mi 04.11.26**
61	Ausbau Holz Kammer 7	1 Tag	Mo 05.10.26	Mo 05.10.26
62	Entfernen Schlamm Kammer 7	1 Tag	Di 06.10.26	Di 06.10.26
63	Herstellen Öffnung 6+8	2 Tage	Mi 07.10.26	Do 08.10.26
64	Ausbau Holz Kammer 1+8	1 Tag	Fr 09.10.26	Fr 09.10.26
65	Entfernen Schlamm Kammer 1+8	1 Tag	Mo 12.10.26	Mo 12.10.26
66	Herstellen Öffnung 1+9	2 Tage	Di 13.10.26	Mi 14.10.26
67	Ausbau Holz Kammer 2	1 Tag	Do 15.10.26	Do 15.10.26
68	Entfernen Schlamm Kammer 2	1 Tag	Fr 16.10.26	Fr 16.10.26
69	Herstellen Öffnung 2	1 Tag	Mo 19.10.26	Mo 19.10.26
70	Ausbau Holz Kammer 3	3 Tage	Di 20.10.26	Do 22.10.26
71	Entfernen Schlamm Kammer 3	1 Tag	Fr 23.10.26	Fr 23.10.26
72	Herstellen Öffnung 3	1 Tag	Mo 26.10.26	Mo 26.10.26
73	Ausbau Kammer 4	3 Tage	Di 27.10.26	Do 29.10.26
74	Entfernen Schlamm Kammer 4	1 Tag	Fr 30.10.26	Fr 30.10.26
75	Reinigen Kammern 1-4 und 7+8	3 Tage	Mo 02.11.26	Mi 04.11.26
76	**Abschließende Arbeiten**	**5 Tage**	**Mo 16.11.26**	**Fr 20.11.26**
77	Baustelle räumen + reinigen	5 Tage	Mo 16.11.26	Fr 20.11.26
