21016 Neubau & Umbau im Bestand Melanchthonschule

Stand: 28.08.2025
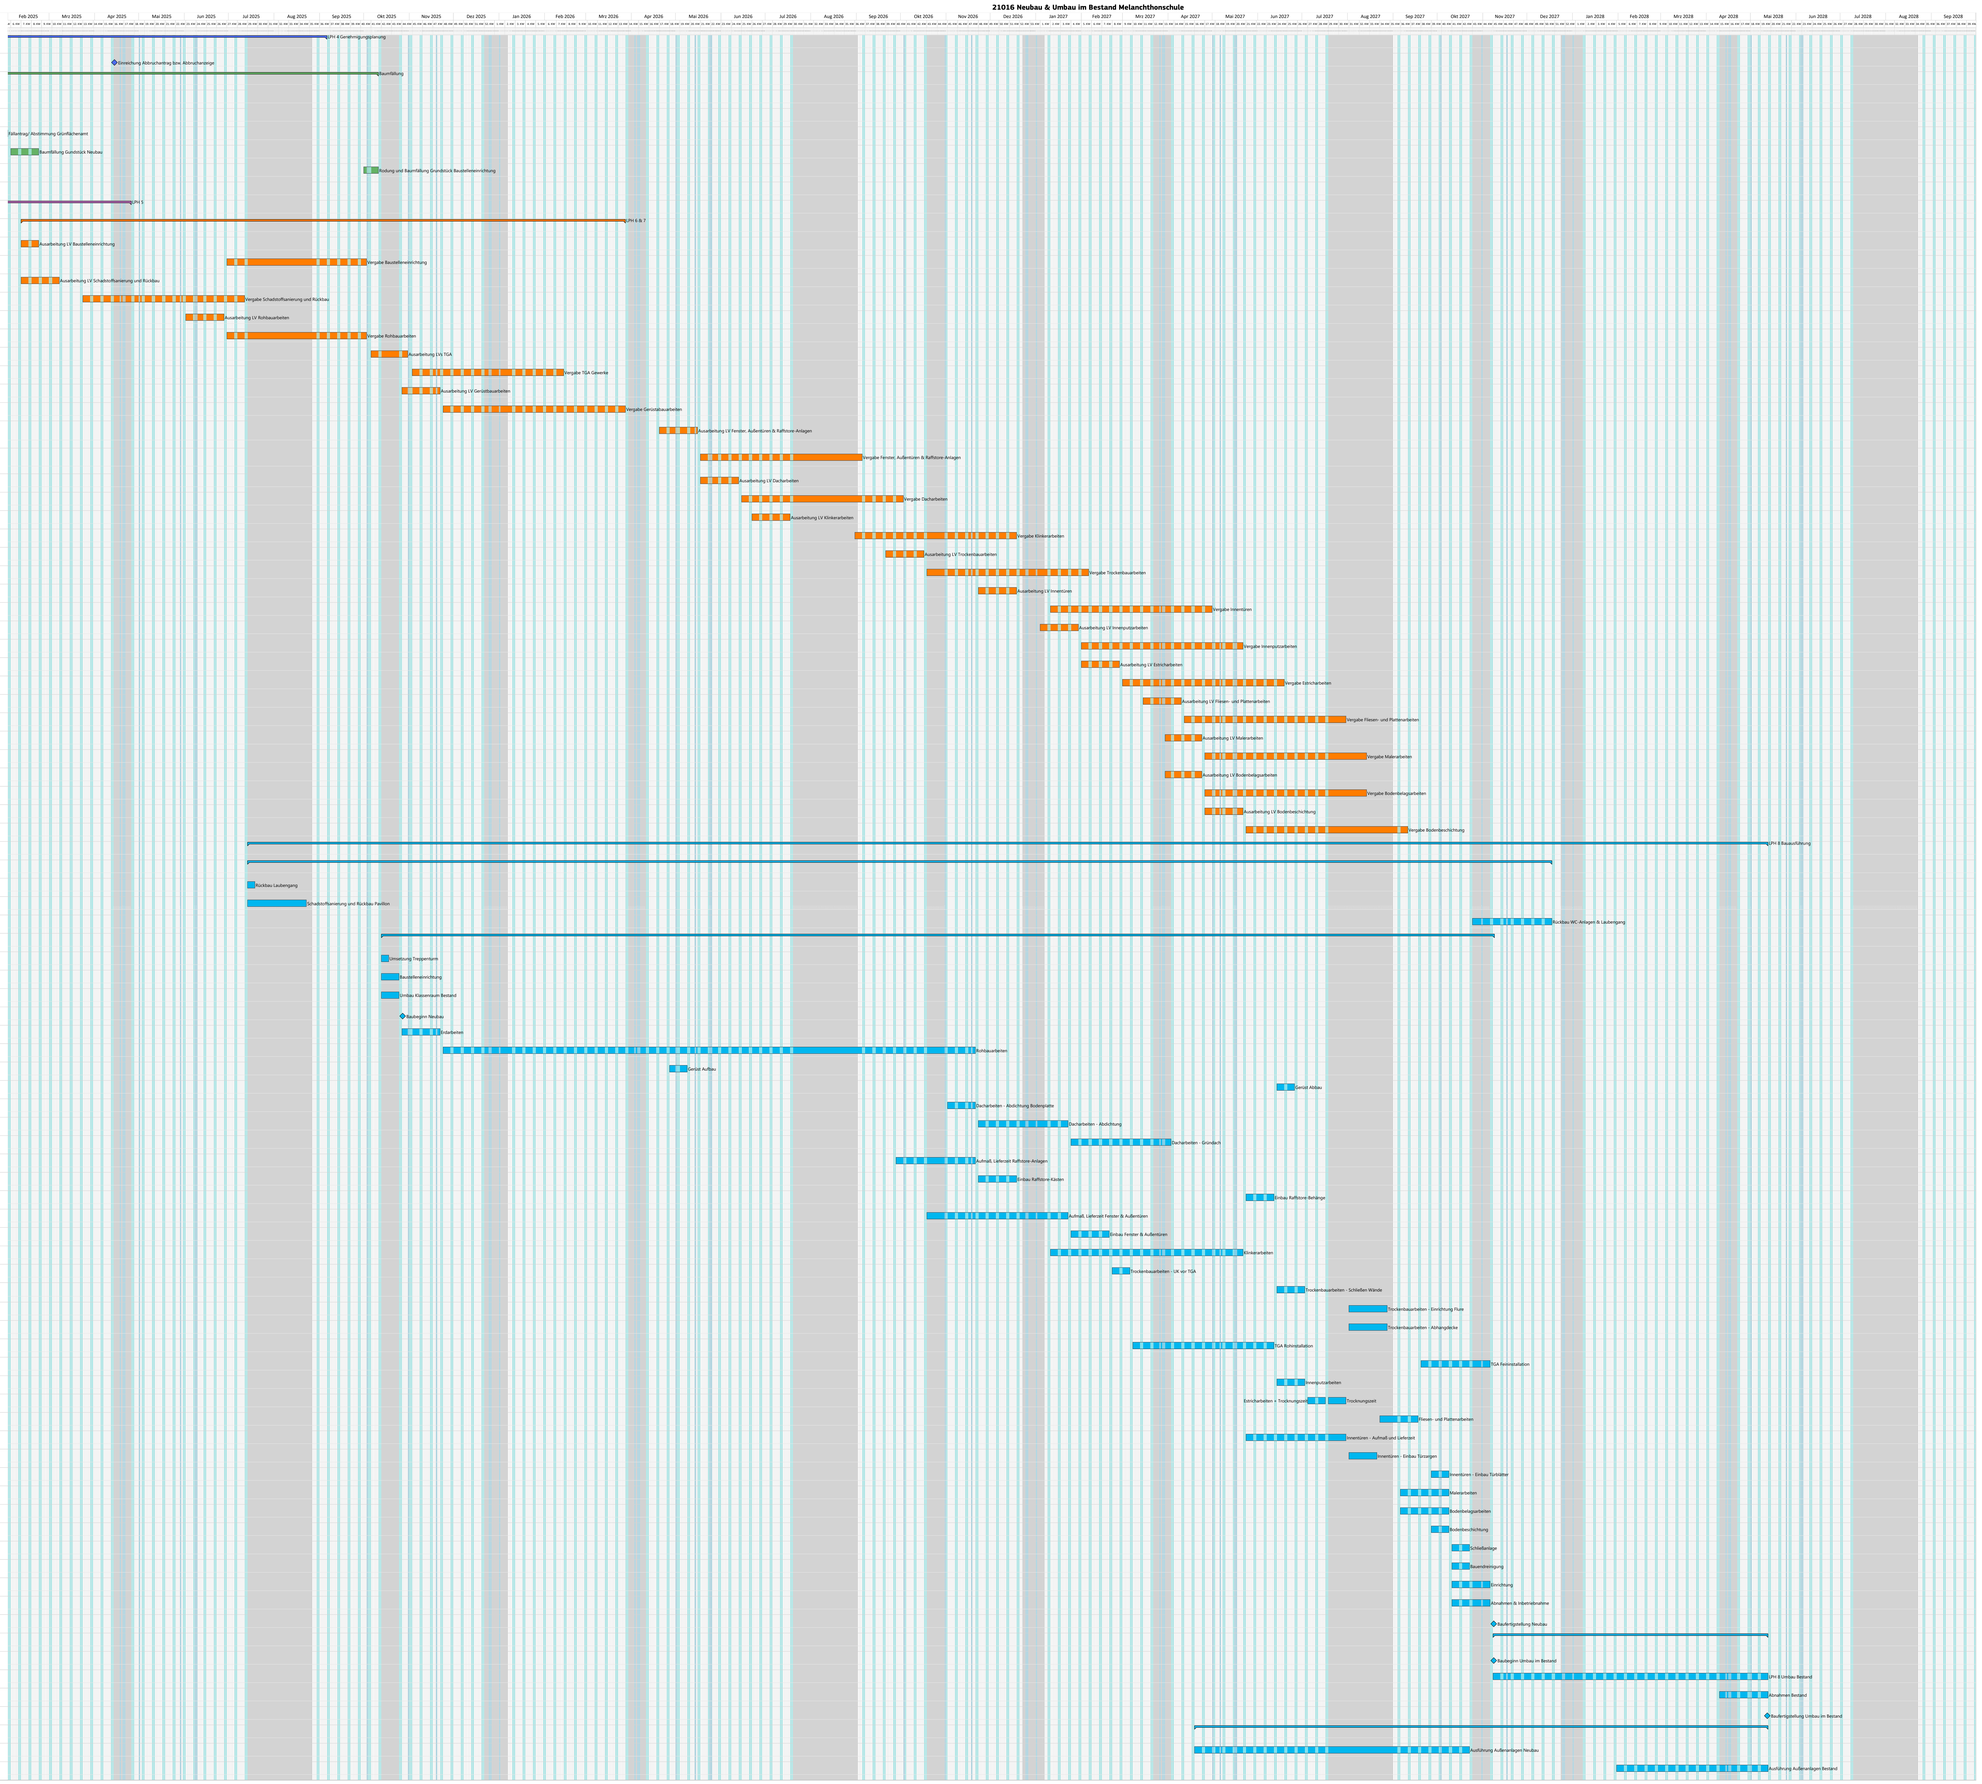
Nr	Name	Anfang	Ende
1	LPH 4 Genehmigungsplanung	Mo, 02.09.24	Fr, 05.09.25
2	Einreichung Abbruchantrag bzw. Abbruchanzeige	Mo, 14.04.25	Mo, 14.04.25
3	Baumfällung	Mo, 18.11.24	Fr, 10.10.25
3.1	Rodung Flurstück 1036	Mo, 18.11.24	Fr, 29.11.24
3.2	Aufnahme Bäume durch Vermesser	Mo, 02.12.24	Fr, 13.12.24
3.3	Fällantrag/ Abstimmung Grünflächenamt	Mo, 13.01.25	Fr, 31.01.25
3.4	Baumfällung Grundstück Neubau	Mo, 03.02.25	Fr, 21.02.25
3.5	Rodung und Baumfällung Grundstück Baustelleneinrichtung	Mi, 01.10.25	Fr, 10.10.25
4	Schadstoffbegutachtung Bestand, Abbruch- & Rückbaukonzept	Mo, 14.10.24	Fr, 20.12.24
5	LPH 5	Mo, 04.11.24	Fr, 25.04.25
6	LPH 6 & 7	Mo, 10.02.25	Fr, 27.03.26
6.1	Ausarbeitung LV Baustelleneinrichtung	Mo, 10.02.25	Fr, 21.02.25
6.2	Vergabe Baustelleneinrichtung	Mo, 30.06.25	Do, 02.10.25
6.3	Ausarbeitung LV Schadstoffsanierung und Rückbau	Mo, 10.02.25	Fr, 07.03.25
6.4	Vergabe Schadstoffsanierung und Rückbau	Mo, 24.03.25	Fr, 11.07.25
6.5	Ausarbeitung LV Rohbauarbeiten	Mo, 02.06.25	Fr, 27.06.25
6.6	Vergabe Rohbauarbeiten	Mo, 30.06.25	Do, 02.10.25
6.7	Ausarbeitung LVs TGA	Mo, 06.10.25	Do, 30.10.25
6.8	Vergabe TGA Gewerke	Mo, 03.11.25	Fr, 13.02.26
6.9	Ausarbeitung LV Gerüstbauarbeiten	Mo, 27.10.25	Fr, 21.11.25
6.10	Vergabe Gerüstbauarbeiten	Mo, 24.11.25	Fr, 27.03.26
7	Ausarbeitung LV Fenster, Außentüren & Rafflstore-Anlagen	Mo, 20.04.26	Fr, 15.05.26
8	Vergabe Fenster, Außentüren & Rafflstore-Anlagen	Mo, 18.05.26	Fr, 04.09.26
9	Ausarbeitung LV Dacharbeiten	Mo, 18.05.26	Fr, 12.06.26
10	Vergabe Dacharbeiten	Mo, 15.06.26	Fr, 02.10.26
11	Ausarbeitung LV Klinkerarbeiten	Mo, 22.06.26	Fr, 17.07.26
12	Vergabe Klinkerarbeiten	Mo, 31.08.26	Fr, 18.12.26
13	Ausarbeitung LV Trockenbauarbeiten	Mo, 21.09.26	Fr, 16.10.26
14	Vergabe Trockenbauarbeiten	Mo, 19.10.26	Fr, 05.02.27
15	Ausarbeitung LV Innentüren	Mo, 23.11.26	Fr, 18.12.26
16	Vergabe Innentüren	Mo, 11.01.27	Fr, 30.04.27
17	Ausarbeitung LV Innenputzarbeiten	Mo, 04.01.27	Fr, 29.01.27
18	Vergabe Innenputzarbeiten	Mo, 01.02.27	Fr, 21.05.27
19	Ausarbeitung LV Estricharbeiten	Mo, 01.02.27	Fr, 26.02.27
20	Vergabe Estricharbeiten	Mo, 01.03.27	Fr, 18.06.27
21	Ausarbeitung LV Fliesen- und Plattenarbeiten	Mo, 15.03.27	Fr, 09.04.27
22	Vergabe Fliesen- und Plattenarbeiten	Mo, 12.04.27	Fr, 30.07.27
23	Ausarbeitung LV Malerarbeiten	Di, 30.03.27	Fr, 23.04.27
24	Vergabe Malerarbeiten	Mo, 26.04.27	Fr, 13.08.27
25	Ausarbeitung LV Bodenbelagsarbeiten	Di, 30.03.27	Fr, 23.04.27
26	Vergabe Bodenbelagsarbeiten	Mo, 26.04.27	Fr, 13.08.27
27	Ausarbeitung LV Bodenbeschichtung	Mo, 26.04.27	Fr, 21.05.27
28	Vergabe Bodenbeschichtung	Mo, 24.05.27	Fr, 10.09.27
29	LPH 8 Bauausführung	Mo, 14.07.25	Fr, 12.05.28
29.1	Schadstoffsanierung und Rückbau	Mo, 14.07.25	Fr, 17.12.27
29.1.1	Rückbau Laubengang	Mo, 14.07.25	Fr, 18.07.25
29.1.2	Schadstoffsanierung und Rückbau Pavillon	Mo, 14.07.25	Fr, 22.08.25
29.1.3	Rückbau WC-Anlagen & Laubengang	Mo, 25.10.27	Fr, 17.12.27
29.2	Bauausführung Neubau	Mo, 13.10.25	Mo, 08.11.27
29.2.1	Umsetzung Treppenturm	Mo, 13.10.25	Fr, 17.10.25
29.2.2	Baustelleneinrichtung	Mo, 13.10.25	Fr, 24.10.25
29.2.3	Umbau Klassenraum Bestand	Mo, 13.10.25	Fr, 24.10.25
29.2.4	Baubeginn Neubau	Mo, 27.10.25	Mo, 27.10.25
29.2.5	Erdarbeiten	Mo, 27.10.25	Fr, 21.11.25
29.2.6	Rohbauarbeiten	Mo, 24.11.25	Fr, 20.11.26
29.2.7	Gerüst Aufbau	Mo, 27.04.26	Fr, 08.05.26
29.2.8	Gerüst Abbau	Mo, 14.06.27	Fr, 25.06.27
29.2.9	Dacharbeiten - Abdichtung Bodenplatte	Mo, 02.11.26	Fr, 20.11.26
29.2.10	Dacharbeiten - Abdichtung	Mo, 23.11.26	Fr, 22.01.27
29.2.11	Dacharbeiten - Gründach	Mo, 25.01.27	Fr, 02.04.27
29.2.12	Aufmaß, Lieferzeit Rafflstore-Anlagen	Mo, 28.09.26	Fr, 20.11.26
29.2.13	Einbau Rafflstore-Kästen	Mo, 23.11.26	Fr, 18.12.26
29.2.14	Einbau Rafflstore-Behänge	Mo, 24.05.27	Fr, 11.06.27
29.2.15	Aufmaß, Lieferzeit Fenster & Außentüren	Mo, 19.10.26	Fr, 22.01.27
29.2.16	Einbau Fenster & Außentüren	Mo, 25.01.27	Fr, 19.02.27
29.2.17	Klinkerarbeiten	Mo, 11.01.27	Fr, 21.05.27
29.2.18	Trockenbauarbeiten - LK vor TGA	Mo, 22.02.27	Fr, 05.03.27
29.2.19	Trockenbauarbeiten - Schließen Wände	Mo, 14.06.27	Fr, 02.07.27
29.2.20	Trockenbauarbeiten - Einrichtung Flure	Mo, 02.08.27	Fr, 27.08.27
29.2.21	Trockenbauarbeiten - Abhangdecke	Mo, 02.08.27	Fr, 27.08.27
29.2.22	TGA Rohinstallation	Mo, 08.03.27	Fr, 11.06.27
29.2.23	TGA Feininstallation	Mo, 20.09.27	Fr, 05.11.27
29.2.24	Innenputzarbeiten	Mo, 14.06.27	Fr, 02.07.27
29.2.25	Estricharbeiten + Trocknungszeit	Mo, 05.07.27	Fr, 30.07.27
29.2.26	Fliesen- und Plattenarbeiten	Mo, 23.08.27	Fr, 17.09.27
29.2.27	Innentüren - Aufmaß und Lieferzeit	Mo, 24.05.27	Fr, 30.07.27
29.2.28	Innentüren - Einbau Türzargen	Mo, 02.08.27	Fr, 20.08.27
29.2.29	Innentüren - Einbau Türblätter	Mo, 27.09.27	Fr, 08.10.27
29.2.30	Malerarbeiten	Mo, 06.09.27	Fr, 08.10.27
29.2.31	Bodenbelagarbeiten	Mo, 06.09.27	Fr, 08.10.27
29.2.32	Bodenbeschichtung	Mo, 27.09.27	Fr, 08.10.27
29.2.33	Schließanlage	Mo, 11.10.27	Fr, 22.10.27
29.2.34	Bauendreinigung	Mo, 11.10.27	Fr, 22.10.27
29.2.35	Einrichtung	Mo, 11.10.27	Fr, 05.11.27
29.2.36	Abnahmen & Inbetriebnahme	Mo, 11.10.27	Fr, 05.11.27
29.2.37	Baufertigstellung Neubau	Mo, 08.11.27	Mo, 08.11.27
29.3	Bauausführung Umbau im Bestand	Mo, 08.11.27	Fr, 12.05.28
29.3.1	Baubeginn Umbau im Bestand	Mo, 08.11.27	Mo, 08.11.27
29.3.2	LPH 8 Umbau Bestand	Mo, 08.11.27	Fr, 12.05.28
29.3.3	Abnahmen Bestand	Mo, 10.04.28	Fr, 12.05.28
29.3.4	Baufertigstellung Umbau im Bestand	Fr, 12.05.28	Fr, 12.05.28
29.4	Außenanlagen	Mo, 19.04.27	Fr, 12.05.28
29.4.1	Ausführung Außenanlagen Neubau	Mo, 19.04.27	Fr, 22.10.27
29.4.2	Ausführung Außenanlagen Bestand	Mo, 31.01.28	Fr, 12.05.28
