20079 Ringschluss

Balkenplanansicht

16.07.2026

Nr.	Bezeichnung	Start	Dauer	Ende
1	**Bauablauf**	**07.10.2026**	**490t**	**22.08.2028**
2	**Ringschluss**	**07.10.2026**	**452t**	**18.08.2028**
3	Auftragserteilung Rohbau	07.10.2026		07.10.2026
4	**Rohbauarbeiten**	**21.10.2026**	**158t**	**22.06.2027**
5	Baustelleneinrichtung	21.10.2026	5t	27.10.2026
6	Grundleitungsarbeiten	21.10.2026	50t	14.01.2027
7	Verbau einschl. Kampfmittelsondierungen	04.11.2026	25t	08.12.2026
8	Erdarbeiten	25.11.2026	25t	14.01.2027
9	Gründung + Grundleitungen (im Gebäudebereich)	15.01.2027	30t	25.02.2027
10	Herstellung KG (Beton + MW)	26.02.2027	18t	23.03.2027
11	Herstellung EG (Beton + MW)	24.03.2027	18t	20.04.2027
12	Herstellung 1. OG (Beton + MW)	20.04.2027	18t	14.05.2027
13	Herstellung 2. OG (Beton + MW)	18.05.2027	18t	11.06.2027
14	Attika	14.06.2027	7t	22.06.2027
15	Fertigstellung Rohbau	23.06.2027		23.06.2027
16	Abdichtung Fenster EG	28.07.2027	5t	03.08.2027
17	Herstellung Verblendung	04.08.2027	30t	14.09.2027
18	Gerüst	14.04.2027	191t	27.01.2028
19	**Fenster**	**03.03.2027**	**145t**	**28.09.2027**
20	WMP Fenster	03.03.2027	30t	15.04.2027
21	Freigabe WMP Fenster	16.04.2027	10t	29.04.2027
22	Produktion Fenster	30.04.2027	40t	29.06.2027
23	Montage Fenster	30.06.2027	30t	10.08.2027
24	Montage Fensterbänke + Fensterbleche	15.09.2027	10t	28.09.2027
25	Dachdichtung	23.06.2027	40t	17.08.2027
26	Attika: Abdichtung + Abdeckung	29.09.2027	10t	12.10.2027
27	Dachbegrünung	13.10.2027	10t	26.10.2027
28	Abdichtung Bodenplatte	05.07.2027	8t	14.07.2027
29	Blitzschutz	02.12.2027	10t	15.12.2027
30	Freigabe Wände schließen	23.09.2027		23.09.2027
31	Freigabe Abhangdecken schließen	29.11.2027		29.11.2027
32	**Trockenbau**	**15.07.2027**	**145t**	**21.02.2028**
33	Grundmontage Wände + Vorsatzschalen	15.07.2027	15t	04.08.2027
34	Beplanken + Verspachteln Wände + Vorsatzs.	23.09.2027	21t	21.10.2027
35	Abhangdecken - Sanitär	29.11.2027	20t	11.01.2028
36	Abhangdecken - UK Klassenräume	29.11.2027	25t	18.01.2028
37	Abhangdecken - Beplankung Klassenräume	19.01.2028	20t	15.02.2028
38	Abhangdecken - Flure	25.01.2028	20t	21.02.2028
39	**Heizung + Lüftung + Sanitär**	**05.08.2027**	**184t**	**10.05.2028**
40	Grobinstallation	05.08.2027	35t	22.09.2027
41	Feininstallation	03.04.2028	25t	10.05.2028
42	Lüftung Dacharbeiten	23.09.2027	30t	04.11.2027
43	Installationen Zentralen	23.09.2027	30t	04.11.2027
44	Montage Deckenstrahlplatten	15.11.2027	20t	10.12.2027
45	Montage Lüftungsauslässe Klassenräume	15.11.2027	20t	10.12.2027
46	**Elektro**	**05.08.2027**	**184t**	**10.05.2028**
47	Grobinstallation	05.08.2027	35t	22.09.2027
48	PV-Anlage	27.10.2027	25t	01.12.2027
49	Feininstallation	03.04.2028	25t	10.05.2028
50	**Aufzug**	**20.01.2027**	**240t**	**14.01.2028**
51	Lieferung Einbauteile Aufzug	20.01.2027	5t	26.01.2027
52	Aufmaß	21.07.2027	5t	27.07.2027
53	Einbau	16.12.2027	10t	14.01.2028
54	Innenputz	23.09.2027	30t	04.11.2027
55	Metallbau (Alutüren) WMP Alutüren	14.10.2027	20t	11.11.2027
56	Metallbau (Alutüren) - Freigabe	12.11.2027	10t	25.11.2027
57	Metallbau (Alutüren) - Produktion	26.11.2027	30t	24.01.2028
58	Metallbau (Alutüren) - Bodeneinstandsprofile	21.10.2027	5t	27.10.2027
59	Metallbau (Alutüren)	25.01.2028	10t	07.02.2028
60	Betrieb (Bau-) Heizung erforderlich	05.11.2027		05.11.2027
61	Estrich	05.11.2027	25t	09.12.2027
62	Herstellung Verblendung	03.12.2027	25t	24.01.2028
63	**Innentüren**	**18.01.2028**	**80t**	**11.05.2028**
64	Aufmaß	18.01.2028	2t	19.01.2028
65	Zargen	02.03.2028	5t	08.03.2028
66	Türblätter	05.05.2028	5t	11.05.2028
67	Schlosser Dachgeländer - Konsolen	30.06.2027	12t	15.07.2027
68	Schlosser Dachgeländer - Geländermontage	13.10.2027	15t	03.11.2027
69	Schlosser	07.09.2027	22t	10.01.2028
70	Werkstein	22.02.2028	25t	27.03.2028
71	Fliesen	05.01.2028	35t	22.02.2028
72	Belegreife Boden	10.01.2028		10.01.2028
73	Bodenbelag	14.03.2028	25t	19.04.2028
74	Malerarbeiten Technikbereiche	15.07.2027	20t	11.08.2027
75	Malerarbeiten	15.02.2028	45t	23.05.2028
76	Raumausstattung (u.a. Blendschutz)	18.04.2028	20t	16.05.2028
77	Tischlerarbeiten	13.03.2028	45t	17.05.2028
78	WC-Trennwände	22.03.2028	5t	28.03.2028
79	Baureinigung	22.05.2028	5t	29.05.2028
80	Bauendreinigung	05.07.2028	10t	18.07.2028
81	Schlussabnahmen	11.05.2028	20t	09.06.2028
82	Restarbeiten + Mängelbeseitigung	12.06.2028	21t	11.07.2028
83	Übergabe Bauherr	19.07.2028		19.07.2028
84	feste Einrichtung (Bauherr)	19.06.2028	20t	14.07.2028
85	Einzug Möbel (Bauherr)	19.07.2028	23t	18.08.2028
86	Außenanlagen	11.02.2028	120t	04.08.2028
87	Aufnahme Schulbetrieb möglich	21.08.2028		21.08.2028
88	Vorableistungen Rohbau BT E	19.07.2027	32t	31.08.2027
89	Sommerferien 2028	10.07.2028	32t	22.08.2028

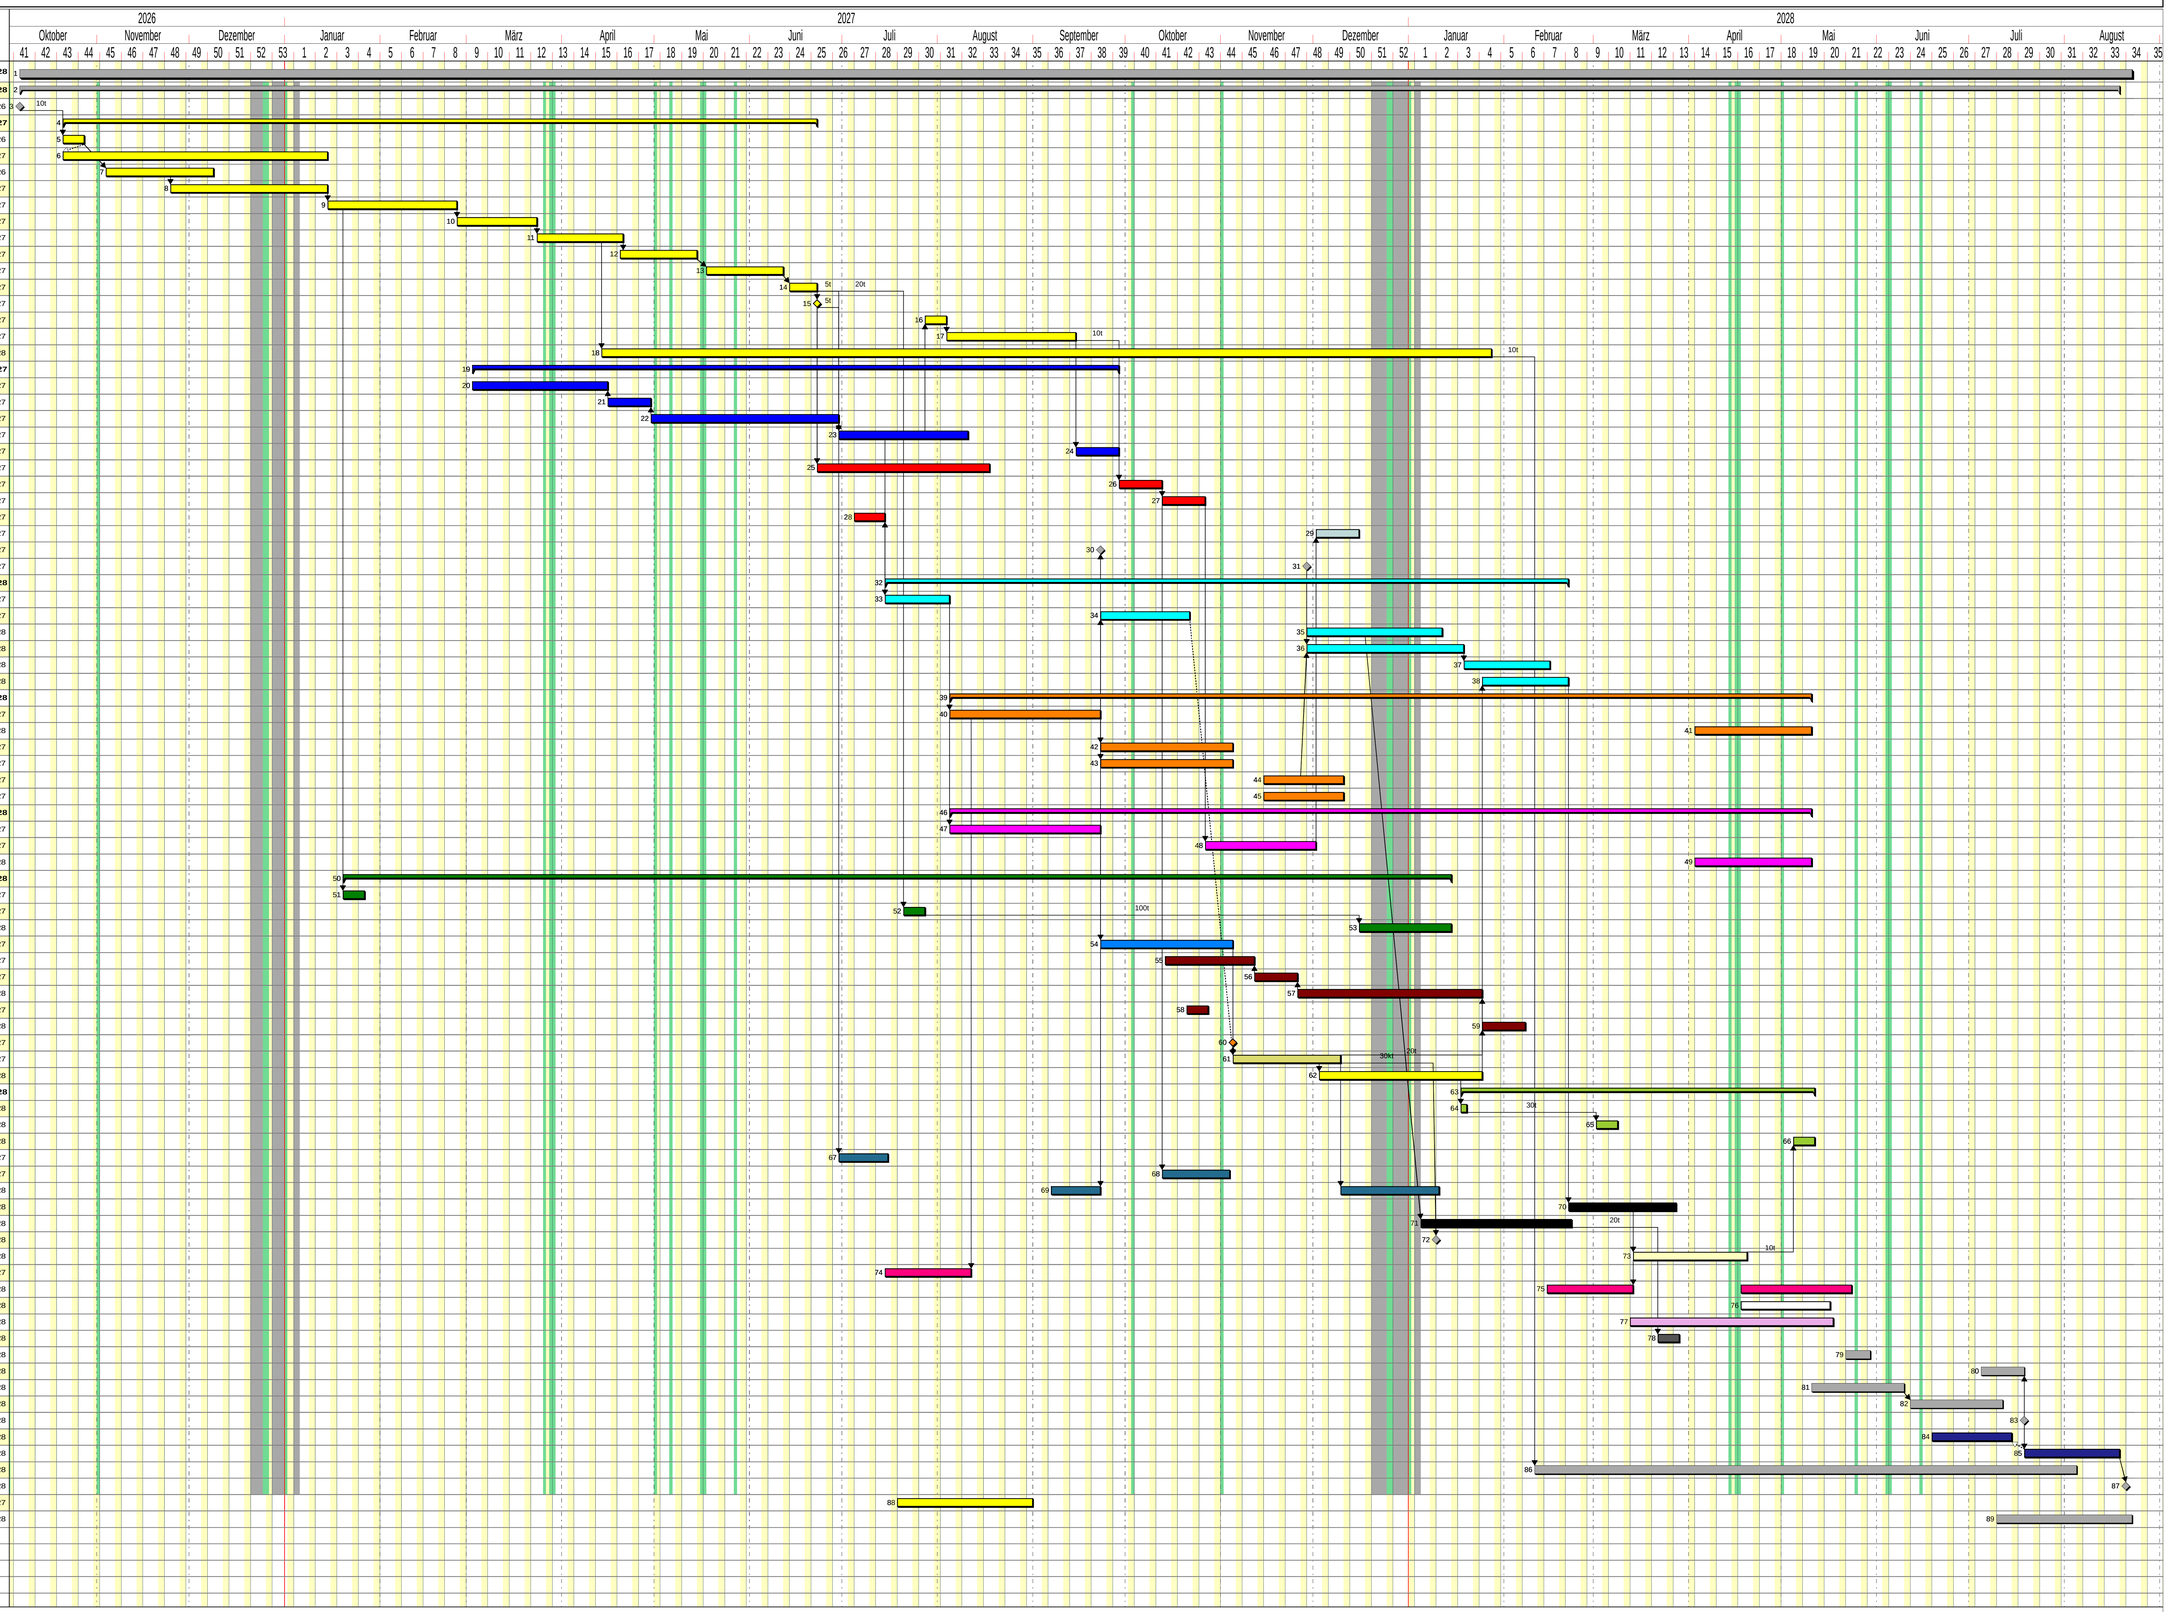

Firmen

Rohbau, Fenster, Dachdichtung, Blitzschutz, Trockenbau, HLS, Elektro, Aufzug, Innenputz, Metallbau Alu-Türen, Estrich, Innentüren, Schlosser, Fliesen, Bodenbelag, Malerarbeiten, Raumaustattung, Tischlerarbeiten, WC-Trennwände, Einrichtung

Meilenstein Formen

Raute
