Nr.	Vorgangsmodus	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger	Ressourcennamen
1		**Planungsphase**	**195 Tage**	**Mon 19.01.26**	**Fre 16.10.26**			
2		**Planung Aufbereitungsanlage 10 m³**	**135 Tage**	**Mon 19.01.26**	**Fre 24.07.26**			
3		Planung Aufbereitungsanlage	2 Monate	Mon 19.01.26	Fre 13.03.26			atd
4		Besprechung (auf Essener Tagung)	0 Tage	Don 05.03.26	Don 05.03.26			atd;WBD
5		Übergabe LV, R&I, ... mit 40"-Container, ...	0 Tage	Fre 13.03.26	Fre 13.03.26			atd
6		Videokonferenz	0 Tage	Mit 25.03.26	Mit 25.03.26		7	atd;WBD
7		Einarbeitung Anmerkungen und Änderungen	7 Tage	Mit 25.03.26	Don 02.04.26	6	8	atd
8		Übergabe überarb. LV, R&I, ... mit 30"-Container, ...	0 Tage	Don 02.04.26	Don 02.04.26	7		atd
9		Aufforderung zur Erstellung der Bauantragsunterlagen (Baubeschreibung, Lageplan, ...)	0 Tage	Die 21.04.26	Die 21.04.26		10	WBD
10		Erstellen Bauantragsunterlagen	4 Tage	Die 21.04.26	Fre 24.04.26	9	11	atd
11		Übergabe Bauantragsunterlagen an WBD	0 Tage	Fre 24.04.26	Fre 24.04.26	10		atd
12		Rückmeldung, Anmerkungen zum LV	0 Tage	Mit 06.05.26	Mit 06.05.26			WBD
13		Rückmeldung, Anmerkungen zum LV	0 Tage	Fre 08.05.26	Fre 08.05.26			WBD
14		Übergabe überarb. LV, R&I, ... mit 30"-Container, ...	0 Tage	Mon 18.05.26	Mon 18.05.26		15	atd
15		Zusammenstellung Vergabeunterlagen	10 Tage	Mon 18.05.26	Fre 29.05.26	14	16	WBD
16		Anfrage Aufbereitungsanlage	1 Monat	Mon 01.06.26	Fre 26.06.26	15	17;19	WBD
17		Beauftragung Aufbereitungsanlage	1 Monat	Mon 29.06.26	Fre 24.07.26	16	24	WBD
18		**Planung Bau- M-, E-Technik (Peripherie)**	**80 Tage**	**Mon 29.06.26**	**Fre 16.10.26**			
19		Planung Bautechnik + Peripherie	2 Monate	Mon 29.06.26	Fre 21.08.26	16	20	atd
20		Anfrage / Nachtrag	1 Monat	Mon 24.08.26	Fre 18.09.26	19;25	21	WBD
21		Beauftragung	1 Monat	Mon 21.09.26	Fre 16.10.26	20	34;41;44	WBD
22		**Ausführungsphase**	**170 Tage**	**Mon 27.07.26**	**Fre 19.03.27**			
23		**Aufbereitungsanlage 10 m³**	**170 Tage**	**Mon 27.07.26**	**Fre 19.03.27**			
24		Bestellung / Beauftragung	0 Tage	Mon 27.07.26	Mon 27.07.26	17	25	
25		Werkplanung	1 Monat	Mon 27.07.26	Fre 21.08.26	24	26;20;44	
26		Fertigung / Lieferzeit	6 Monate	Mon 24.08.26	Fre 05.02.27	25	27;45	
27		Anlieferung / Aufstellung	0 Tage	Mon 08.02.27	Mon 08.02.27	26	28	
28		Montagearbeiten	10 Tage	Mon 08.02.27	Fre 19.02.27	27	29	
29		Inbetriebnahme	5 Tage	Mon 22.02.27	Fre 26.02.27	28	30	
30		Probebetrieb	15 Tage	Mon 01.03.27	Fre 19.03.27	29	31	
31		Betriebsbereitschaft	0 Tage	Fre 19.03.27	Fre 19.03.27	30		
32		**Ausführung Bau- M-, E-Technik (Peripherie)**	**90 Tage**	**Fre 16.10.26**	**Fre 19.02.27**			
33		**Bautechnik**	**65 Tage**	**Fre 16.10.26**	**Fre 15.01.27**			
34		Beauftragung	0 Tage	Fre 16.10.26	Fre 16.10.26	21	35	
35		Werkplanung, Fertigung Fertigteilschächte	1,5 Monate	Mon 19.10.26	Fre 27.11.26	34	36	
36		Erdarbeiten	5 Tage	Mon 30.11.26	Fre 04.12.26	35	37;38	
37		Fundamentierung Aufbereitungsanlage	10 Tage	Mon 07.12.26	Fre 18.12.26	36		
38		Entnahmeschacht, Abgabeschacht	20 Tage	Mon 07.12.26	Fre 01.01.27	36	39;42	
39		erdverlegte Rohrleitungen	10 Tage	Mon 04.01.27	Fre 15.01.27	38		
40		**M-Technik**	**70 Tage**	**Mon 19.10.26**	**Fre 22.01.27**			
41		Werkplanung und Bestellung	3 Monate	Mon 19.10.26	Fre 08.01.27	21	42;44AA+ Tage	
42		Montage	10 Tage	Mon 11.01.27	Fre 22.01.27	41;38		
43		**E-Technik**	**80 Tage**	**Mon 02.11.26**	**Fre 19.02.27**			
44		Projektierung	1 Monat	Mon 02.11.26	Fre 27.11.26	21;25;41A	45	
45		Montagen und Anschluss	10 Tage	Mon 08.02.27	Fre 19.02.27	44;26		

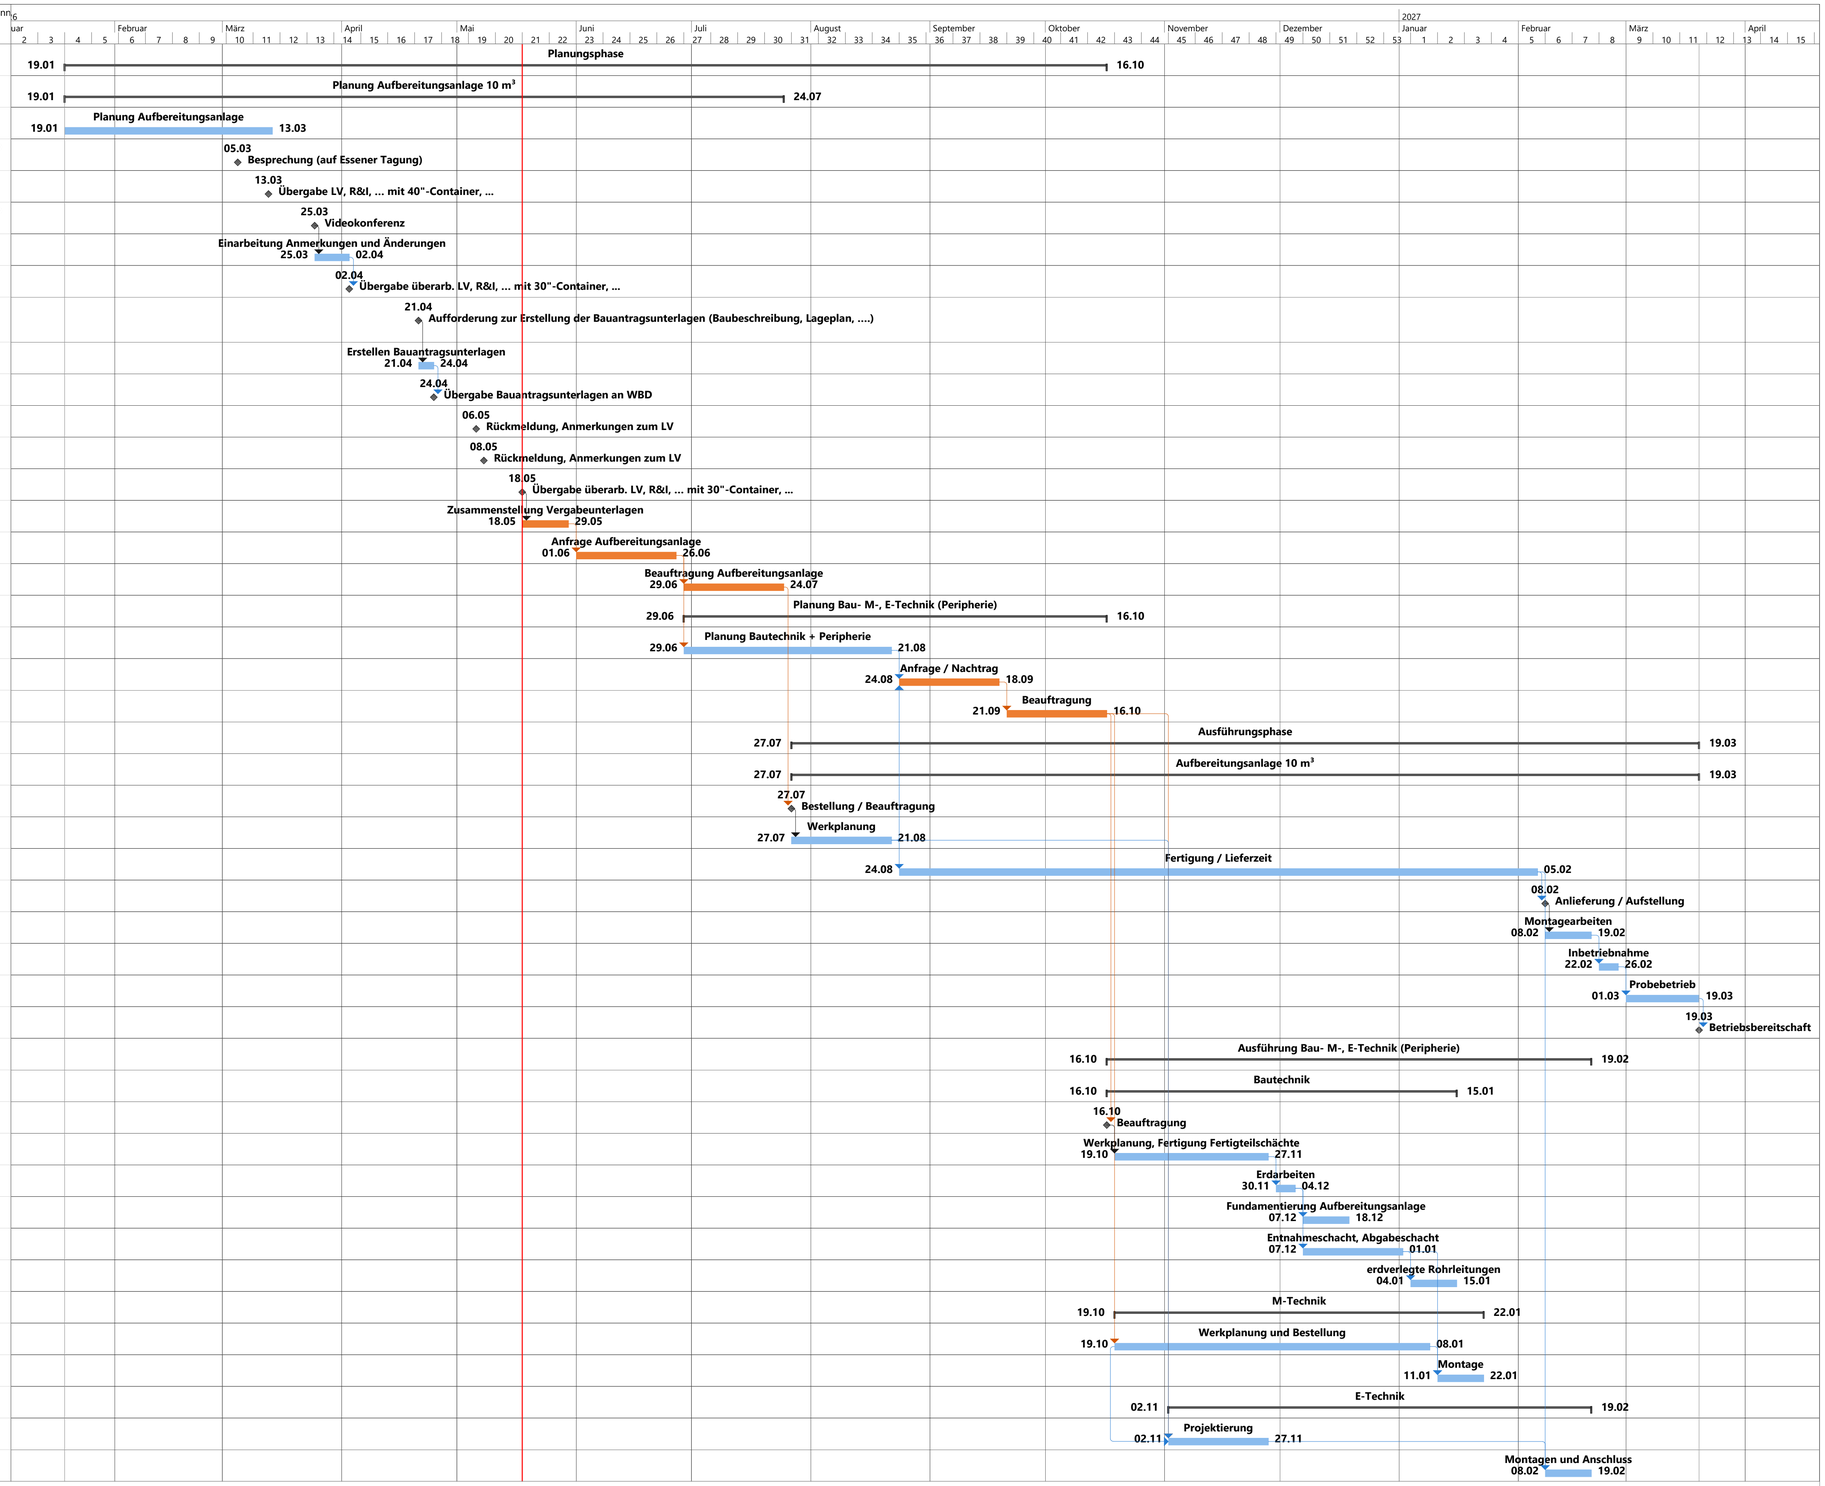

Projekt: Terminplanung
Datum: Mon 18.05.26

Vorgang | Meilenstein | Projektsammelvorgang | Inaktiver Meilenstein | Manueller Vorgang | Manueller Sammelrollup | Nur Anfang | Externe Vorgänge | Stichtag | Manueller Fortschritt
Unterbrechung | Sammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Sammelvorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorgang | Nur Ende | Externer Meilenstein | In Arbeit
