Zeitschine

KW / Datum
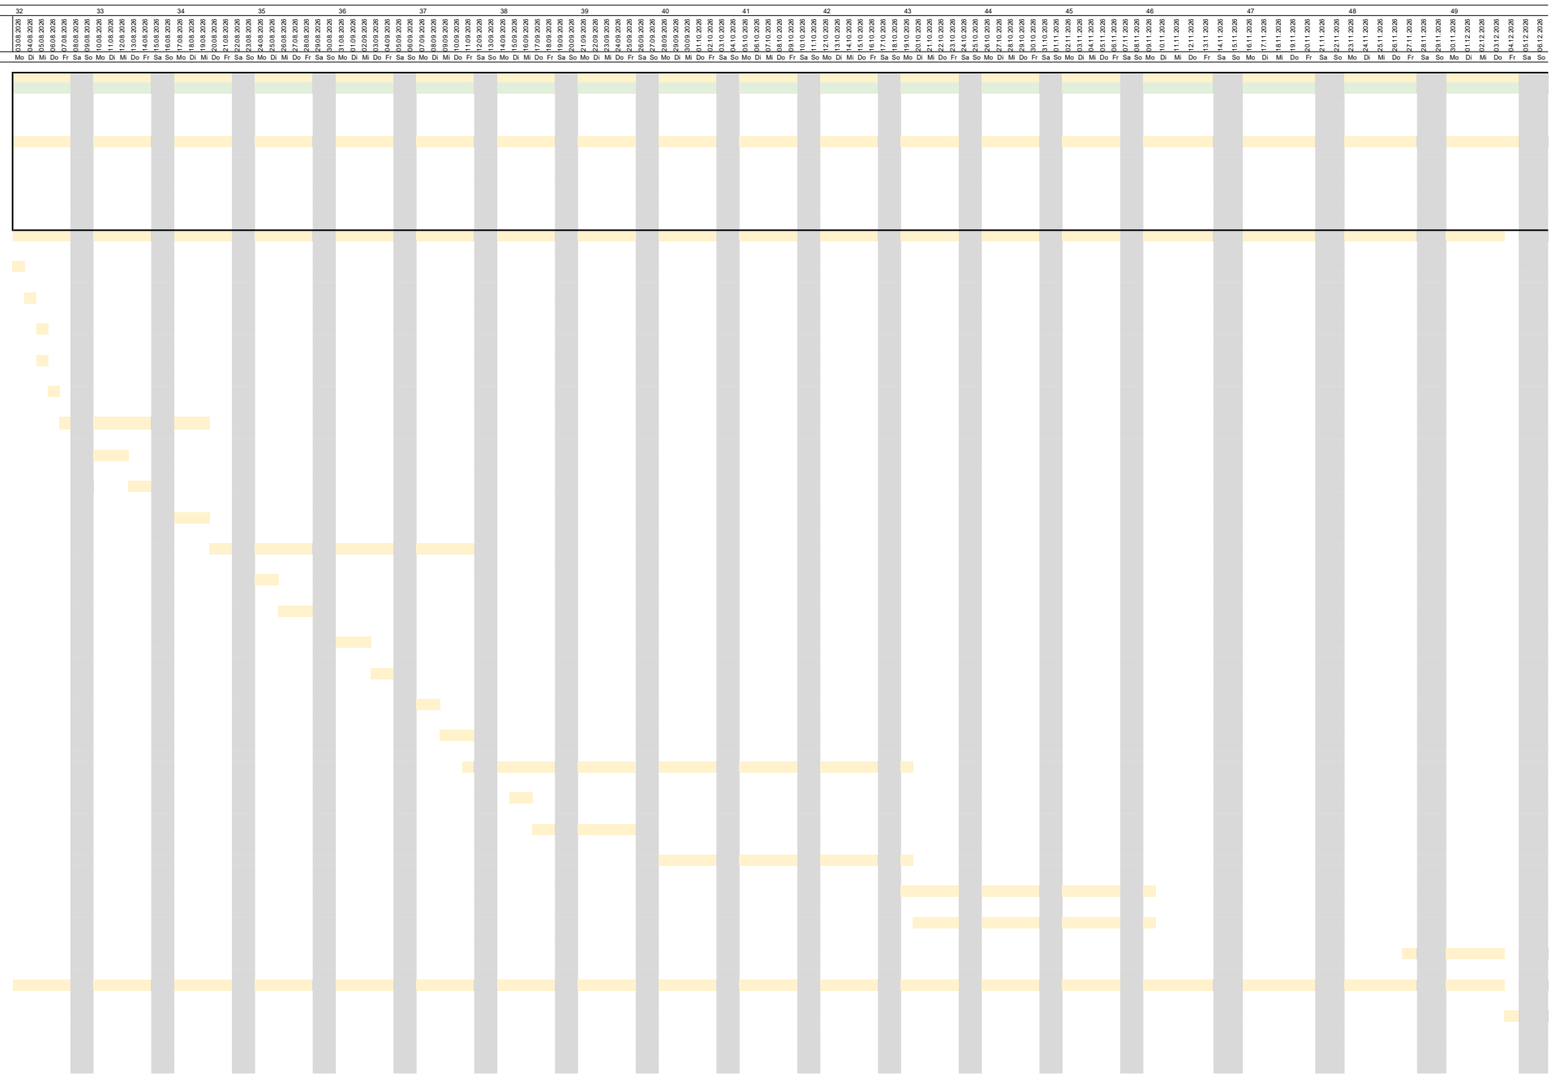
Tag	x Abhängigkeiten filtern	Fi	Beteiligte	BV Kalkweg - Gewerke	Angaben	vom	Tage	bis	Abhängig zu Fi	Stand	Massen	
1			gep. Bauablauf	Auftragnehmer	Gesamtmaßnahme	03.08.2026	90	04.12.2026			90	Tage
			geä. Bauablauf	Auftraggeber	Gesamtmaßnahme	Neue Bauzeit	03.08.2026	90	04.12.2026			0,00
			tats. Bauablauf	Auftragnehmer	Gesamtmaßnahme		03.08.2026		27.04.2026			
2			gep. Bauablauf	Auftraggeber	Aufbruchgenehmigung (vom = Nr.1)		03.08.2026				0	Tage
												0,00
3			gep. Bauablauf	Auftragnehmer	Baukosten		03.08.2026	90	04.12.2026			0,00 €
			geä. Bauablauf	Auftraggeber	Baukosten	- €						0,00
			tats. Bauablauf	Auftragnehmer	Baukosten		03.08.2026	0	03.08.2026			
4				Auftraggeber	Verzug AG	Tage addiert	03.08.2026	0			1,00	Tage
												0,00
5				Auftragnehmer	Verzug AN	Tage addiert	03.08.2026	0			1,00	Tage
												0,00
6			gep. Bauablauf	Auftraggeber	Gesamtmaßnahme		03.08.2026	89	03.12.2026			
												0,00
7			gep. Bauablauf	Auftraggeber	Verkehrssicherung einrichten		03.08.2026	1	03.08.2026			
												0,00
8			gep. Bauablauf		Baufeldfreimachung		04.08.2026	1	04.08.2026			
												0,00
9			gep. Bauablauf		Baustelleneinrichtung aufstellen		05.08.2026	1	05.08.2026			
												0,00
10			gep. Bauablauf		Sonstiges	Vermessungsarbeiten	05.08.2026	1	05.08.2026			
												0,00
11			gep. Bauablauf		Sonstiges	Böschungsabeiten	06.08.2026	1	06.08.2026			
												0,00
12			gep. Bauablauf		Grundwasserabsenkung	Teil 1	07.08.2026	9	19.08.2026			
												0,00
13			gep. Bauablauf		Erdbau Baugrube	010	10.08.2026	3	12.08.2026			
												0,00
14			gep. Bauablauf		Bauwerk abbrechen	008 Erschwerniss	13.08.2026	2	14.08.2026			
												0,00
15			gep. Bauablauf		Bauwerk setzen	010	17.08.2026	3	19.08.2026			
												0,00
16			gep. Bauablauf		Grundwasserabsenkung	Teil 2	20.08.2026	17	11.09.2026			
												0,00
17			gep. Bauablauf		Haltung	010-011	24.08.2026	2	25.08.2026			
												0,00
18			gep. Bauablauf		Erdbau Baugrube	011-012	26.08.2026	3	28.08.2026			
												0,00
19			gep. Bauablauf		Haltung	011-012 SedPipe	31.08.2026	3	02.09.2026			
												0,00
20			gep. Bauablauf		Haltung	012-013	03.09.2026	2	04.09.2026			
												0,00
21			gep. Bauablauf		Erdbau Baugrube	013	07.09.2026	2	08.09.2026			
												0,00
22			gep. Bauablauf		Bauwerk setzen	013	09.09.2026	3	11.09.2026			
												0,00
23			gep. Bauablauf		Grundwasserabsenkung	Teil 3 / 1. Abschnitt	11.09.2026	27	19.10.2026			
												0,00
24			gep. Bauablauf		Haltung	010-009	15.09.2026	2	16.09.2026			
												0,00
25			gep. Bauablauf		Bauwerk setzen	009-008-007	17.09.2026	7	25.09.2026			
												0,00
26			gep. Bauablauf		Haltung	Sedipipe 24	28.09.2026	16	19.10.2026			
												0,00
27			gep. Bauablauf		Grundwasserabsenkung	Teil 3 / 2. Abschnitt	19.10.2026	16	09.11.2026			
												0,00
28			gep. Bauablauf		Bauwerk setzen	003-004-005-006	20.10.2026	15	09.11.2026			
												0,00
29			gep. Bauablauf		Straßenbau		27.11.2026	5	03.12.2026			
												0,00
30			gep. Bauablauf		Sonstiges	Treppenanlage	03.08.2026	89	03.12.2026			
												0,00
31			gep. Bauablauf		Baustelleneinrichtung räumen		04.12.2026	1	04.12.2026			
												0,00
32			gep. Bauablauf									
												0,00
