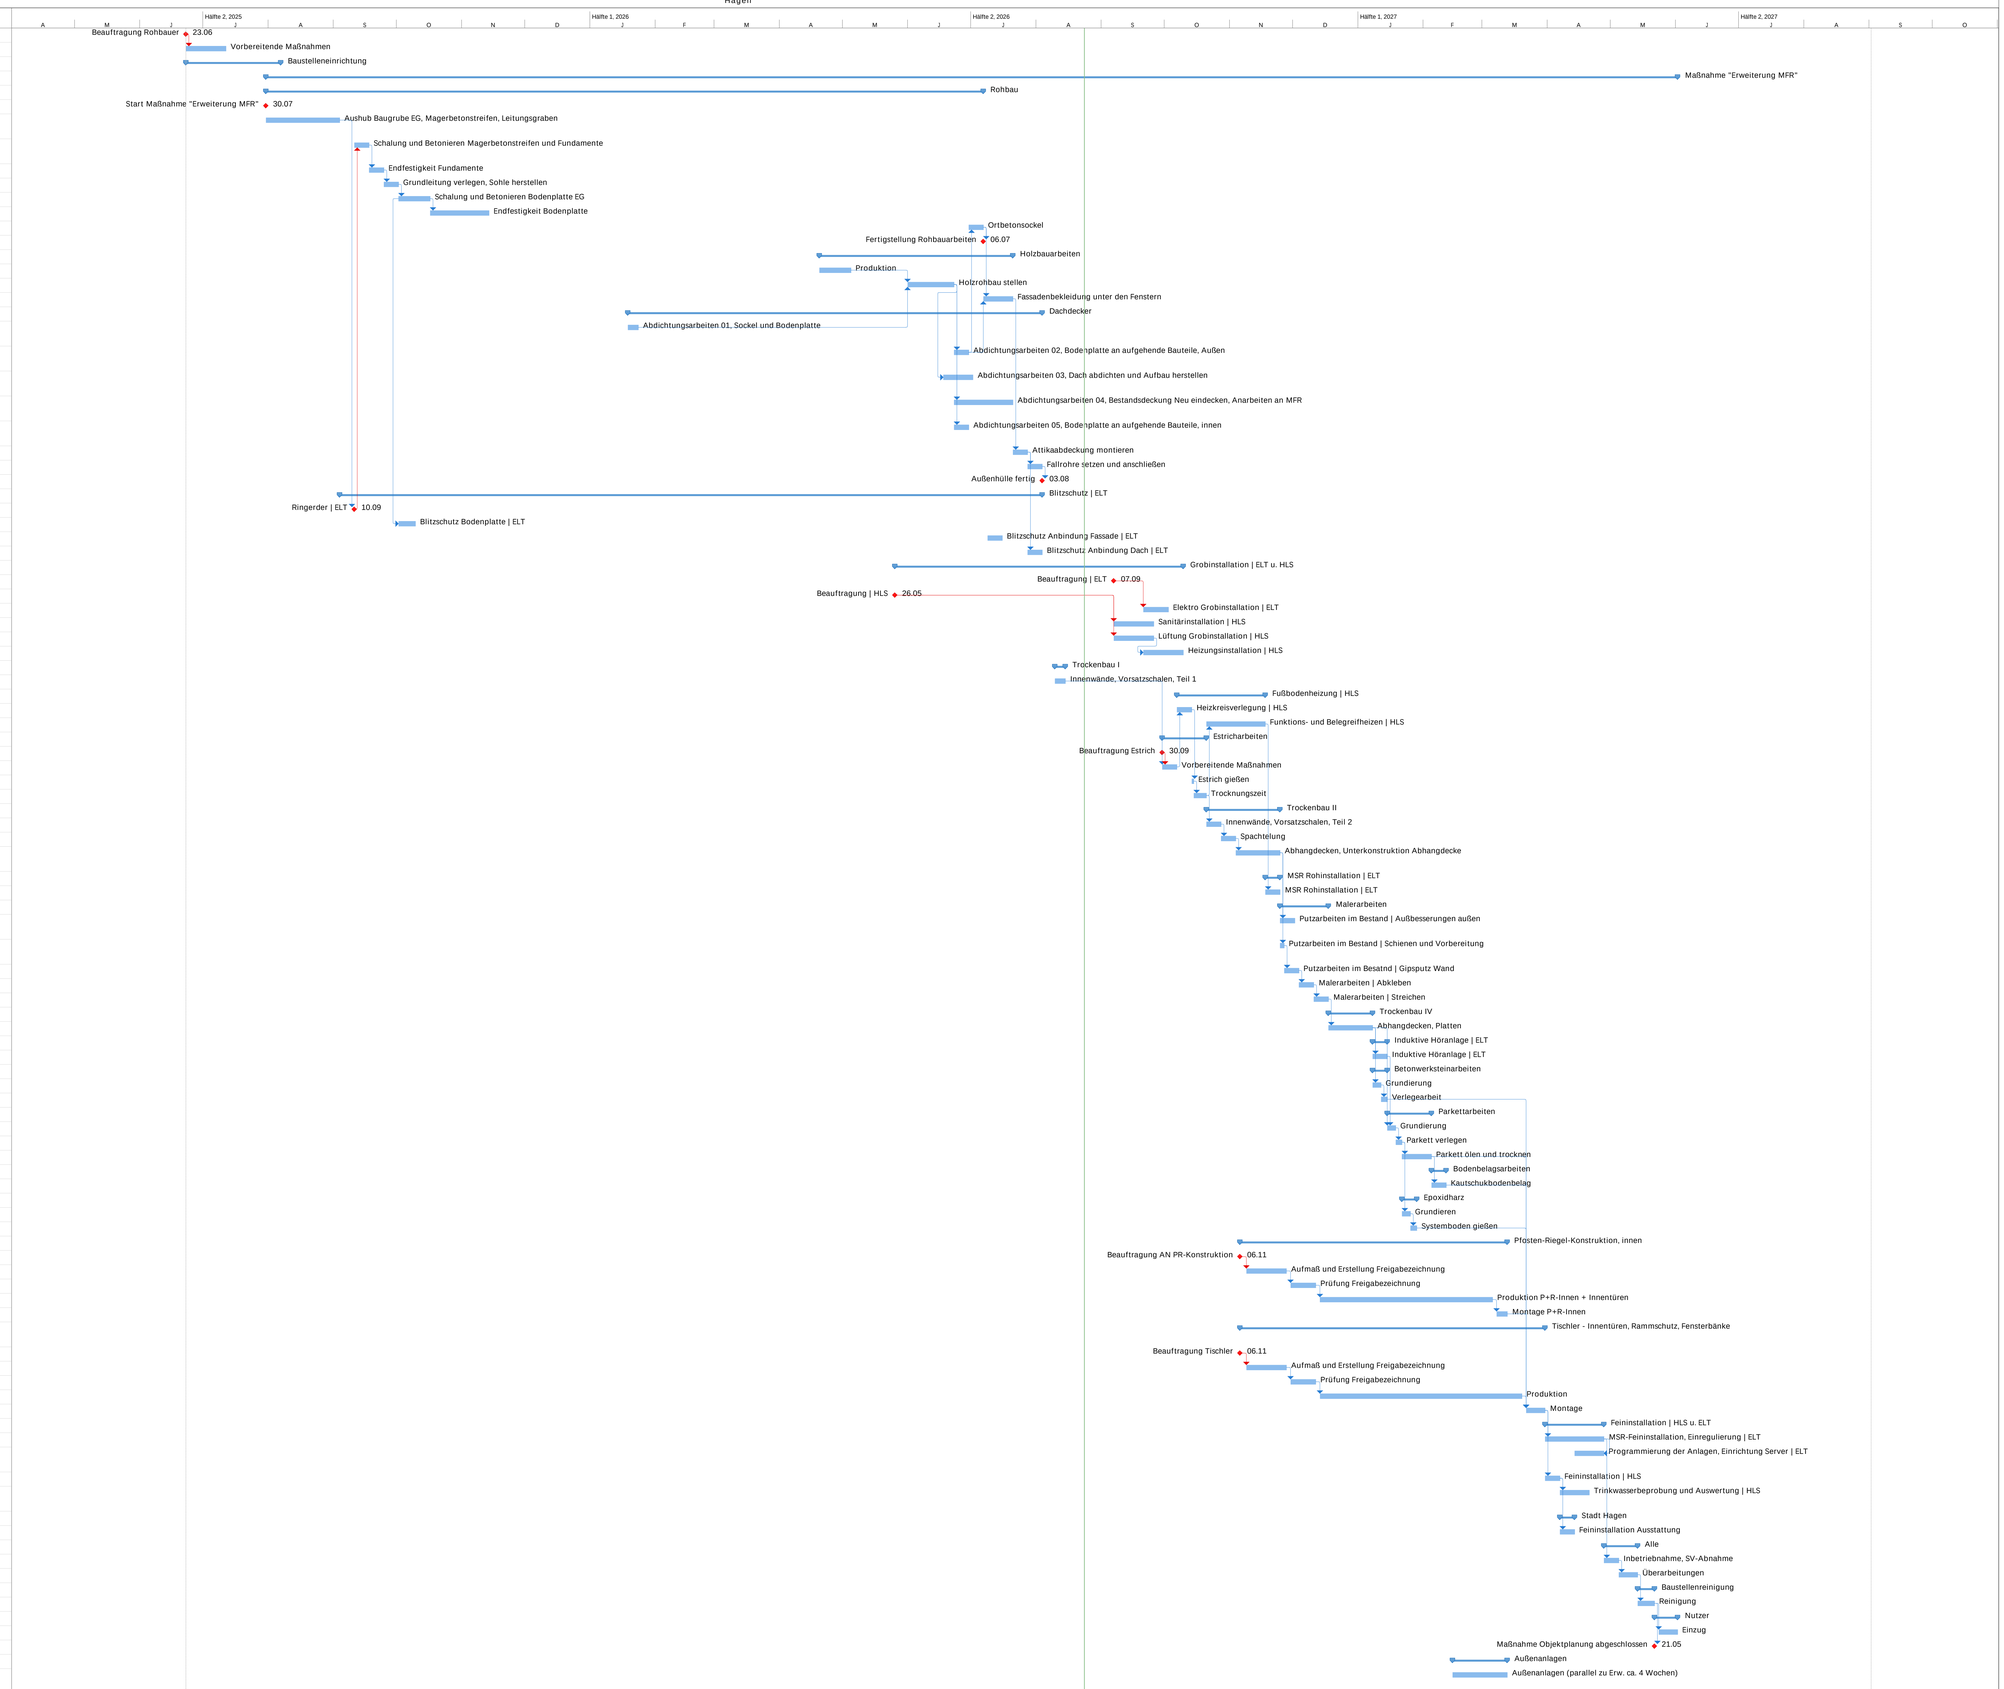Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1	Beauftragung Rohbauer	0 d	Mon 23.06.25	Mon 23.06.25	
2	Vorbereitende Maßnahmen	15 d	Mon 23.06.25	Fre 11.07.25	1
3	Baustelleneinrichtung	33 d	Mon 23.06.25	Mit 06.08.25	
8	Maßnahme "Erweiterung MFR"	444 d	Mit 30.07.25	Die 01.06.27	5
9	Rohbau	225 d	Mit 30.07.25	Mon 06.07.26	
10	Start Maßnahme "Erweiterung MFR"	0 d	Mit 30.07.25	Mit 30.07.25	4
11	Aushub Baugrube EG, Magerbetonstreifen, Leitungsgraben	25 d	Don 31.07.25	Mit 03.09.25	
12	Schalung und Betonieren Magerbetonstreifen und Fundamente	5 d	Don 11.09.25	Mit 17.09.25	33
13	Endfestigkeit Fundamente	5 d	Don 18.09.25	Mit 24.09.25	12
14	Grundleitung verlegen, Sohle herstellen	5 d	Don 25.09.25	Mit 01.10.25	13
15	Schalung und Betonieren Bodenplatte EG	10 d	Don 02.10.25	Don 16.10.25	14
16	Endfestigkeit Bodenplatte	20 d	Fre 17.10.25	Don 13.11.25	15
17	Ortbetonsockel	5 d	Die 30.06.26	Mon 06.07.26	25
18	Fertigstellung Rohbauarbeiten	0 d	Mon 06.07.26	Mon 06.07.26	17
19	Holzbauarbeiten	61 d	Mon 20.04.26	Mon 20.07.26	
20	Produktion	10 d	Mon 20.04.26	Mon 04.05.26	
21	Holzrohbau stellen	15 d	Mon 01.06.26	Mon 22.06.26	20;24
22	Fassadenbekleidung unter den Fenstern	10 d	Die 07.07.26	Mon 20.07.26	25;17
23	Dachdecker	134 d	Mon 19.01.26	Mon 03.08.26	
24	Abdichtungsarbeiten 01, Sockel und Bodenplatte	5 d	Mon 19.01.26	Fre 23.01.26	
25	Abdichtungsarbeiten 02, Bodenplatte an aufgehende Bauteile, Außen	5 d	Die 23.06.26	Mon 29.06.26	21
26	Abdichtungsarbeiten 03, Dach abdichten und Aufbau herstellen	10 d	Don 18.06.26	Mit 01.07.26	21EA-3 d
27	Abdichtungsarbeiten 04, Bestandsdeckung Neu eindecken, Anarbeiten an MFR	20 d	Die 23.06.26	Mon 20.07.26	21
28	Abdichtungsarbeiten 05, Bodenplatte an aufgehende Bauteile, innen	5 d	Die 23.06.26	Mon 29.06.26	21
29	Attikaabdeckung montieren	5 d	Die 21.07.26	Mon 27.07.26	22
30	Fallrohre setzen und anschließen	5 d	Die 28.07.26	Mon 03.08.26	29
31	Außenhülle fertig	0 d	Mon 03.08.26	Mon 03.08.26	30
32	Blitzschutz | ELT	220 d	Don 04.09.25	Mon 03.08.26	
33	Ringerder | ELT	5 d	Don 04.09.25	Mit 10.09.25	11
34	Blitzschutz Bodenplatte | ELT	5 d	Don 02.10.25	Don 09.10.25	15AA
35	Blitzschutz Anbindung Fassade | ELT	5 d	Don 09.07.26	Mit 15.07.26	
36	Blitzschutz Anbindung Dach | ELT	5 d	Die 28.07.26	Mon 03.08.26	29
37	Grobinstallation | ELT u. HLS	98 d	Die 26.05.26	Fre 09.10.26	
38	Beauftragung | ELT	0 d	Mon 07.09.26	Mon 07.09.26	
39	Beauftragung | HLS	0 d	Die 26.05.26	Die 26.05.26	
40	Elektro Grobinstallation | ELT	10 d	Mon 21.09.26	Fre 02.10.26	38
41	Sanitärinstallation | HLS	15 d	Mon 07.09.26	Fre 25.09.26	39EA+15 d
42	Lüftung Grobinstallation | HLS	15 d	Mon 07.09.26	Fre 25.09.26	39EA+15 d
43	Heizungsinstallation | HLS	15 d	Mon 21.09.26	Fre 09.10.26	42EA-5 d
44	Trockenbau I	5 d	Mon 10.08.26	Fre 14.08.26	
45	Innenwände, Vorsatzschalen, Teil 1	5 d	Mon 10.08.26	Fre 14.08.26	
46	Fußbodenheizung | HLS	30 d	Mit 07.10.26	Die 17.11.26	
47	Heizkreisverlegung | HLS	5 d	Mit 07.10.26	Die 13.10.26	51
48	Funktions- und Belegreifheizen | HLS	20 d	Mit 21.10.26	Die 17.11.26	53
49	Estricharbeiten	15 d	Mit 30.09.26	Die 20.10.26	
50	Beauftragung Estrich	0 d	Mit 30.09.26	Mit 30.09.26	
51	Vorbereitende Maßnahmen	5 d	Mit 30.09.26	Die 06.10.26	45;50
52	Estrich gießen	1 d	Mit 14.10.26	Mit 14.10.26	47
53	Trocknungszeit	4 d	Don 15.10.26	Die 20.10.26	52
54	Trockenbau II	25 d	Mit 21.10.26	Die 24.11.26	
55	Innenwände, Vorsatzschalen, Teil 2	5 d	Mit 21.10.26	Die 27.10.26	53
56	Spachtelung	5 d	Mit 28.10.26	Die 03.11.26	55
57	Abhangdecken, Unterkonstruktion Abhangdecke	15 d	Mit 04.11.26	Die 24.11.26	56
58	MSR Rohinstallation | ELT	5 d	Mit 18.11.26	Die 24.11.26	
59	MSR Rohinstallation | ELT	5 d	Mit 18.11.26	Die 24.11.26	48
60	Malerarbeiten	17 d	Mit 25.11.26	Don 17.12.26	
61	Putzarbeiten im Bestand | Außbesserungen außen	5 d	Mit 25.11.26	Die 01.12.26	57
62	Putzarbeiten im Bestand | Schienen und Vorbereitung	2 d	Mit 25.11.26	Don 26.11.26	57
63	Putzarbeiten im Besatnd | Gipsputz Wand	5 d	Fre 27.11.26	Don 03.12.26	62
64	Malerarbeiten | Abkleben	5 d	Fre 04.12.26	Don 10.12.26	63
65	Malerarbeiten | Streichen	5 d	Fre 11.12.26	Don 17.12.26	64
66	Trockenbau IV	5 d	Fre 18.12.26	Don 07.01.27	
67	Abhangdecken, Platten	5 d	Fre 18.12.26	Don 07.01.27	65
68	Induktive Höranlage | ELT	5 d	Fre 08.01.27	Don 14.01.27	
69	Induktive Höranlage | ELT	5 d	Fre 08.01.27	Don 14.01.27	67
70	Betonwerksteinarbeiten	5 d	Fre 08.01.27	Don 14.01.27	
71	Grundierung	2 d	Fre 08.01.27	Mon 11.01.27	67
72	Verlegearbeit	3 d	Die 12.01.27	Don 14.01.27	71
73	Parkettarbeiten	15 d	Fre 15.01.27	Don 04.02.27	
74	Grundierung	2 d	Fre 15.01.27	Mon 18.01.27	69;67
75	Parkett verlegen	3 d	Die 19.01.27	Don 21.01.27	74
76	Parkett ölen und trocknen	10 d	Fre 22.01.27	Don 04.02.27	75
77	Bodenbelagsarbeiten	5 d	Fre 05.02.27	Don 11.02.27	
78	Kautschukbodenbelag	5 d	Fre 05.02.27	Don 11.02.27	76
79	Epoxidharz	5 d	Fre 22.01.27	Don 28.01.27	
80	Grundieren	2 d	Fre 22.01.27	Mon 25.01.27	75
81	Systemboden gießen	3 d	Die 26.01.27	Don 28.01.27	80
82	Pfosten-Riegel-Konstruktion, innen	81 d	Fre 06.11.26	Fre 12.03.27	
83	Beauftragung AN PR-Konstruktion	0 d	Fre 06.11.26	Fre 06.11.26	
84	Aufmaß und Erstellung Freigabezeichnung	15 d	Mon 09.11.26	Fre 27.11.26	83EA+1 d
85	Prüfung Freigabezeichnung	10 d	Mon 30.11.26	Fre 11.12.26	84
86	Produktion P+R-Innen + Innentüren	50 d	Mon 14.12.26	Fre 05.03.27	85
87	Montage P+R-Innen	5 d	Mon 08.03.27	Fre 12.03.27	86
88	Tischler - Innentüren, Rammschutz, Fensterbänke	91 d	Fre 06.11.26	Die 30.03.27	
89	Beauftragung Tischler	0 d	Fre 06.11.26	Fre 06.11.26	
90	Aufmaß und Erstellung Freigabezeichnung	15 d	Mon 09.11.26	Fre 27.11.26	89EA+1 d
91	Prüfung Freigabezeichnung	10 d	Mon 30.11.26	Fre 11.12.26	90
92	Produktion	60 d	Mon 14.12.26	Fre 19.03.27	91
93	Montage	5 d	Mon 22.03.27	Die 30.03.27	72;78;76;81;87;92
94	Feininstallation | HLS u. ELT	20 d	Mit 31.03.27	Die 27.04.27	
95	MSR-Feininstallation, Einregulierung | ELT	20 d	Mit 31.03.27	Die 27.04.27	93
96	Programmierung der Anlagen, Einrichtung Server | ELT	10 d	Mit 14.04.27	Die 27.04.27	95EE
97	Feininstallation | HLS	5 d	Mit 31.03.27	Die 06.04.27	93
98	Trinkwasserbeprobung und Auswertung | HLS	10 d	Mit 07.04.27	Die 20.04.27	97
99	Stadt Hagen	5 d	Mit 07.04.27	Die 13.04.27	
100	Feininstallation Ausstattung	5 d	Mit 07.04.27	Die 13.04.27	97
101	Alle	10 d	Mit 28.04.27	Don 13.05.27	
102	Inbetriebnahme, SV-Abnahme	5 d	Mit 28.04.27	Die 04.05.27	95
103	Überarbeitungen	5 d	Mit 05.05.27	Don 13.05.27	102
104	Baustellenreinigung	5 d	Fre 14.05.27	Fre 21.05.27	
105	Reinigung	5 d	Fre 14.05.27	Fre 21.05.27	103
106	Nutzer	5 d	Fre 21.05.27	Die 01.06.27	
107	Einzug	5 d	Mon 24.05.27	Die 01.06.27	105
108	Maßnahme Objektplanung abgeschlossen	0 d	Fre 21.05.27	Fre 21.05.27	105
109	Außenanlagen	20 d	Mon 15.02.27	Fre 12.03.27	
110	Außenanlagen (parallel zu Erw. ca. 4 Wochen)	20 d	Mon 15.02.27	Fre 12.03.27	
111	Maßnahme "Erweiterung Neubau"	492 d	Fre 01.08.25	Die 10.08.27	5
321	Beginn Schuljahr 27/28	0 d	Mit 01.09.27	Mit 01.09.27
