
Nr.	Vorgangsn	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänge	Ressourcenna
1		**Werk- u. Montageplanung**	**81 Tage**	**Die 15.09.26**	**Die 05.01.27**		
11		**Ausschreibung u. Vergabe**	**45 Tage**	**Mit 04.11.26**	**Die 05.01.27**		
12		**Maler-Arbeiten**	**45 Tage**	**Mit 04.11.26**	**Die 05.01.27**		FA Maler
13		Ausschreibung Maler, Veröffentlichung beschränkt	0 Tage	Mit 04.11.26	Mit 04.11.26		FA Maler
14		Ausschreibung Maler, Vergabe	0 Tage	Die 05.01.27	Die 05.01.27	13EA+4 Tage	FA Maler
16		**Innenausbau EG**	**133 Tage**	**Fre 28.08.26**	**Die 02.03.27**		
20		**WC/Du Herren**	**91 Tage**	**Don 15.10.26**	**Don 18.02.27**		
24		FA Maler	1 Tag	Mit 06.01.27	Mit 06.01.27	22;23;1	FA Maler
33		**WC/Du Pers. H**	**92 Tage**	**Don 22.10.26**	**Fre 26.02.27**		
37		Malerarbeiten	1 Tag	Don 07.01.27	Don 07.01.27	35;36;1	FA Maler
46		**WC/Du Damen**	**80 Tage**	**Die 03.11.26**	**Mon 22.02.27**		
49		Malerarbeiten	1 Tag	Fre 08.01.27	Fre 08.01.27	37	FA Maler
58		**WC/Du Pers. D**	**87 Tage**	**Mon 26.10.26**	**Die 23.02.27**		
69		Malerarbeiten	1 Tag	Mon 11.01.27	Mon 11.01.27	68;49	FA Maler
76		**Umkleide Gäste**	**93 Tage**	**Don 15.10.26**	**Mon 22.02.27**		
81		Malerarbeiten	2 Tage	Die 12.01.27	Mit 13.01.27	78;79;6	FA Maler
88		**Pausenraum Pers.**	**90 Tage**	**Mit 28.10.26**	**Die 02.03.27**		
92		Malerarbeiten	1 Tag	Don 14.01.27	Don 14.01.27	91;81	FA Maler
132		**Tribüne**	**93 Tage?**	**Mon 05.10.26**	**Mit 10.02.27**		
133		**Sitzstufen**	**78 Tage?**	**Mon 05.10.26**	**Mit 20.01.27**		
142		Anarbeitung WDVS-Sockel Tribüne	10 Tage	Mit 06.01.27	Die 19.01.27	14;140	FA Maler
147		**Nebenräume**	**35 Tage?**	**Don 24.12.26**	**Mit 10.02.27**		
149		Malerarbeiten Lager Tribüne	20 Tage	Don 14.01.27	Mit 10.02.27	148	FA Maler

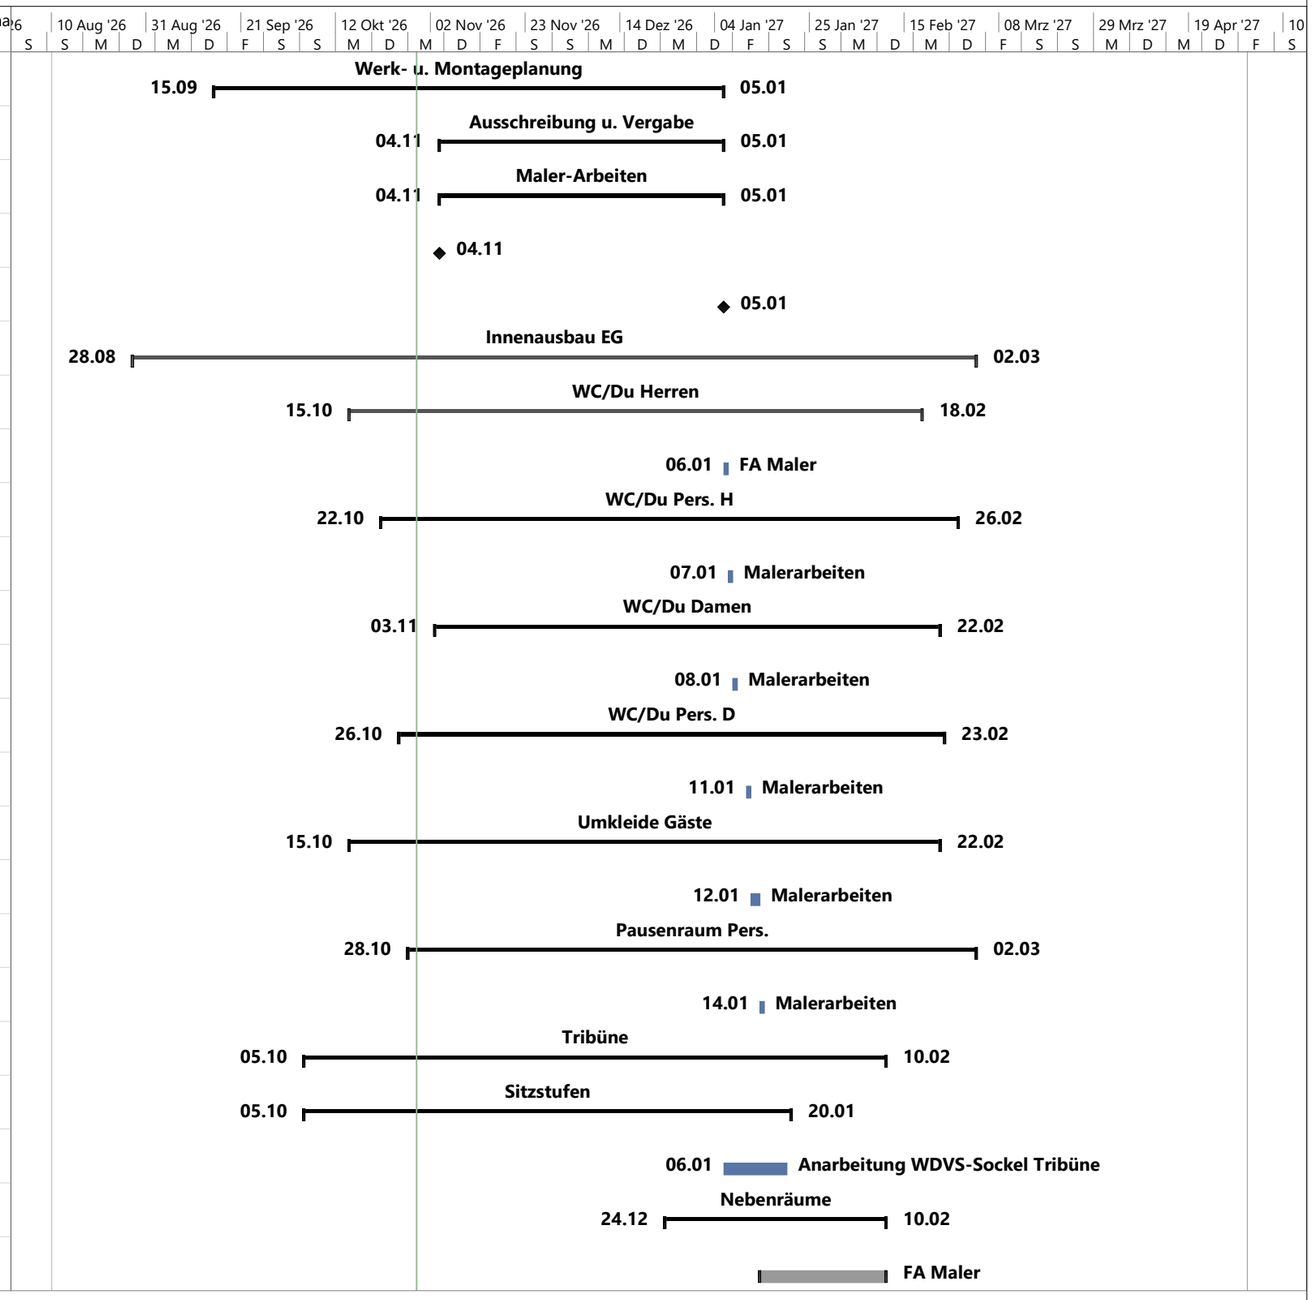

Projekt: G22047-Suedbad-RE_B
Datum: Fre 30.10.26

Vorgang	Projektsammelvorgang	Manueller Vorgang	Nur Anfang	Stichtag
Unterbrechung	Inaktiver Vorgang	Nur Dauer	Nur Ende	In Arbeit
Meilenstein	Inaktiver Meilenstein	Manueller Sammelrollup	Externe Vorgänge	Manueller Fortschritt
Sammelvorgang	Inaktiver Sammelvorgang	Manueller Sammelvorgang	Externer Meilenstein	
