
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1	Ausschreibung Planungsleistungen	70 Tage	13.11.26	18.02.27	
2	Erstellung Entwurfsplanung LPH 3	87 Tage	19.02.27	21.06.27	1
3	Erstellung LPH 4	60 Tage	22.06.27	13.09.27	2
4	Einreichung Bauantrag	1 Tag	14.09.27	14.09.27	3
5	Erstellung LPH 5-6	6 Monate	15.09.27	29.02.28	4
6	Baugenehmigung	9 Monate	15.09.27	23.05.28	4
7	Veröffentlichung Ausschreibung Bau	1 Tag	02.06.28	02.06.28	6EA+7 Tage;5
8	Ausschreibung Bau	3 Monate	05.06.28	25.08.28	7
9	Bauliche Umsetzung	20 Monate	15.09.28	28.03.30	8EA+14 Tage
10	Fertigstellung bauliche Umsetzung	1 Tag	29.03.30	29.03.30	9
11	Erhalt Schlussrechnung	1 Tag	29.04.30	29.04.30	10EA+1 Monat

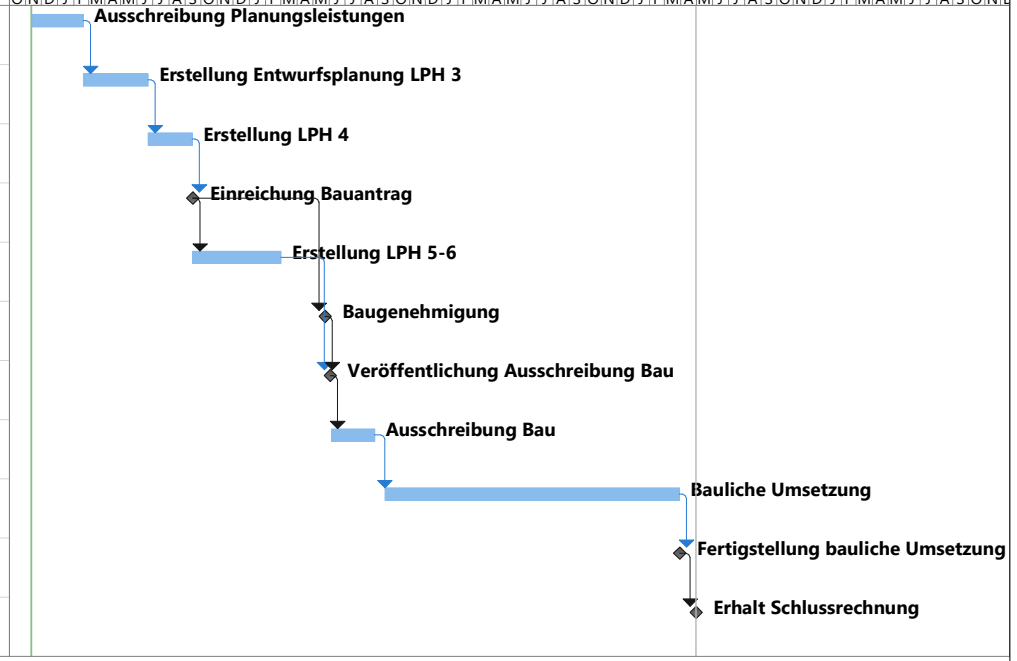

Projekt: 261103_309_2_SPS_Ter
Datum: 12.11.26

Vorgang	Projektsammelvorgang	Manueller Vorgang	Nur Anfang	Stichtag			
Unterbrechung	Inaktiver Vorgang	Nur Dauer	Nur Ende	In Arbeit			
Meilenstein	Inaktiver Meilenstein	Manueller Sammelrollup	Externe Vorgänge	Manueller Fortschritt			
Sammelvorgang	Inaktiver Sammelvorgang	Manueller Sammelvorgang	Externer Meilenstein				
