
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	Projektbeginn (PS)	0 Tage	Die 01.04.25	Die 01.04.25
2	Klärung der Grundlagen	154 Tage	Die 01.04.25	Fre 31.10.25
3	**Ausschreibung Planungsleistung**	**330 Tage**	**Fre 31.10.25**	**Don 04.03.27**
176	Planungsbeginn	0 Tage	Don 21.05.26	Don 21.05.26
177	**Abschluss Lph 1**	**28 Tage**	**Fre 22.05.26**	**Die 30.06.26**
178	Vorlage Planungsterminplan	0 Tage	Don 04.06.26	Don 04.06.26
179	Grundlagenermittlung	20 Tage	Fre 22.05.26	Don 18.06.26
180	Prüfung Grundlagenermittlung durch PS	3 Tage	Fre 19.06.26	Die 23.06.26
181	Freigabe Grundlagenermittlung durch PL	5 Tage	Mit 24.06.26	Die 30.06.26
182	**Abschluss Lph 2**	**70 Tage**	**Mit 01.07.26**	**Die 06.10.26**
183	Vorentwurfsplanung	60 Tage	Mit 01.07.26	Die 22.09.26
184	Prüfung Vorentwurf durch PS	5 Tage	Mit 23.09.26	Die 29.09.26
185	Freigabe Vorentwurf durch PL	5 Tage	Mit 30.09.26	Die 06.10.26
186	**Abschluss Lph 3**	**97 Tage**	**Mit 07.10.26**	**Don 04.03.27**
187	Entwurfsplanung	80 Tage	Mit 07.10.26	Die 09.02.27
188	Prüfung Entwurf durch PS	7 Tage	Mit 10.02.27	Don 18.02.27
189	Freigabe Entwurf durch PL	10 Tage	Fre 19.02.27	Don 04.03.27
190	**Abschluss Lph 4 (Planung)**	**40 Tage**	**Fre 05.03.27**	**Don 29.04.27**
191	Genehmigungsplanung	20 Tage	Fre 05.03.27	Don 01.04.27
192	Prüfung Genehmigungsplanung durch PS	5 Tage	Fre 02.04.27	Don 08.04.27
193	Freigabe Genehmigungsplanung durch PL	15 Tage	Fre 09.04.27	Don 29.04.27
194	Baugenehmigung	120 Tage	Fre 30.04.27	Don 14.10.27
195	**Abschluss Lph 5**	**97 Tage**	**Fre 30.04.27**	**Mon 13.09.2**
196	Ausführungsplanung	80 Tage	Fre 30.04.27	Don 19.08.27
197	Prüfung Ausführungsplanung durch PS	7 Tage	Fre 20.08.27	Mon 30.08.2
198	Freigabe Grundlagenermittlung durch PL	10 Tage	Die 31.08.27	Mon 13.09.2
199	**Abschluss Lph 6**	**55 Tage**	**Die 14.09.27**	**Mon 29.11.2**
200	Erstellung Ausschreibungsunterlagen	40 Tage	Die 14.09.27	Mon 08.11.2
201	Prüfung Ausschreibungsunterlagen durch PS	5 Tage	Die 09.11.27	Mon 15.11.2
202	Freigabe Ausschreibungsunterlagen durch PL	10 Tage	Die 16.11.27	Mon 29.11.2
203	**Abschluss Lph 7**	**100 Tage**	**Die 30.11.27**	**Mon 01.05.2**
204	Vergabe Bauleistungen (wesentliche Gewerke)	100 Tage	Die 30.11.27	Mon 01.05.2
205	**Vorabmaßnahmen**	**76 Tage**	**Mon 25.10.2**	**Die 22.02.28**
206	Eingriff Bestand Spielgeräte, (Versetzen der Tischtennisplatten)	5 Tage	Mon 25.10.27	Fre 29.10.27
207	Baumfällungen	5 Tage	Mon 25.10.2	Fre 29.10.27
208	Baufeldfreimachung (Herrichtung des Grundsrücks und Medienumverlegung)	40 Tage	Die 14.12.27	Die 22.02.28
209	Baubeginn	0 Tage	Mon 01.05.2	Mon 01.05.2
210	Bauende	0 Tage	Die 12.06.29	Die 12.06.29
211	Abnahme der letzten Leistung	0 Tage	Die 04.09.29	Die 04.09.29
212	Projektabschluss	0 Tage	Die 30.10.29	Die 30.10.29

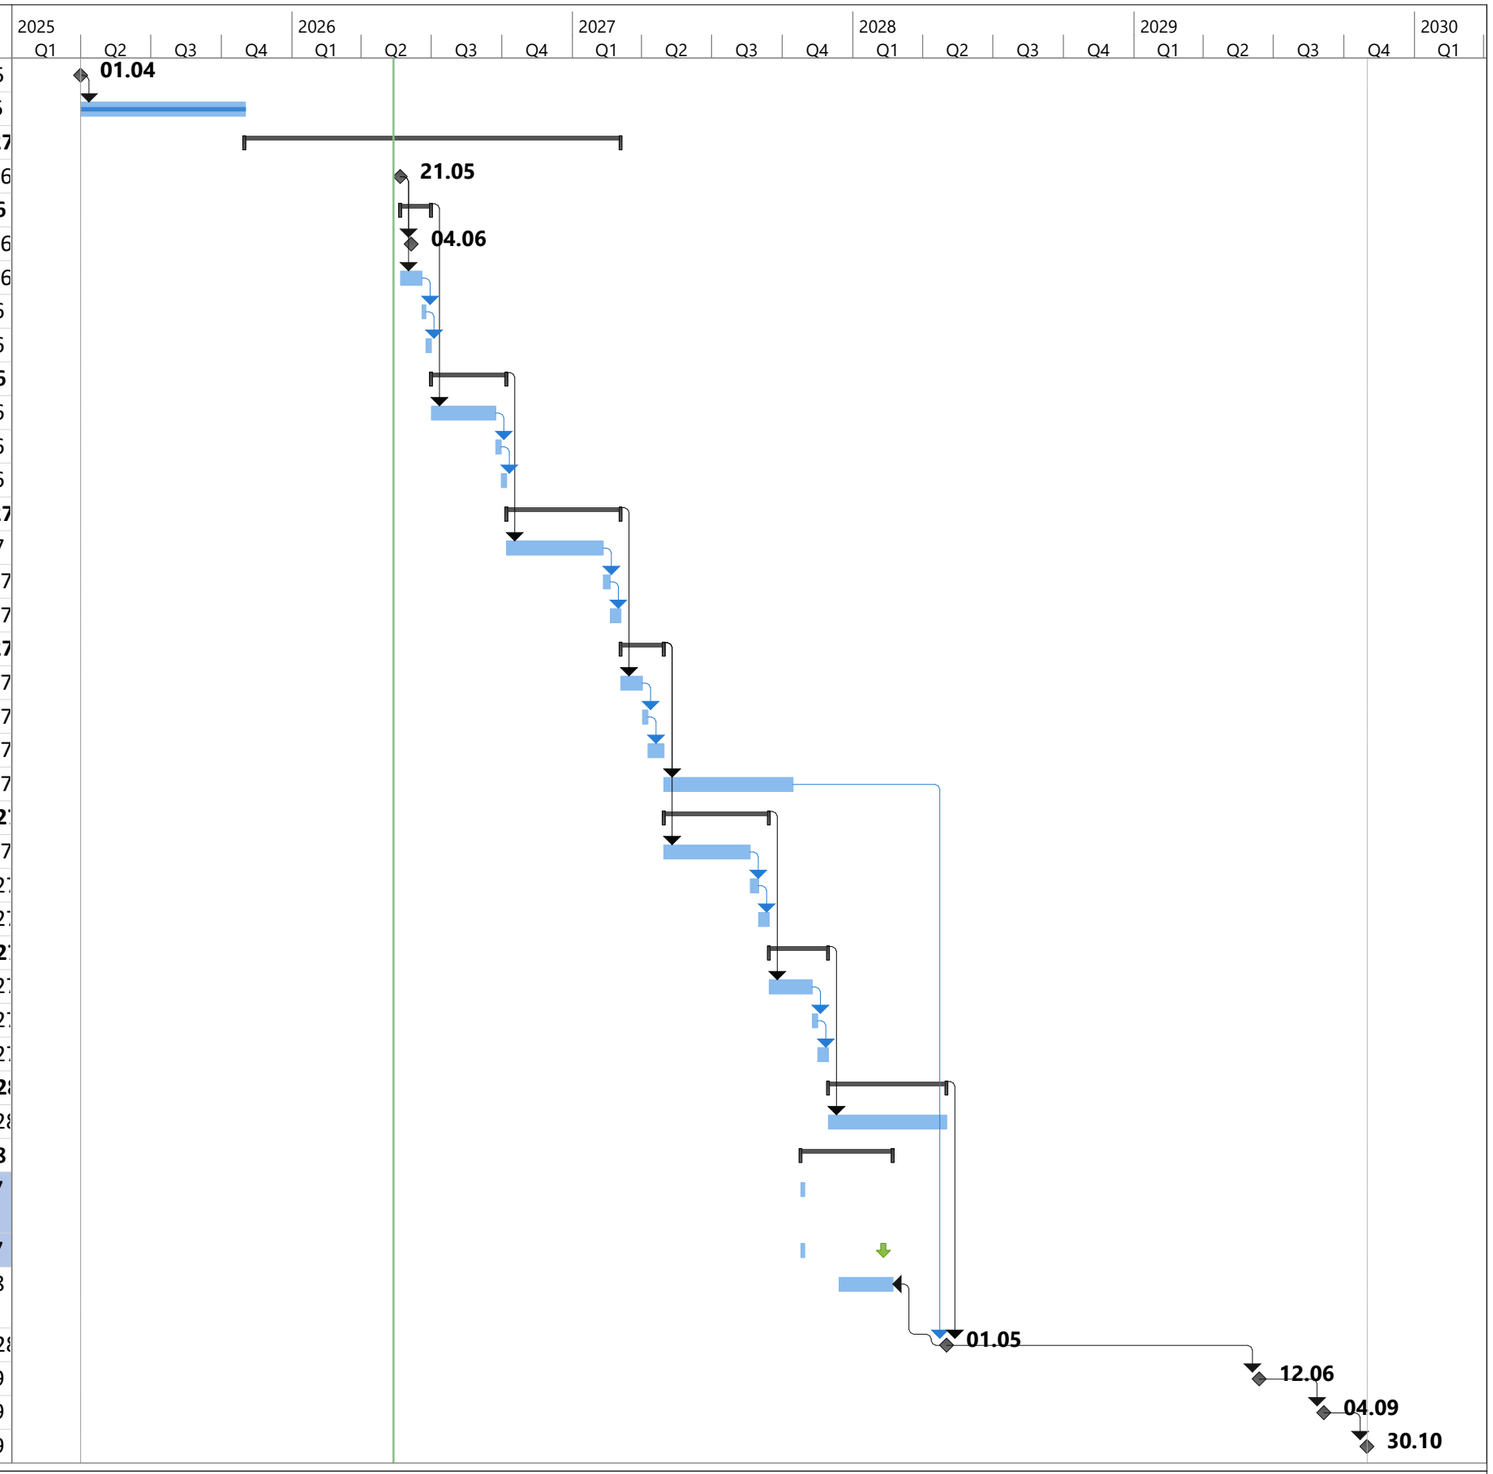

Projekt: OGT_Musterterminplan
Datum: Mit 13.05.26

Vorgang	Projektsammelvorgang	Manueller Vorgang	Nur Anfang	Stichtag
Unterbrechung	Inaktiver Vorgang	Nur Dauer	Nur Ende	In Arbeit
Meilenstein	Inaktiver Meilenstein	Manueller Sammelrollup	Externe Vorgänge	Manueller Fortschritt
Sammelvorgang	Inaktiver Sammelvorgang	Manueller Sammelvorgang	Externer Meilenstein	
