Nr.	Vorgangsname	Dauer
1	Projektbeginn (PS)	0 Tage
2	Klärung der Grundlagen	174 Tage
3	**Ausschreibung Planungsleistung**	**380 Tage**
176	Planungsbeginn	0 Tage
177	**Abschluss Lph 1**	**28 Tage**
178	Vorlage Planungsterminplan	0 Tage
179	Grundlagenermittlung	20 Tage
180	Prüfung Grundlagenermittlung durch PS	3 Tage
181	Freigabe Grundlagenermittlung durch PL	5 Tage
182	**Abschluss Lph 2**	**70 Tage**
183	Vorentwurfsplanung	60 Tage
184	Prüfung Vorentwurf durch PS	5 Tage
185	Freigabe Vorentwurf durch PL	5 Tage
186	**Abschluss Lph 3**	**97 Tage**
187	Entwurfsplanung	80 Tage
188	Prüfung Entwurf durch PS	7 Tage
189	Freigabe Grundlagenermittlung durch PL	10 Tage
190	**Abschluss Lph 4 (Planung)**	**40 Tage**
191	Genehmigungsplanung	20 Tage
192	Prüfung Genehmigungsplanung durch PS	5 Tage
193	Freigabe Genehmigungsplanung durch PL	15 Tage
194	Baugenehmigung	120 Tage
195	**Abschluss Lph 5**	**97 Tage**
196	Ausführungsplanung	80 Tage
197	Prüfung Ausführungsplanung durch PS	7 Tage
198	Freigabe Ausführungsplanung durch PL	10 Tage
199	**Abschluss Lph 6**	**55 Tage**
200	Erstellung Ausschreibungsunterlagen	40 Tage
201	Prüfung Ausschreibungsunterlagen durch PS	5 Tage
202	Freigabe Ausschreibungsunterlagen durch PL	10 Tage
203	**Abschluss Lph 7**	**100 Tage**
204	Vergabe Bauleistungen (wesentliche Gewerke)	100 Tage
205	**Vorabmaßnahmen**	**306 Tage**
206	Baumfällungen	6 Tage
207	Eingriff Bestand Spielgeräte, somit Umverlegung Spielgeräte	5 Tage
208	Ersatz-Klassenraumcontainer und Herrichten der Ersatz-Stellfläche	25 Tage
209	Baufeldfreimachung (Herrichtung des Grundstücks und Medienverlegung), Leitungen innerhalb des	45 Tage
210	Baubeginn	0 Tage
211	Bauende	0 Tage
212	Abnahme der letzten Leistung	0 Tage
213	Projektabschluss	0 Tage

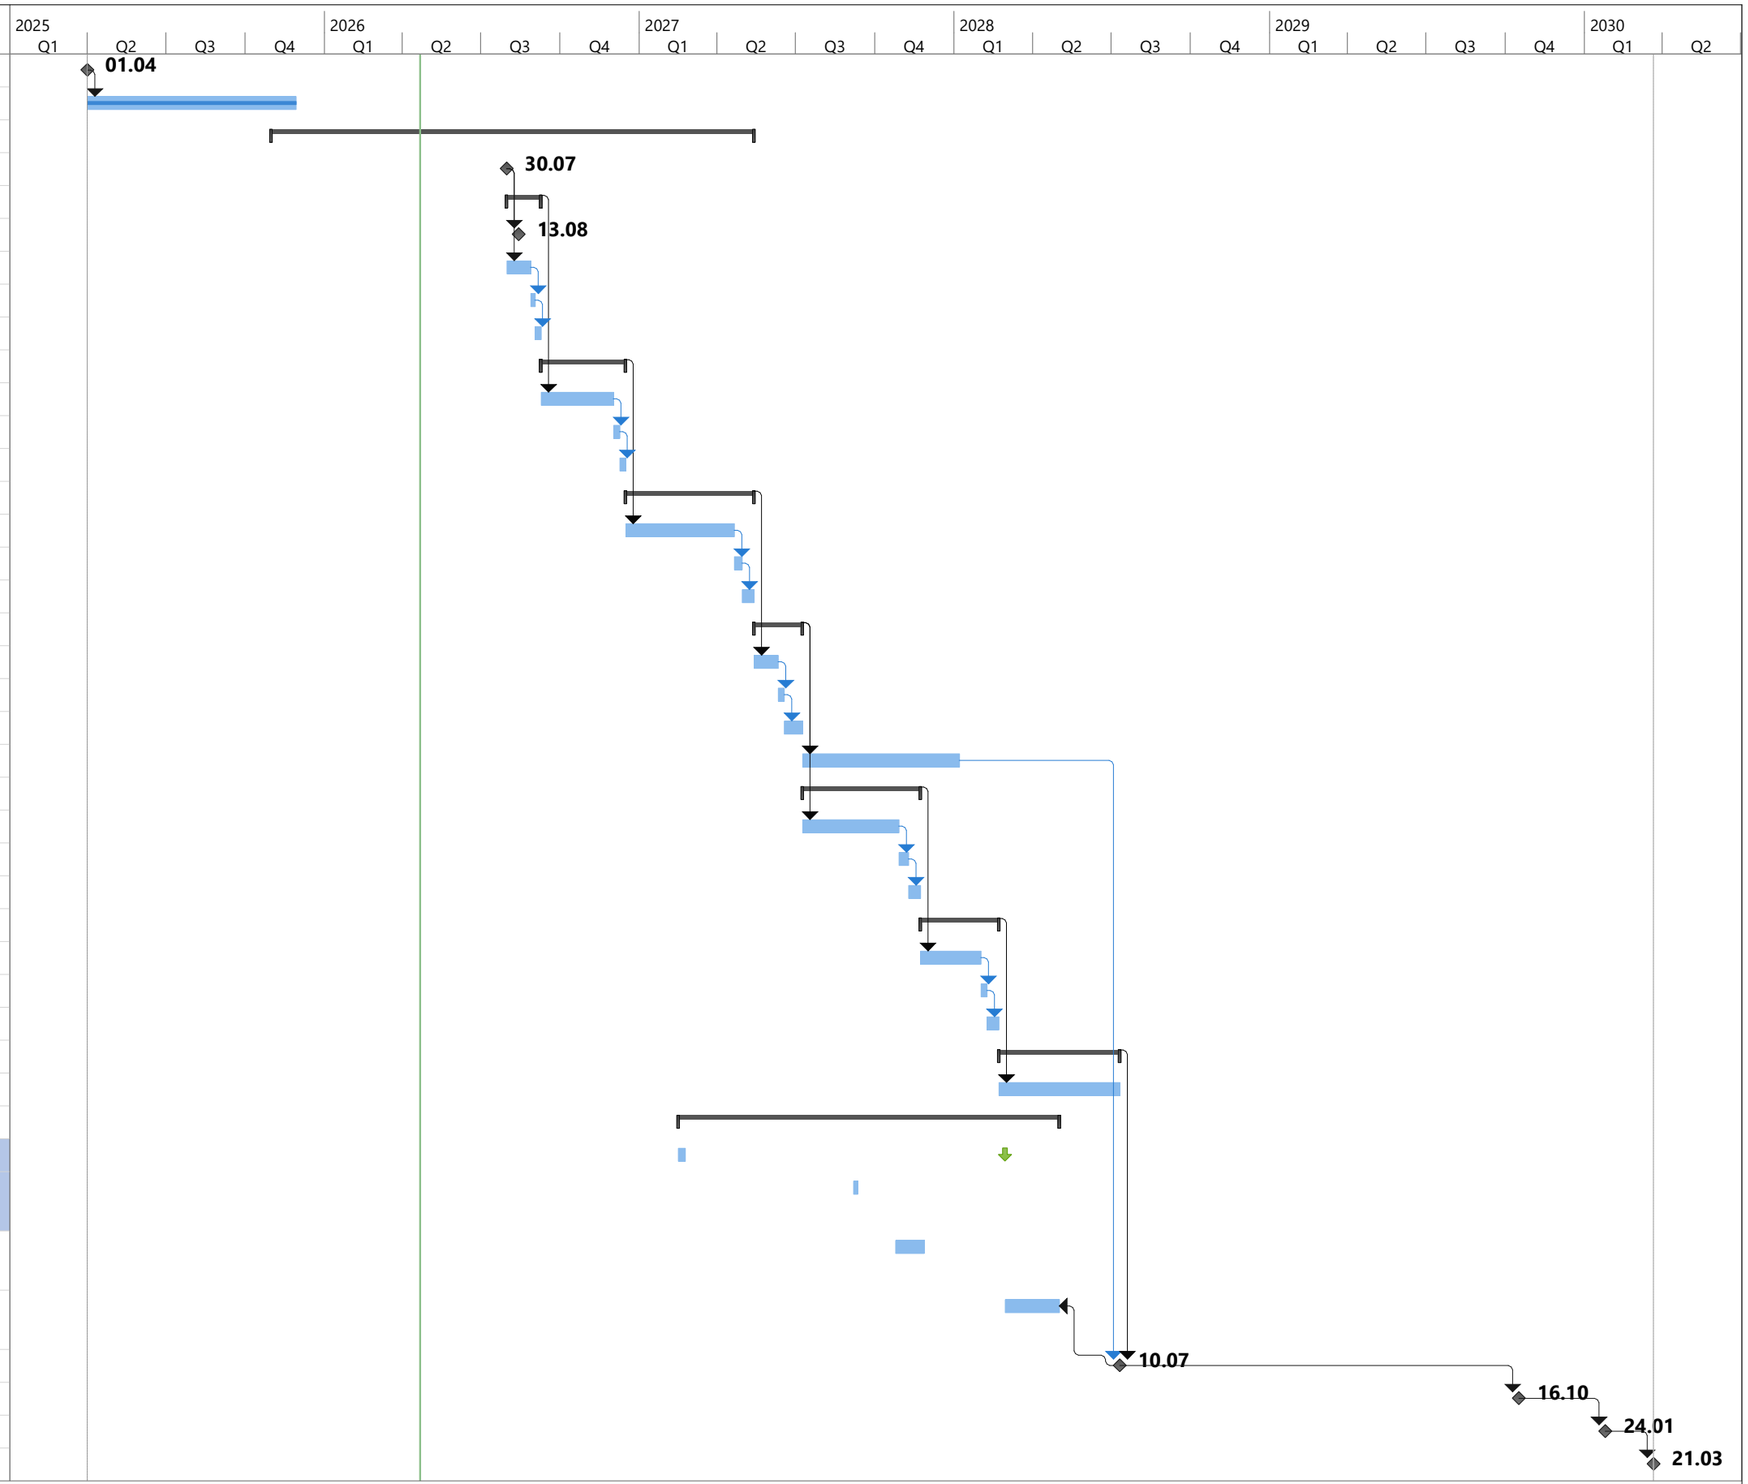

Projekt: OGT_Musterterminplan
Datum: Mit 22.04.26

Vorgang	Projektsammelvorgang	Manueller Vorgang	Nur Anfang	Stichtag
Unterbrechung	Inaktiver Vorgang	Nur Dauer	Nur Ende	In Arbeit
Meilenstein	Inaktiver Meilenstein	Manueller Sammelrollup	Externe Vorgänge	Manueller Fortschritt
Sammelvorgang	Inaktiver Sammelvorgang	Manueller Sammelvorgang	Externer Meilenstein	
