Nr.	Vorgangsname	Dauer
1	Projektbeginn (PS)	0 Tage
2	Klärung der Grundlagen	174 Tage
3	Ausschreibung Planungsleistung	380 Tage
176	Planungsbeginn	0 Tage
177	**Abschluss Lph 1**	**28 Tage**
178	Vorlage Planungsterminplan	0 Tage
179	Grundlagenermittlung	20 Tage
180	Prüfung Grundlagenermittlung durch PS	3 Tage
181	Freigabe Grundlagenermittlung durch PL	5 Tage
182	**Abschluss Lph 2**	**70 Tage**
183	Vorentwurfsplanung	60 Tage
184	Prüfung Vorentwurf durch PS	5 Tage
185	Freigabe Vorentwurf durch PL	5 Tage
186	**Abschluss Lph 3**	**97 Tage**
187	Entwurfsplanung	80 Tage
188	Prüfung Entwurf durch PS	7 Tage
189	Freigabe Entwurf durch PL	10 Tage
190	**Abschluss Lph 4 (Planung)**	**40 Tage**
191	Genehmigungsplanung	20 Tage
192	Prüfung Genehmigungsplanung durch PS	5 Tage
193	Freigabe Genehmigungsplanung durch Pl	15 Tage
194	Baugenehmigung	120 Tage
195	**Abschluss Lph 5**	**97 Tage**
196	Ausführungsplanung	80 Tage
197	Prüfung Ausführungsplanung durch PS	7 Tage
198	Freigabe Ausführungsplanung durch PL	10 Tage
199	**Abschluss Lph 6**	**55 Tage**
200	Erstellung Ausschreibungsunterlagen	40 Tage
201	Prüfung Ausschreibungsunterlagen durch	5 Tage
202	Freigabe Ausschreibungsunterlagen durc	10 Tage
203	**Abschluss Lph 7**	**100 Tage**
204	Vergabe Bauleistungen (wesentliche Gewerke)	100 Tage
205	**Vorabmaßnahmen**	**486 Tage**
221	Baubeginn	0 Tage
222	Bauende	0 Tage
223	Abnahme der letzten Leistung	0 Tage
224	Projektabschluss	0 Tage

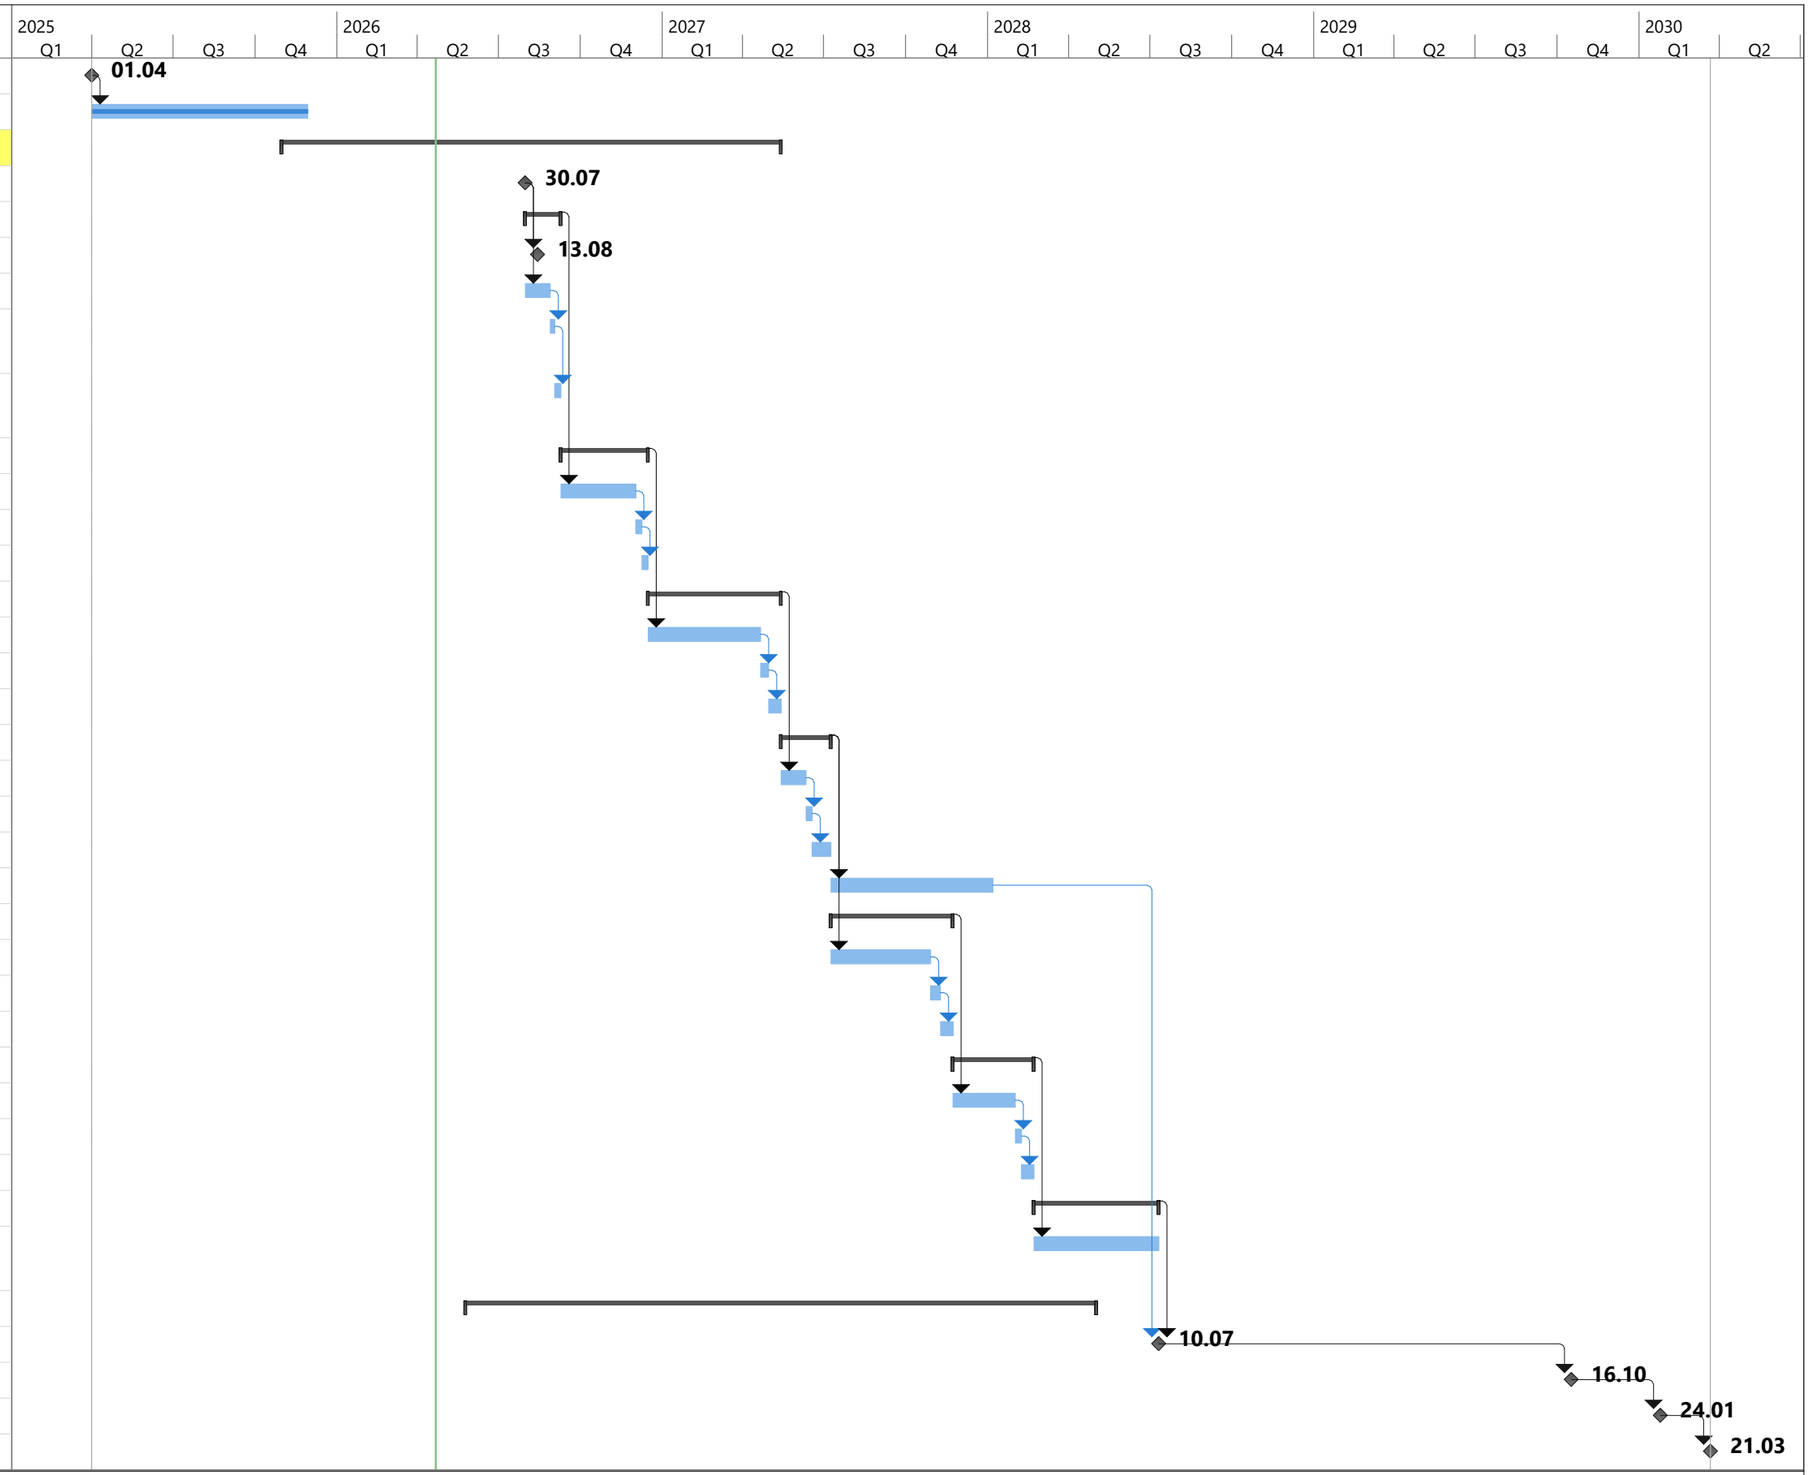

Projekt: OGT_Musterterminplan
Datum: Mit 22.04.26

Vorgang		Projektsammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Anfang		Stichtag	
Unterbrechung		Inaktiver Vorgang		Nur Dauer		Nur Ende		In Arbeit	
Meilenstein		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Externe Vorgänge		Manueller Fortschritt	
Sammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Externer Meilenstein			
