Nr.		Vorgangsı	Vorgangsname	Dauer
1	✓		Projektbeginn (PS)	0 Tage
2	✓		Klärung der Grundlagen	164 Tage
3			**Ausschreibung Planungsleistung**	**381 Tage**
176			Planungsbeginn	0 Tage
177			**Abschluss Lph 1**	**28 Tage**
178			Vorlage Planungsterminplan	0 Tage
179			Grundlagenermittlung	20 Tage
180			Prüfung Grundlagenermittlung durch PS	3 Tage
181			Freigabe Grundlagenermittlung durch PL	5 Tage
182			**Abschluss Lph 2**	**70 Tage**
183			Vorentwurfsplanung	60 Tage
184			Prüfung Vorentwurf durch PS	5 Tage
185			Freigabe Vorentwurf durch PL	5 Tage
186			**Abschluss Lph 3**	**97 Tage**
187			Entwurfsplanung	80 Tage
188			Prüfung Entwurf durch PS	7 Tage
189			Freigabe Entwurf durch PL	10 Tage
190			**Abschluss Lph 4 (Planung)**	**40 Tage**
191			Genehmigungsplanung	20 Tage
192			Prüfung Genehmigungsplanung durch PS	5 Tage
193			Freigabe Genehmigungsplanung durch PL	15 Tage
194			Baugenehmigung	120 Tage
195			**Abschluss Lph 5**	**97 Tage**
196			Ausführungsplanung	80 Tage
197			Prüfung Ausführungsplanung durch PS	7 Tage
198			Freigabe Ausführungsplanung durch PL	10 Tage
199			**Abschluss Lph 6**	**55 Tage**
200			Erstellung Ausschreibungsunterlagen	40 Tage
201			Prüfung Ausschreibungsunterlagen durch PS	5 Tage
202			Freigabe Ausschreibungsunterlagen durch PL	10 Tage
203			**Abschluss Lph 7**	**100 Tage**
204			Vergabe Bauleistungen (wesentliche Gewerke)	100 Tage
205			**Vorabmaßnahmen**	**487 Tage**
221			Baubeginn	0 Tage
222			Bauende	0 Tage
223			Abnahme der letzten Leistung	0 Tage
224			Projektabschluss	0 Tage

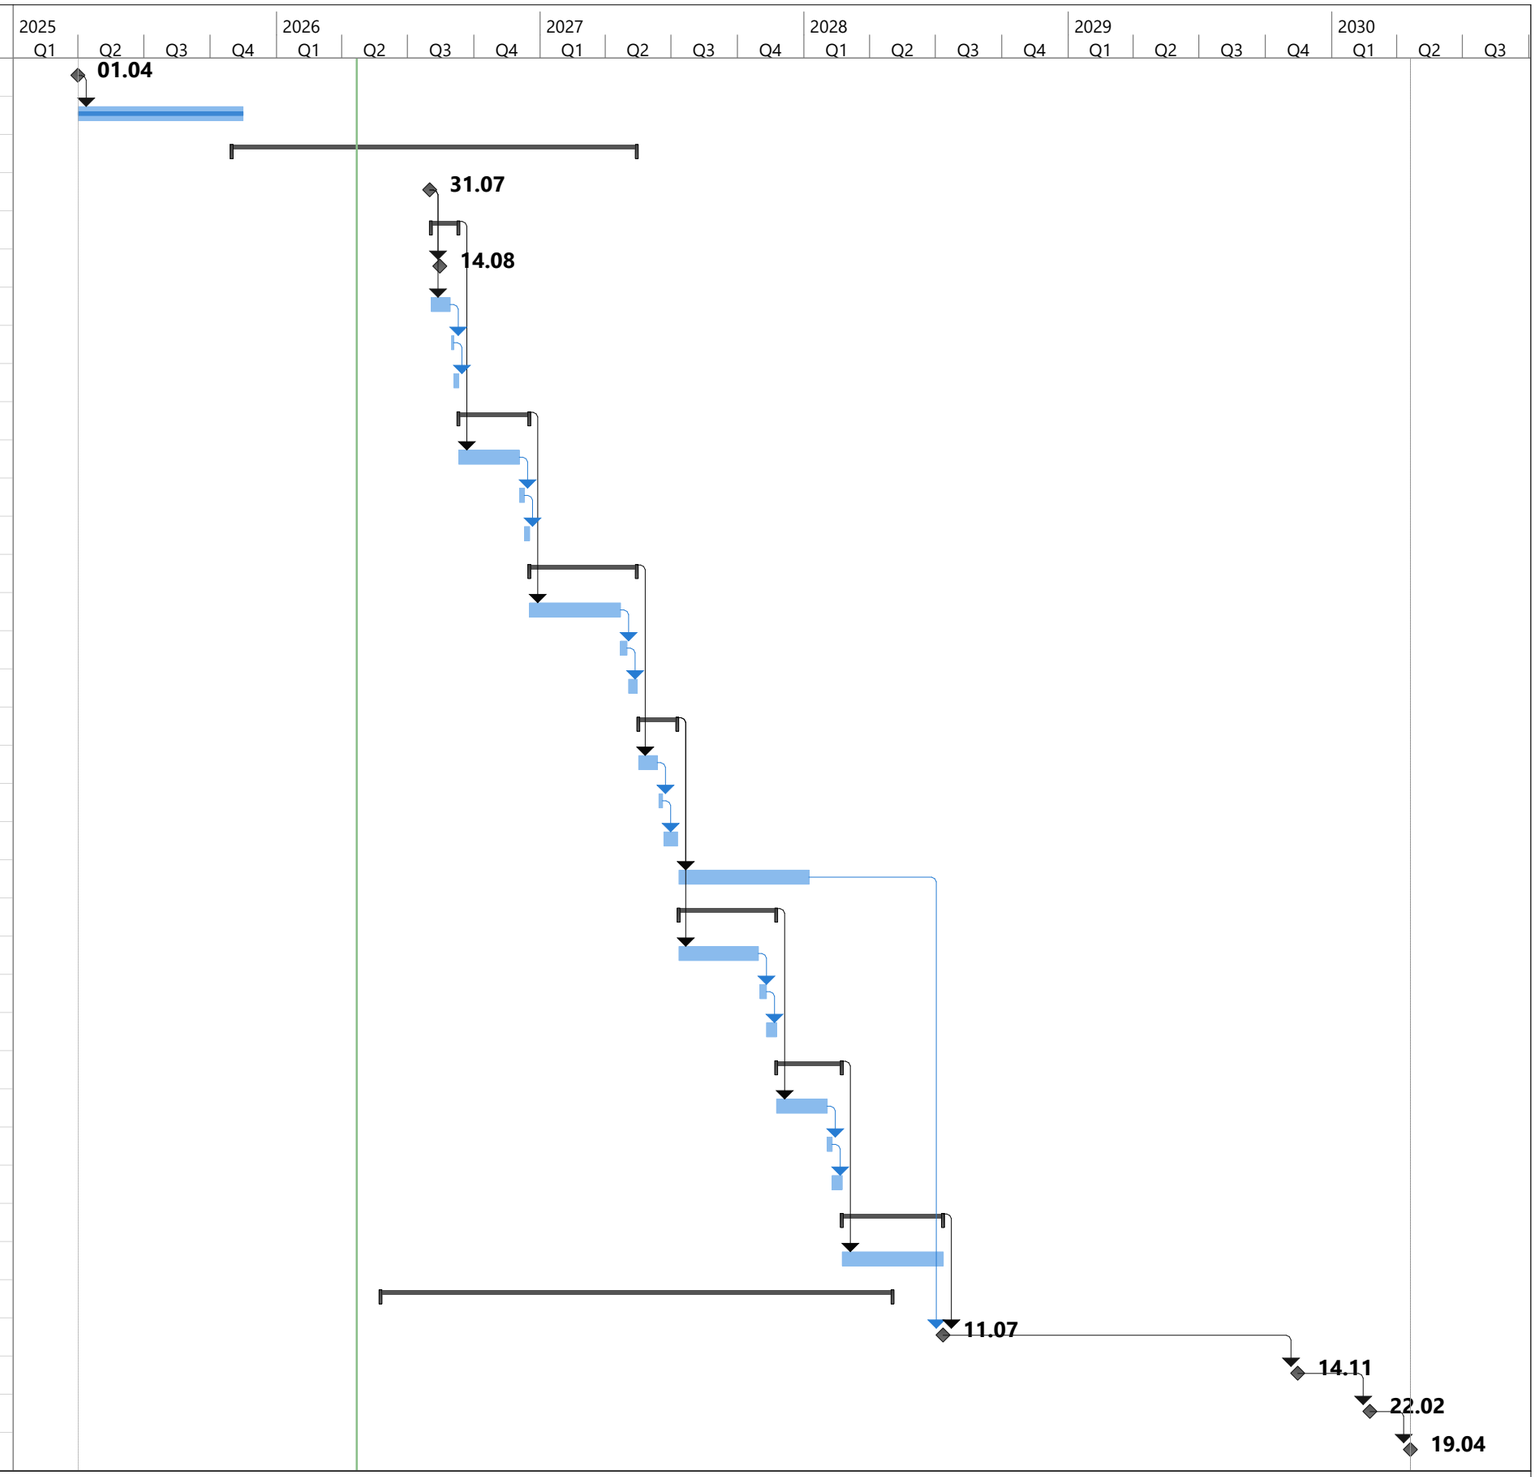

Projekt: OGT_Musterterminplan
Datum: Mit 22.04.26

Vorgang	Projektsammelvorgang	Manueller Vorgang	Nur Anfang	Stichtag
Unterbrechung	Inaktiver Vorgang	Nur Dauer	Nur Ende	In Arbeit
Meilenstein	Inaktiver Meilenstein	Manueller Sammelrollup	Externe Vorgänge	Manueller Fortschritt
Sammelvorgang	Inaktiver Sammelvorgang	Manueller Sammelvorgang	Externer Meilenstein	
