Nr.	Vorgangsname	Dauer
1	Projektbeginn (PS)	0 Tage
2	Klärung der Grundlagen	159 Tage
3	**Ausschreibung Planungsleistung**	**369 Tage**
196	Planungsbeginn	0 Tage
197	**Abschluss Lph 1**	**28 Tage**
198	Vorlage Planungsterminplan	0 Tage
199	Grundlagenermittlung	20 Tage
200	Prüfung Grundlagenermittlung durch PS	3 Tage
201	Freigabe Grundlagenermittlung durch PL	5 Tage
202	**Abschluss Lph 2**	**70 Tage**
203	Vorentwurfsplanung	60 Tage
204	Prüfung Vorentwurf durch PS	5 Tage
205	Freigabe Vorentwurf durch PL	5 Tage
206	**Abschluss Lph 3**	**97 Tage**
207	Entwurfsplanung	80 Tage
208	Prüfung Entwurf durch PS	7 Tage
209	Freigabe Entwurf durch PL	10 Tage
210	**Abschluss Lph 4 (Planung)**	**40 Tage**
211	Genehmigungsplanung	20 Tage
212	Prüfung Genehmigungsplanung durch PS	5 Tage
213	Freigabe Genehmigungsplanung durch PL	15 Tage
214	Baugenehmigung	120 Tage
215	**Abschluss Lph 5**	**97 Tage**
216	Ausführungsplanung	80 Tage
217	Prüfung Ausführungsplanung durch PS	7 Tage
218	Freigabe Ausführungsplanung durch PL	10 Tage
219	**Abschluss Lph 6**	**55 Tage**
220	Erstellung Ausschreibungsunterlagen	40 Tage
221	Prüfung Ausschreibungsunterlagen durch PS	5 Tage
222	Freigabe Ausschreibungsunterlagen durch PL	10 Tage
223	**Abschluss Lph 7**	**100 Tage**
224	Vergabe Bauleistungen (wesentliche Gewerke)	100 Tage
225	**Vorabmaßnahmen**	**495 Tage**
241	Baubeginn	0 Tage
242	Bauende	0 Tage
243	Abnahme der letzten Leistung	0 Tage
244	Projektabschluss	0 Tage

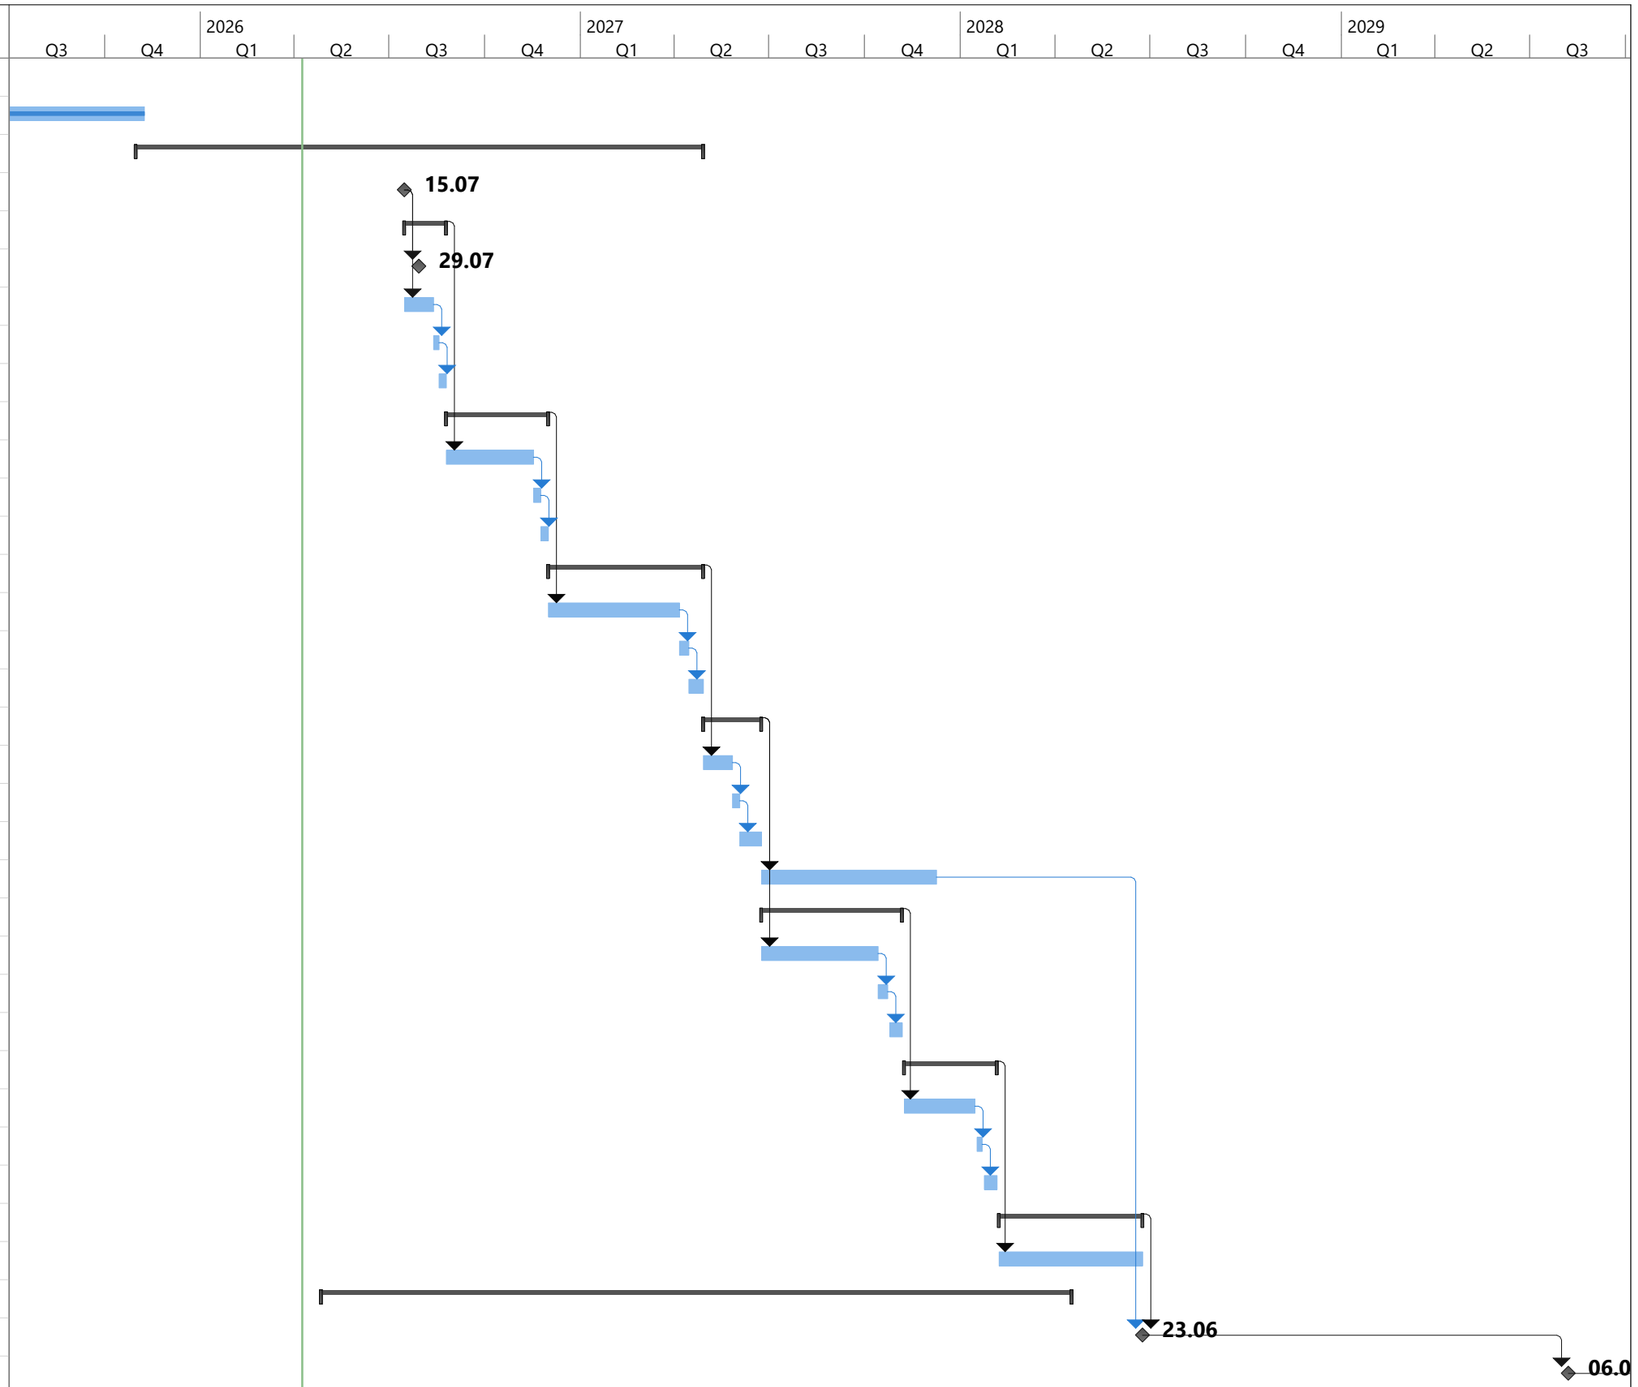

Projekt: OGT_Musterterminplan
Datum: Don 09.04.26

Vorgang	Projektsammelvorgang	Manueller Vorgang	Nur Anfang	Stichtag
Unterbrechung	Inaktiver Vorgang	Nur Dauer	Nur Ende	In Arbeit
Meilenstein	Inaktiver Meilenstein	Manueller Sammelrollup	Externe Vorgänge	Manueller Fortschritt
Sammelvorgang	Inaktiver Sammelvorgang	Manueller Sammelvorgang	Externer Meilenstein	
